

目录

- 1.封面
- 2.投标函及投标函附录
- 3.授权委托书或法定代表人身份证明
- 4.投标保证金
- 5.施工组织设计
- 6.项目管理机构
- 7.拟分包项目情况表
- 8.投标人基本情况表
- 9.投标人企业组织机构框图
- 10.近年财务状况表
- 11.完成的类似项目情况表
- 12.完成的类似项目情况汇总表
- 13.投标人的信誉情况表
- 14.拟委任的项目经理和项目总工汇总表
- 15.拟委任的项目经理和项目总工资历表
- 16.八其他材料



省道 S350 线肇庆广宁石涧至丰田段安全提升 工程（施工）

投 标 文 件

（第一个信封：商务及技术文件）

投标人： 江西省四通路桥建设集团有限公司 （盖单位章）



2026 年 1 月 6 日



目 录

第一个信封（商务及技术文件）



一、投标函及投标函附录	4
二、授权委托书或法定代表人身份证明	7
三、投标保证金	10
四、施工组织设计	15
五、项目管理机构	86
六、拟分包项目情况表	87
七、资格审查资料	88
八、其他资料	208



一、投标函及投标函附录

（一）投标函



宁县公路事务中心（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究 省道 S350 线肇庆广宁石涧至丰田段安全提升工程（施工）（项目名称）施工招标文件的全部内容（含全部补遗书第 01 号至第 01 号），愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期 90 日历天内不修改、不撤销投标文件。

3. 工程质量：交工验收的质量评定：合格，竣工验收的质量评定：达到合格或以上的质量标准，安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内 无较大及以上生产安全责任事故发生，工期：180 日历天。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

6. 我方在此承诺：拟投入本项目的项目经理及项目总工无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离），否则自愿按照招标人的有关规定接受处理。

7. 我方在此承诺：权利义务满足招标文件规定。

8. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。



9. 我方在此承诺：我公司及我方法定代表人、拟委任的项目经理、公路工程技术负责人和信息化工程技术负责人在近三年内无行贿犯罪行为，否则自愿按照招标人的有关规定接受处理。

10. 我方承诺：我司及我司法定代表人、我司拟委任的项目经理、项目总工在近三年内不曾有行贿犯罪行为（其他补充说明）。



投 标 人：江西省公路桥梁建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：赵银（签字）

地 址：江西省新余市渝水区仙来东大道 347 号

电 话：0790-6420803

电子邮箱：402638558@qq.com

邮政编码：338000

2026 年 1 月 6 日

注：投标人仅需在投标函上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。



(二) 投标函附录

序号	条款名称	合同条目号	约定内容	备注
	缺陷责任期	1.1.4.5	自实际交工日期起计算 <u>1</u> 年 (具体从开工令发出之日起计算)	
2	逾期交工违约金	11.5 (3)	<u>2000</u> 元/天	
3	逾期交工违约金限额	11.5 (3)	<u>10</u> % 签约合同价	
4	提前交工的奖金	11.6	<u>/</u> 元/天	
5	提前交工的奖金限额	11.6	<u>/</u> % 签约合同价	
6	物价波动引起的价格调整	16.1	(合同期内不调价)	
7	开工预付款金额	17.2.1 (1)	<u>10</u> % 签约合同价 (如有需要, 发包人可根据实际情况制定更符合工程需要的预付款比例) (具体以合同约定为准)	
8	材料、设备预付款比例	17.2.1 (2)	<u>/</u> % 等主要材料、设备单据所列费用的 <u>/</u> %	
9	进度付款证书最低限额	17.3.3 (1)	<u>50</u> 万元 (工程进度款支付比例控制在实际进度的 <u>80</u> % 以内) (具体以合同约定为准)	
10	逾期付款违约金的利率	17.3.3 (2)	<u>/</u> %/天	
11	质量保证金金额	17.4.1	<u>3</u> % 合同价格	
12	保修期	19.7 (1)	自实际交工日期起计算 <u>2</u> 年	

林刘
印晓

投 标 人 江西省公路路桥建设集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: 赵 锐 (签字)

2026 年 1 月 6 日

注: 投标函附录的数据应与项目专用合同条款数据表的数据一致



二、授权委托书或法定代表人身份证明

(一) 授权委托书



本人 刘晓林 (姓名) 系 江西省四通路桥建设集团有限公司 (投标人名称) 的法定代表人, 现委托 赵银 (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 省道 S350 线肇庆广宁石洞至丰田段安全提升工程 (施工) (项目名称) 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。

委托期限: 自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附: 法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投 标 人  公司 (盖单位章)
法定代表人 (签字)
身份证号码
委托代理人 (签字)
身份证号码

2026 年 1 月 6 日

注:

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名, 不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
2. 如果由投标人的委托代理人签署投标文件, 则不需提交 (二) 法定代表人身份证明。



法定代表人身份证复印件



委托代理人身份证复印件





(二) 法定代表人身份证明




投标人名称：江西省四通路桥建设集团有限公司

姓名：刘 晓 林（法定代表人亲笔签字） 性别：男 年龄：48岁 职务：董事长

系 江西省四通路桥建设集团有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。



投标人：江西省四通路桥建设集团有限公司（盖单位章）



2026 年 1 月 6 日

注：

1. 法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
2. 如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交（一）授权委托书。



三、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供转账或电汇单据等相关凭证的彩色扫描件。

如采用银行保函，银行保函复印件装订在投标文件中，格式如下。

如采用其他形式提交，应满足须知前附表 3.4.1 项的规定。

注：①采用企业的基本账户以银行转账方式递交投标保证金的，后附银行汇款凭证复印件或扫描件和企业基本账户证明材料复印件或扫描件作为投标保证金递交凭证。②采用保函形式递交投标保证金的，后附保函复印件或扫描件作为投标保证金递交凭证。

投标银行保函格式

广宁县公路事务中心：

鉴于 _____（投标人名称）（以下称“投标人”）于 _____ 年 _____ 月 _____ 日参加 _____（项目名称）施工的投标，_____（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）_____ 元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

____ 年 ____ 月 ____ 日

注：本保函格式只作为参考，投标人可根据当地银行及相关规定的格式填写，但主要内容须与本保函内容原则上保持一致。如：“本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效”可改为本保函自《生效日期》之日起生效，至《失效日期》之日失效。



林刘
印晓



翰华担保
HANHUA GUARANTEE CO., LTD

投标保函

保函编号: HH2025122417161
查询代码: QH1Q95V444

***** (招标单位/受益人):
鉴于 江西省四通路桥建设集团有限公司 (以下简称“投标人”) 拟通过 肇庆市公共资源交易中心 (交易中心) 参加贵方编号为 ***** 的 ***** (以下简称“本项目”) 投标, 根据本项目招标文件, 投标人参加投标时应向贵方缴纳投标保证金, 且可以投标保函的形式代替缴纳投标保证金。应投标人的申请, 我方以保函的方式向贵方提供如下投标保证金担保:

一、保证责任的情形及保证金额

(一) 投标人出现下列任意情形, 受益人在投标有效期内要求投标人承担责任的, 我方承担保证责任:

1. 投标人在投标有效期内撤销投标的;
2. 中标后投标人无正当理由未在招标文件规定的时间与招标人签订项目合同;
3. 招标文件规定的不应退还投标人投标保证金的其他情形。

(二) 我方承担保证责任的最高金额为人民币 50000.00 元 (大写 伍万元整), 即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为: 连带责任保证。

我方的保证期间为: 30 日, 即自本保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后 30 日, 投标有效期延长的, 本保函的保证期间做相应调整, 但最晚不晚于 2026 年 12 月 29 日 止。

三、承担保证责任程序

1. 贵方要求我方承担保证责任的, 应在本保函保证期间内向我方送达书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额, 支付款项应到达的账号, 并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的证明材料。
2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后, 在 15 个工作日内进行审查, 符合应承担保证责任情形的, 我方应在审查结束后的 3 个工作日内按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的解除

1. 保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的, 自保证期间届满次日起, 我方保证责任自动解除。
2. 我方按照本保函向贵方履行了保证责任后, 自我方向贵方支付 (支付款项到达贵方账户) 之日起, 保证责任解除。
3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任解除的其它情形的, 我方在本保函项下的保证责任亦解除。

五、免责条款

1. 依照法律规定或贵方与投标人的另行约定, 全部或者部分免除投标人投标保证金义务时, 我方亦免除相应的保证责任。
2. 因贵方原因致使投标人发生本保函第一条第 (一) 款约定情形的, 我方不承担保证责任。
3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的, 我方不承担保证责任。
4. 贵方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改, 加重我方保证责任的, 我方对加重部分不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷, 由贵我双方协商解决, 协商不成的, 通过诉讼程序解决, 诉讼管辖地法院为我方住所地有管辖权的人民法院。

七、保函的生效

本保函自加盖我方电子印章之日起生效。
(以下无正文)

保证人: 翰华担保股份有限公司
2025 年 12 月 29 日 15:53:10



验真二维码



验真二维码验证保函真伪:

1. 请登录翰华金融官网 <https://hbvl.hanhua.com/>, 点击首页的“保函服务”, 选择保函验真, 输入保函编号和企业名称查询。
2. 请用微信扫描左侧二维码进行保函真伪查询。

项目名称：省道S350线肇庆广宁石洞至丰田段安全提...

选择标段：省道S350线肇庆广宁石洞至丰田段安全提升工程（...



离开标还有9天
开标室306（仅用于建设工程） 09:30

工作环节

- ① 投标前阶段
 - 招标文件领取
 - 答疑澄清文件领取
 - 控制价文件领取
- ② 投标阶段
 - 上传投标文件
 - 保证金查询
- ③ 开/评标阶段
 - 开标签到解密
 - 评标澄清质疑
- ④ 定标后阶段
 - 结算通知书查看

线上化 安全性 免担保 便捷性

特别提示：
一、请使用企业基本户购买担保函，否则视为无效；
二、请自己阅读保证金缴纳截止时间，并在截止时间前购买担保文件；
三、购买担保后，您可以点击

查询结果：
单位名称：江西省四通路桥建设集团有限公司
担保金额：50000.00 元
出险企业：瀚华融资担保股份有限公司
出险时间：2025-12-29 15:53:10

提醒

单位名称：江西省四通路桥建设集团有限公司
担保金额：50000.00 元
出险企业：瀚华融资担保股份有限公司
出险时间：2025-12-29 15:53:10

确定

03 子账号缴纳到账查询

缴纳户名：江西省四通路桥建设集团有限公司

缴纳账号：202207469136



林刘
印晓



林刘
印晓



国内支付业务付款回单

客户号: 0052168670
日期: 2025年12月29日
付款人账号: 202207469136
收款人账号: 12390494111021300000006
付款人名称: 江西省四通路桥建设集团有限公司
收款人名称: 瀚华融担保股份有限公司
付款人开户行: 中国银行新余市渝水支行
收款人开户行: 招商银行股份有限公司

金额: CNY200.00
人民币贰佰元整

报文种类: ibps.101-网银贷记业务报文
业务类型: C200-汇兑
业务标识号: 1041000000042025122905999352
发起行行号: 09895
发起行名称: 中国银行新余市渝水支行

收支申报号:
业务编号: 0BSS003634453345GIR000000000000000
接收行行号: 308584000013
接收行名称: 招商银行股份有限公司

扣账账号:
扣账户名:

用途: 631449

附言: 631449



如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

交易机构: 09895
交易渠道: 网上银行
交易流水号: 253295084-870
经办:
回单编号: 3505815150464872
同单验证码: 25HTH6QCJVA
打印时间:
打印次数: 次



基本存款账户信息

账户名称: 江西省四通路桥建设集团有限公司

账户号码: 202207469136

开户银行: 中国银行股份有限公司新余市渝水支行

法定代表人:
(单位负责人) 刘晓林

基本存款账户编号: J4260000041508



2020 年 06 月 23 日



四、施工组织设计

一、根据《广东省高速公路工程施工组织设计和施工方案标准化管理指南》《广东省公路工程施工标准化指南》及《公路工程施工安全防护设施技术指南》，投标人应按以下要点编制施工组织设计，契合项目实际，突出重点，抓住关键（文字应精炼、表述须清晰，内容具有针对性，总体原则上控制在 15000 字以内）：

1. 总体施工组织布置及规划

（1）工程概况

① 工程建设规模、数量等基本情况。

② 施工自然条件（包括地形地貌、水文地质与工程地质条件、气候气象条件等）、施工条件（运输条件、施工用水、用电和筑路材料等）。

③ 工程特点及重难点工程分析与说明。

（2）施工组织安排

① 施工管理组织机构。

② 施工区域划分、作业队伍划分和作业人数配置。

③ 大型临时设施的布置规划、主要材料供应计划、临时工程用地计划、临时用电计划及施工总平面布置等。

（3）施工进度计划

① 工期总目标及关键线路工期安排。

② 各分项工程工期安排。

2. 主要工程项目的施工方案与技术措施

（1）常规的路基、路面、桥涵、隧道工程仅说明工程概况、主要施工方法（仅明确工法，一般不写施工流程、具体工艺、质量检验等内容）。

（2）重点、难点和关键工程应根据本单位的施工技术水平、工装设备，制定针对性施工方案及技术措施，包括：工程概况、主要设备配置、主要施工方法、组织方式、工期安排等。

3. 工期保证措施

围绕工期目标，简要阐述影响工期的主要因素及相关应对措施。

4. 工程质量保证措施

明确工程质量管理目标，针对工程质量通病，简要说明拟采取的预防控制措施。

5. 安全生产保证措施

明确安全生产管理目标，针对工程主要安全风险点，简要说明拟采取的预防保障措施。



7. 环境保护、水土保持保证措施

针对项目环境保护、水土保持敏感点，简要说明拟采取的预防保障措施。

8. 文明施工、文物保护保证措施

针对文明施工和文物保护相关要求，简要说明拟采取的预防保障措施。



9. 其他应说明的事项

可根据招标文件要求有选择地作出说明。

二、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求参见《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)第九章相应格式内容。

附表一 施工总体计划表

附表二 分项工程进度率计划（斜率图）

附表三 工程管理曲线

附表四 分项工程生产率和施工周期表

附表五 施工总平面图



第一章、总体施工组织布置及规划

第一节 项目概况与招标范围

建设规模：本项目起点位于石涧镇与省道 S263 线相交处(桩号 K0+000), 途经官步、鼎丰、长塘口、东乡、下浅、大良、九应、丰田等终点位于木格镇与 G234 线相交处(桩号 K57+819), 因 S350 线 K17+032~K24+652 段与国道 G355 线共线, 故不列入本项目实施路段, 实施路段全长 50.199km。主要包括: 平面交叉改造工程、急弯陡坡及临水临崖路段整治和沿线交通安全设施提升。

技术标准: 本项目维持原有公路技术标准, 主要技术指标如下: 1. 公路等级: 二级公路; 2. 设计速度: 40km/h、60km/h; 3. 路基宽度 8.5m、15m、50m; 4. 车道数: 双向两车道、双向六车道; 5. 路面类型: 水泥混凝土路面或沥青混凝土路面。

招标范围: 本合同段建设范围内工程的施工、交工验收、缺陷修复以及质量保修等。工程的施工(具体以本项目施工图设计文件和审定的工程量清单为准)。

第二节 施工总平面布置安排

接中标通知书后, 与业主进行合同签订的同时, 开始施工现场准备工作, 施工现场准备工作主要应做好以下工作: 复查和了解现场的地形地质、水源、电源、料场、交通运输、环境保护等有关情况; 作好现场总体规划, 我们将在最短的时间内建设好项目经理部、搭设工棚、仓库; 安装供水管线、架设供电线路; 设置拌和场, 修筑临时道路和临时排水设施等。

项目经理部布置:

根据本合同段工程分布情况, 主要考虑与业主、监理工程师的工作联络方便和材料运输的便利以及有利于本段内的工程管理, 项目经理部设在交通便利之处, 项目经理部租用现有民房, 并配备完善优良的通讯设施和办公设备。

拌和场:

拌和站拟建在场地面积宽广、车辆出入方便、离居民住处较远之处, 考虑保证正常施工两周的材料供应堆放场地。为保证各种路用材料不受污染, 保证拌和场整洁, 同时减少材料的损失, 对路用材料的存放场地按要求进行硬化, 并且将进场集料按不同品种及不同规格分仓堆放, 用砖墙隔开, 并设置遮雨棚, 防止材料雨淋和暴晒。

电力配置:

生产、生活用电主要采用当地电网供电, 拌和场将安装发电机组以供停电时备电。

供水:



生产、生活用水接取当地自来水或抽取地下水，必要时修建临时蓄水池。

第三节 资源配置计划

1、人员动员

如果我公司中标，将利用 2 至 5 天的时间对进场人员分片、分级、分职责地进行动员教育。

首先由项目经理召集各部、室负责人和施工队长用 1 天的时间进行高层管理人员的施工动员；再由中级管理人员用 1 至 2 天时间对各施工队的工长、组长、专业作业人员进行施工动员，做好岗前培训。以饱满的工作热情全面展开施工。

2、设备、人员的动员周期

拟投入本标段施工的各种机械设备尽快组织调遣，合理配置，择优进场，就近调整，确保设备状况良好，指定专业机械工程师和技师，按照机械设备的使用、维修、保养规定做好维修保养，确保完好率。

3、临时设施

(1) 施工用电

沿线电网发达，项目部进驻工地后，根据现场考察情况，驻地用电和施工用电利用地方供电系统，架设施工电路。同时，我公司将配备发电机组，作为备用电源，以保证电网停电时能继续施工，再配备几台灵活易移动的小型发电机，以便保证电网条件无法到达时的构造物施工。对于临时电力系统的建立，我们将联系当地政府和电力部门，签定用电合同和临时电力线路架设合同，并将配电系统和临建电力设施完整的文字说明，提交工程师批准。

(2) 办公设备

为了便于施工和管理，我公司进驻工地后，根据要求配备复印机、传真机、扫描仪、录像机、数码摄像机各一台，激光打印机、笔记本电脑和台式电脑若干台，以保证办公自动化和现代化的要求，方便工程施工。

(3) 临时道路

为了便于施工，进驻工地后，根据施工组织和现场考察情况以书面形式提交增加的临时道路占用土地数量和其它设施，并与当地政府和主管部门联系，征得批准后，进行临时道路及施工便桥的修建。临时道路及施工便桥的修建满足施工车辆、机械的通行，并进行养护维修，以利于施工。

(4) 其它设施

我公司将根据业主要求和其它要求，满足一切其它设施的配备，如临时排水、水渠改移、急救、防火、防洪等设施的建设。



1. 驻地建设

按照施工场地布置示意图，在施工路段设置标牌。施工驻地依照有关规定合理布局，明确划分工作区、生活区，驻地办公室、宿舍、医务室、文娱室、食堂、工地试验室、车间、工作场、仓库与贮料场等设施，修建达到通讯、安全、透光、整洁、防火、防盗等要求，以满足工程施工需要。

根据本标段工程特点，结合我单位的技术装备能力和实践经验，为确保实现工程质量，安全和工期的规划目标，施工组织的总体主导思路是：抓紧时间施工，把干扰因素降到最低，安全施工，质量严控，确保创优，提前竣工。

第四节 施工组织机构及各部职责

为确保按期、优质、高效的履行合同条款，中标后立刻组织施工经验丰富的技术人员组成经理部，组织和开展各项工作。项目经理和技术负责人都是具有丰富施工经验的工程师，项目经理部下设总工程师（技术负责人）、工程部、机料部、财务部、质检部、综合部。

项目经理：是本公司在该工程的全权代表，在本公司的领导下，全面负责工程的质量、进度、经费的计划和管理以及安全文明生产。对工地人员的分工、各部门之间的协调以及处理项目实施过程中的社会关系。投入至本工程的项目经理曾多次担任过高速公路工程与其他级别公路、桥梁工程的项目经理，其以前管理的项目工程均被评为优良工程，具有丰富的项目管理经验。

项目总工（技术负责人）：配合项目经理把好整个工地的工程技术关，安排各技术、施工人员的工作，对工程整体的技术工作有全面、仔细的掌握。

工程部：对技术负责人做出的技术方面的安排予以贯彻执行，并做好合同管理、统计报表、计量、测量等工作。负责工程施工计划的制定和落实，以及施工过程的安全生产的监督，并对施工过程进行动态管理，保证施工计划的全面完成。

质检部：做好工地的各项试验工作并提供详实、准确的实验数据以配合工程更好的开展。对项目经理部所承包标段内的所有工程构造物及路线进行检测、复查。

机料部：按照工程部下达的计划及时做好各种设备、材料的供应工作。

综合部：负责工地的后勤安排，做好接待工作，对工地的先进事迹进行报导宣传，对员工的考勤进行核查。

财务部：掌握好工地的资金收支情况，配合项目经理做好工作，保证工地能正常运作。

内业组：负责经理部工程开工及施工、竣工过程所有内业资料的收集、填写、整理。



第四节 总体施工组织规划

施工组织管理目标如下：

一、质量目标

标段工程交工验收的质量评定： 合格 。

竣工验收的质量评定： 达到合格或以上的质量标准 。



二、工期目标

计划工期：180 日历天，缺陷责任期 12 个月（具体从开工令发出之日起计算） 。

三、安全目标

严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内无较大及以上生产安全责任事故发生 。



第二章、主要工程项目的施工方案与技术措施

第一节 交安工程

一、交通标志

(1) 放样定位，先按图纸要求的位置、尺寸放出交通标志的位置及基础大样，请监理工程师查看，检查标示位置的准确性。

(2) 挖基，在事先放出的位置挖出标志基坑，并保证其深度、尺寸符合要求。

(3) 浇筑混凝土及预埋螺栓，在已开挖并经检查合格的基坑内预埋连接螺栓和定位法盘，检查无误后浇筑混凝土并振捣密实，抹平底座顶面并修饰外露边缘。待混凝土达到一定强度后，回填基坑并夯实。

(4) 支柱安装及碑体的埋置，标志牌支柱的预制安装依据并符合技术规范的要求，埋程碑的制作、安装严格遵照图纸及技术规范的要求进行施工，碑体埋置后夯实，施工做到碑体无污染，无损伤。

二、道路标线

(1) 试验标线，标线开工前，按监理工程师的指令涂刷一段试验标线，先定施工方法和设备，经监理工程师同意后，再展开施工。

(2) 放样，在路面完工后，按图纸要求的尺寸放出路面边线的位置。

(3) 涂刷标线，开始作业前，将路面尘土、杂物彻底清除干净，保证涂刷时路面清洁、干燥。标线作业在白天进行，气候潮湿，灰尘过大，或气温低于 40℃ 时暂停作业，作业过程中实行交通管制，防止涂料被污染。施工做到标线线形平顺、美观、薄厚均匀。

三、波形梁钢护栏施工

一、施工准备

施工开始前，施工技术人员熟悉、理解设计图纸以及相关的施工规范，并与施工人员一起到施工现场与设计图纸一一核对，找出所施工路段桩号、各类构造物及各结构护栏设置地点，同时做好施工设备及材料的进场工作。

1、钢护栏立柱放样

①、立柱应根据设计图纸进行放样，并以桥梁、通道、涵洞、立交、平交等为控制点，进行测距定位，可利用调整段调节间距，并利用分配方法处理间距零头数。

②、为准确放样和保证护栏的线形，隔段进行桩号复核和闭合。

③、立柱放样后，应调查每根立柱位置的地表状态，如遇地下通讯管线、泄水等，或涵洞顶部埋置深度不足时，应调整某些立柱的位置，改变立柱固定方式。



2、钢护栏立柱安装

①、根据设计图纸进行立柱钻孔，并检查使之与道路线形相协调。

②、如路肩基本情况允许，采用打入法设置立桩，施工时应精确 定位，立柱打入土中应至设计深度，当打入过深时，不得只将立柱部 拔出加以矫正，而须将其全部拔出，待基础压实后重新打入。

③、立柱打入困难时，可采用钻孔法或开挖法安装立柱。采用钻孔法安装，立柱定位后应与路基相同的材料回填，并分层夯填密实； 采用开挖法埋设立柱，回填土应采用良好的材料并分层夯实（每层厚 不超过 15cm），回填土的压实度不应小于相邻原状土。

④、设置于构造物中的护栏立柱，施工一般在结构物施工时已做 好砼基础。采用预留孔基础时，应先清除孔内杂物，吸干孔内积水， 将化好的沥青在孔底涂一遍，然后放入立柱，控制好标高。即可在立 柱周围注砂。在灌砂时一定要保持立柱的正确位置和垂直度。把砂振 实后，即可用沥青封口，防止雨水漏入孔内。

⑤、沥青路面段的立柱施工时，柱坑从路基到面层下 5cm 采用与 路基相同的材料回填并分层夯实，余下部分采用与路面相同材料回填 并夯实。

⑥、立柱安装就位后，其水平方向和竖直方向形成平顺的线形。

⑦、渐变段的端部护栏施工时，应按设计规定的坐标严格控制其 立柱位置，注意抛物线形。

3、波形梁安装

①、波形梁安装时，通过拼接螺栓相互拼接，并由连接螺栓固定 于立柱或横梁上。波形梁拼接方向是安装的关键，施工时保证搭接方 向应与行车方向一致。

②、波形梁在安装过程中应不断进行调整，因此连接螺栓及拼接 螺栓不宜过早拧紧，以便在安装过程中利用波形梁的长圆孔及时进行 调整，使其形成平顺的线形，避免局部凹凸。

③、安装时波形梁顶面应与道路竖曲线相协调。并检查护栏的线形，当确定线形比较直顺和流畅时，方可最后拧紧螺栓。

4、防阻块安装

防阻块能防止立柱阻拌车轮，避免护栏局部受力和碰撞时车辆减 速，因此，应保证使其准确就位，在安装调整之前，即可安装防阻块， 防阻块通过连接螺栓固定于立柱之间，最后把波形梁装上并进行统一 调整。

5、波形梁钢护栏起、终端头安装



路侧护栏开口处应安装端头梁并进行锚固。端头锚固主要包括钢丝绳锚固件及混凝土基础。在端部基础混凝土设计强度达到 50%以后，方可拧紧螺栓或固定缆索。

6、活动式钢护栏安装

该标段活动式钢护栏设在中央分隔带开口处，其安装在波形梁钢护栏安装完成后进行。在施工安装前根据设计文件要求，应对活动式钢护栏的安装位置、数量进行核对；按照确定的位置进行安装，安装时应使其垂直于地面，纵向线形适顺，不得有凹凸和扭曲。基座套管是提前预埋的，安装后应测试是否易于拔出及重新插入。

注意事项

- ①施工准备应充分，施工路段桩号位置找准确。放样应精确，误差在规定范围内。
- ②立柱施工应严格认真，其垂直度、间距、螺栓孔位置及其它尺寸均应符合要求，不符合要求需立即返工，同时，应严格按照规范 JTJ074-94 规定进行返工。

四、轮廓标施工方案

轮廓标直线段的间距为 48m，曲线段落依据图纸设计间距进行埋设。根据图纸设计要求测量定位，基础开挖、准备混凝土将轮廓标定位，植入轮廓标施工，最后调节线形。

1) 测量放样：放样前与监理工程师取得联系，根据图纸进行位置测量定位，进行测距定位。主要采用全站仪确定每段起始桩号和公路轴线，然后用 48 米的钢卷尺确定每一根立柱具体桩位。放样后，再次确认每根位置的地基状态，如遇地下通讯管线、泄水管等，或涵洞顶部埋土深度不足时，应调整某些位置。

2) 混凝土搅拌：根据业主和监理的要求进行沙、石、水泥的采购。不合格的原材料不得进场，然后进行砼配合比的实验工作，制定合格的砼配比，然后以配合比进行搅拌。

3) 基坑开挖：依原测量位置按图纸要求进行开挖，如果基坑位置在涵洞、和大桥旁应错开 1-3 米进行施工。

4) 轮廓标的安装：将混凝土和轮廓标运至现场，施工期间应根据路行的位置将线形进行调节，使其形成平顺的线形，避免局部凹凸。

5) 柱式轮廓标的调整：安装完后，每 10 跨护栏用拉线进行顺直度的调整，以保证轮廓标和波形梁护栏的线形相协调，最后定位。

第二节 绿化工程施工

1、施工前准备

- ①. 组织落实好施工队伍，突击施工时必须保证劳动力充足。



②、确定施工程序：清理场地→定点放线→挖坑→选苗→起苗→运输→苗木修剪→苗木栽植→苗木浇水管护。

③、根据工程任务和劳动定额作出劳动计划，组织好劳力来源和使用时间以及具体的劳动组织形式。



④、根据工程进度和苗木的生理特性，确定栽植的顺序和材料的供应及运输。

2、定点、放线

利用平板仪或网络法，根据图纸的比例要求，放样出植物群落和单株种植的位置，利用标桩作出标记，写明树种及树坑规格。

3、苗木选择

根据已确定的苗木规格，选用单株壮苗、树形好、抗性强、无病害的当地苗木。为确保栽植苗成活，起挖苗木要保全较多的根系，避免损伤，使栽后能迅速恢复吸收能力。常绿树移植时必须带土球，修剪树冠。起挖树冠庞大的常绿树，为减少枝条拆断，要收缚树冠，收缩到最小体积。树苗挖好后，要尽量在最短时间内运走，遵循“随挖、随运、随栽”的原则。

4、挖坑

栽植坑的质量，对植株以后的生长发育有很大的影响，应根据和种不同规格的苗木及土球的大小、土质情况来确定坑的大小，一般应比规定的根系及土球直径大 20-30cm，同时根据树种根系类别，确定坑的深浅。坑挖好后，将定点用的木桩插在坑的土堆上，以备散苗时核对。

5、树木种植

栽植前对苗木根部作必要修剪，剪掉腐根和过长根。树冠必须修剪掉病虫枝和拆枝，并适当修剪较稠密的细弱小枝，使树冠枝条分布均匀。栽植深度是树木成活生长的重要环节，一般栽植深度比原圃略深约 5-10cm，根茎与地面相平为宜。栽时苗直立穴中，保持根系舒展，填土至一半，稍掉苗，分层踏实，栽后在树穴四周培土围好，及时均匀浇透水，水下渗后，覆土在表层。常绿树栽植时，将树苗放入穴中，摆正，但要防止土球散破，解土绳索，然后填土，在土球四周均匀地填表土，最后填上层，定植时必须及时填土踏实，以免架空透风，降低成活率。种植浇水是树木成活的关键，迟浇、浇水过多、过少均不适宜。对不同树种、应根据当地气候、土壤条件进行浇水。为防止种植后树木受人为或自然损害、产生摇晃，种植胸径 5cm 以上的乔木应设支柱。对攀缘植物可根据生长需要，进行绑扎牵引。

6、草坪、花卉种植

草坪种植可以选用播种、分株，茎枝繁殖、铺草块等方法。选择不同方式，应注意适宜季



节和草种类型。花卉种植用苗应选用经过1~2次移植，根系发育良好的植株，裸根苗应随起苗随种植，土球苗不得散球，注意保鲜不得萎蔫，目的是为了提高种植成活率。花坛种植时，应按设计要求分色彩种植，在起苗、运苗、分苗当中，应将不同品种，不同色彩分别置放，严防混淆。花苗种植时注意植株高低，冠径大小合理搭配。栽植深度以原种植深度为好，栽后及时浇水，注意浇水方法，不能沾污植株。





第三章、工期保证措施

第一节 工期关键线路图

我公司经详细的排定施工计划，将总工期控制在规定时间内，对确保工期有一定的把握，

开工后的前 5 天我方进场，进行工序交接，在现场对照施工图放线，办理相关手续，给现场施工创造便利条件。

施工中以关键线路和次关键线路为线索，并确定关键线路上的任务为里程碑任务，按照在网络计划中的安装以及后期为工程创造条件，作为重点控制对象。在施工中要针对不同阶段的重点和施工时的相关条件，制定施工细则与作业方案，通过更加具体的分析研究和平衡协调，达到保证工期控制点的实现。

中标后项目部将进一步深化进度计划，排出影响落实关键节点的因素，提出针对性措施，并落实于人，每周出周计划。进一步落实控制措施，运用计划进行跟踪检查等手段，保证整个工程的按时完成。

第二节 工期保证体系运转流程

各分项工程开工以前，工程技术人员必须仔细阅图，对各分项工程进行工期划分，编制科学合理的总体施工进度计划，运用专业管理软件，对施工计划进行动态控制；并在总计划的基础上分解明确的月及旬计划，项目经理抓住主要矛盾，严格按计划安排组织施工，重点抓好关键工序的施工。定期检查施工计划的执行情况，及时对施工进度计划进行调整；在施工过程中，根据施工进展和各种因素的变化情况，不断优化施工方案，保证各工序的衔接。

第三节、工期保证措施

1、地形地貌、特征:我司已先行组建有丰富经验的施工队伍对工程进行实地考察，充分了解工程地形地貌、特征。一经中标，就能立马开展工作，积极推动项目进程。


2、重点工序技术:精心安排施组，强化管理，在深入调查，吃透设计意图的基础上，编制实施性施工组织设计，分级负责，认真实施，并在实践中不断优化，高起点、高质量、严要求。

3、关键设备故障措施:编制机械安全技术操作规程，组织专人深入现场，督促检查设备安全工作情况，发现问题，及时纠正，消除隐患，使机械设备达到安全、优质、高效、低耗地运行。严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律和无知蛮干等操作行为。

4、天气应对预案:雨季施工要做好预防工作，使工程能有序和不间断的进行。修建施工便道时，做好标高和质量控制，做好排水措施，对施工便道修建投入一步到位，保证施工便道在雨季中的正常使用。雨季加强道路保养，保证便道畅通、材料运输不受影响。



5、做好与其他承包人衔接:开工前,与其他相邻标段做好施工便道、便桥、临时电线、排水系统、取弃土场等的规划衔接,做好与相邻标段的控制点联测工作。施工过程中,加强沟通,做好与其他标段的资源共享和互相协调工作。



6、社会环境:本项目地处居民周边,项目的实施将会对居民生活造成一定的影响,我司将专门成立沟通小组,开工前与当地居民积极沟通,充分了解居民的生活规律及需求,确保工程的顺利进利及与居生形成良好的协作关系。

(7) 劳动力保证

1、根据工程内容和工程需求情况选择专业施工队伍,确定各施工队伍人员数量,组织相应队伍进场。

2、组织管理人员、技术人员、特殊工种和各专业技术工人进行相应专业的技术培训和学习,使每一位施工的管理者和操作者对各分项工程的技术要求、工艺流程、质量标准做到熟悉明确。

3、必要时,在全公司范围内调动施工队伍和管理人员,确保本工程顺利实施。

(8) 安全管理保证措施

加强安全文明生产管理,根据本工程的实际情况,制定各项目施工的安全措施,处理和协调好各标段的关系,做好基坑经常性排水。

加强公路运输管理、用电及高空作业安全等管理,确保施工人员、机械安全及文明施工。

(9) 加强对外联系与协作

加强同相关方面的联系和协调,谋求工程施工良好的外部环境,增进同监理人、设计单位、相邻施工单位的联系,加强与交通、供电、供水、环保、公安等部门以及工地邻近单位和居民的联系与协调,争取理解和支持,确保施工生产顺利进行。

第四节 工期保证体系

一、组织结构的设立

成立由项目经理任组长,项目副经理、总工程师任副组长、各部门负责人参加的“工期保证领导小组”,从组织上保证工期目标的实现。加强组织领导,选派精良的施工队伍,以组织保工期按照“精干机构、精良设备、精兵强将”的原则组成一支精干、高效的项目部。根据工程特点投入足量专业化施工队伍进行施工,减少中间环节,加强施工能力,合理布署,严密科学组织施工。上场劳力数量和技术素质满足工程需要,加快施工进度。工期保证框图如图 3-1 所示:

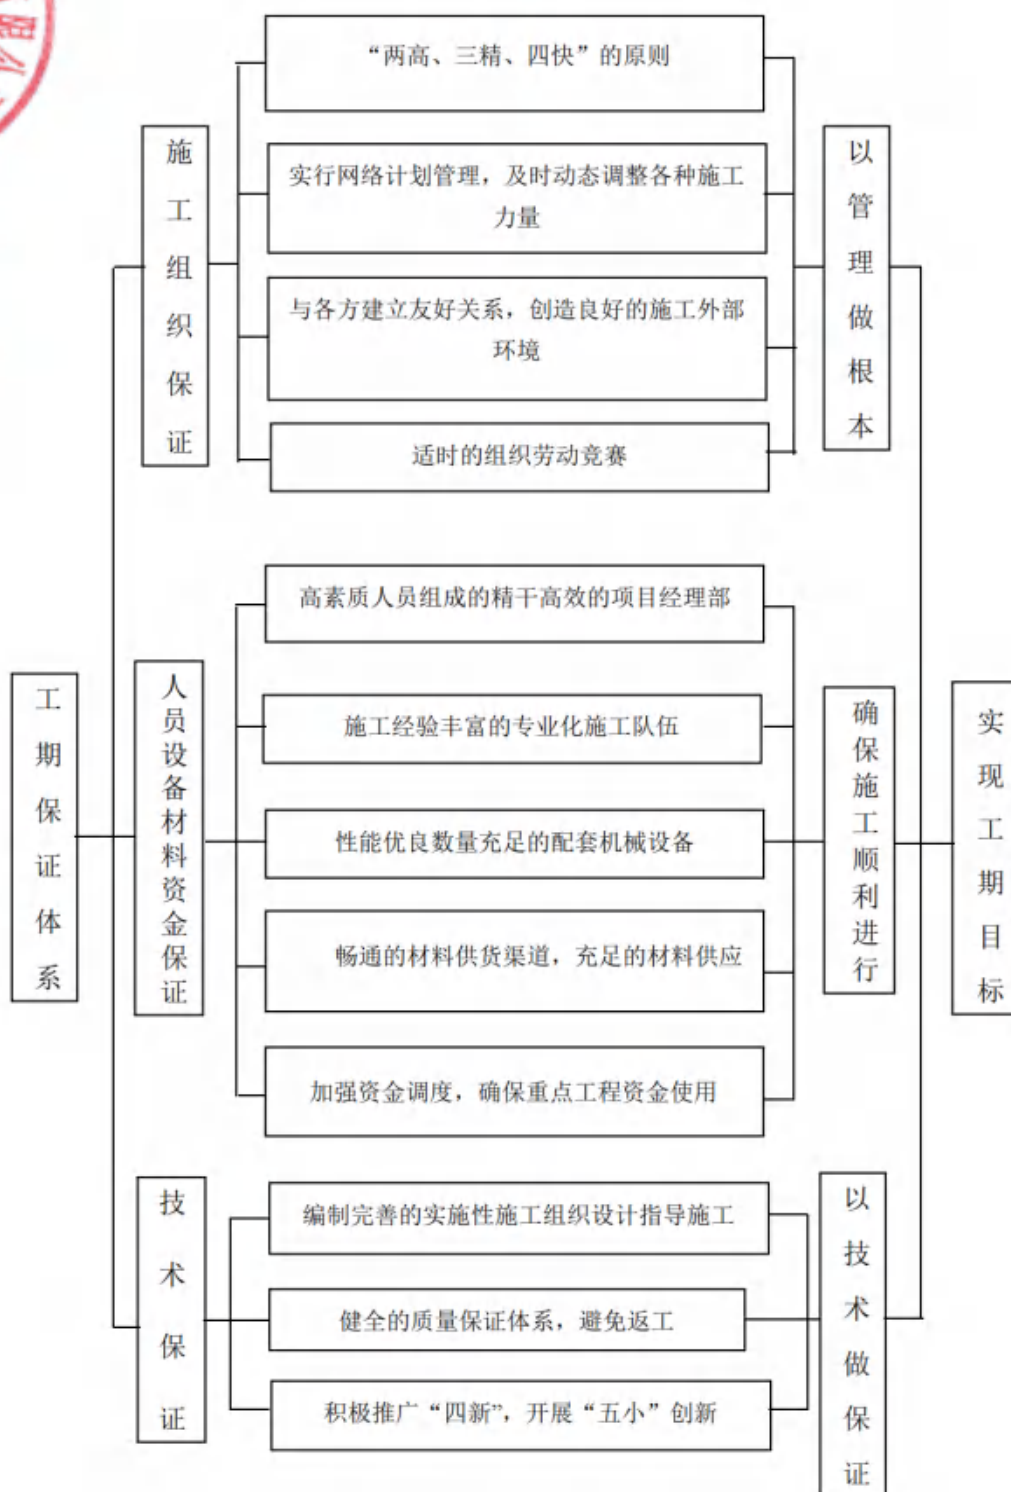


图 3-1 工期保证框图

3、制度的设立

健全岗位责任制，从制度上保证工期目标的实现。

二、施工组织保障措施

1) 为保证计划的如期完成，选派具有类似工程管理经验的施工总承包项目经理担任该工



程的施工总承包项目经理，再配置施工经验丰富的项目副经理、项目总工程师等专业技术管理人员，组成强有力的施工总承包项目经理部。

2) 在绝对保证工程质量和安全的前提下，充分利用施工空间和时间，合理安排工序，科学组织各工序的立体交叉作业。

3) 对各专业施工队伍实施严格的管理控制。各专业队伍进场后，必须根据施工总承包项目经理部总进度计划编制各专业施工进度计划，各分包单位必须参加施工总承包项目经理部定期或不定期召开的生产例会，把每天存在的问题以及需要协调的问题落实解决。如因某专业队伍影响总进度计划关键工期，则要求其编制追赶计划，采取相应措施并实施。

4) 严格工序施工质量，确保一次验收合格，杜绝返工，以一次成优的施工过程，获取缩短工期的效果。

5) 建筑施工综合性强，牵涉面广，可能因难以预见的因素而拖延工期。尤其在装修、安装阶段，为保证工期，应在结构施工阶段就对装修材料、做法进行认定，选定材料，确定样板，进行落实。这些工作也需要业主的密切配合和支持。

三、施工准备的保障措施

1) 工程开工前，首先组织参与工程施工的相关专业工程师，由项目总工牵头对项目各级管理人员进行集中培训，学习相关法律法规，灌输本项目管理指导思想、管理原则及方法，学习国家、市颁布的新规范、新条例，学习针对本工程所确定的管理规定、施工工艺、施工方法，让所有管理人员吃透设计文件，掌握施工管理、施工组织及施工技术的全部内容，管理人员须经考核通过后才能正式上岗。项目管理人员再对其管辖范围内的劳务层各专业施工队进行培训，以书面交底方式，让劳务层人员都能熟悉掌握各项管理制度，操作工艺等。

2) 施工总承包项目经理部协调各个专业施工队伍主要施工人员提前吃透图纸内容，提出图纸中存在的和施工中需解决的问题，尽快组织图纸会审，做好开工前的准备工作。

3) 设施建设和大型机械进场，塔吊的安装，应及时安排落实，为下部工序提供条件。

4) 和设计、监理单位进行联系，尽快取得场地坐标控制点的布置图，为进场测量定位做好准备。

四、强化双周滚动等施工进度计划管理

1) 定期的生产计划例会制度，下达计划，检查计划完成情况，解决实际问题，协调各施工队之间的工作，统一有序地按总进度计划执行。进度计划控制循环图。

2) 控制关键日期（里程碑）为目标，以滚动计划为链条，建立动态的计划管理模式。在总控制进度计划的指导下编制阶段、月、周、日等各级进度计划，一级保一级，绝不能拖延总



控制进度计划。

3) 月进度计划、周进度计划的控制

①采取多种形式的施工计划 采取行之有效的分步作业计划，分步作业计划是确保总计划实施的重要方法，根据土建施工、材料设备供应等情况，我们将安装工程总进度计划分解为月、周、日分步作业计划，实行月计划、周实施、日落实的计划管理体系。



②双周滚动计划

工程施工过程中存在着许多动态的因素，需不断地进行调整解决。我们将实行检查上周、实施本周、计划下周的双周滚动计划管理办法，本办法将计划的实施、检查、调度集于一体，使管理工作具体化、细量化，以业主、监理组织召开的工程协调会的工程进度布置为目标，项目内部协调会检查实施情况为依据，通过严密的分析讨论，制定下周的工作计划。同时进行严格的组织管理，以确保总计划的顺利实现。

③日检查工作制

专业责任工程师是施工技术、进度、质量的主要责任人，责任工程师每日进行现场检查，并将检查的结果以书面的形式报给项目调度室，调度室收集、汇总、分析后报给分管项目副经理，使其及时了解施工动态，监督和督促各专业工程师及施工班组按计划完成工作，或者进行必要的调整。

④周汇报工作制

配合双周滚动计划的实施，建立每周进度汇报分析制。汇报分析会由项目副经理主持，项目经理、项目总工、项目总调度和各级主管人员参加，检查落实一周工作情况，并将检查分析的结果书面汇报给监理单位、业主，备份并存档。若有因外部原因影响工程进度的，在汇报中提出建议及要求，在业主主持的协调会上提出解决。

⑤月分析调整制度

项目部按月对总进度计划、区域进度计划进行分析、总结。根据具体情况对进度的个别节点进行调整，并在内部协调会上进行必要的生产要素调整。由项目经理主持、分管副经理、调度室、总工程师及有关人员参加，最终将分析调整的结果书面汇报公司及业主、监理单位，备份存档。

⑥加强计划的严肃性

在计划确定后加强计划的严肃性是非常关键的，各级施工进度计划是完成该工程的基础工作，必须在日常工作中提到首位，以计划管理带动施工各要素管理。要求施工中各级管理人员必须坚持严谨的工作作风，做到当天的工作不过夜，本周的工作不过周，一环扣一环地完成每



一、点计划，使工程向着纵深的方向正常发展。

4) 对各及计划的关键线路深入分析，最大限度地控制缩短关键线路的潜力。同时，利用计算机实现计划的优化管理，应用微软公司 Project 2012 系列软件、梦龙智能项目管理系统

编制各级进度计划并进行优化，以便及时准确地将实际施工中各种反馈信息反映到修改的进度计划中，不断修改计划中存在的的不合理性，提高滚动计划编制效率和准确度。

5) 对施工进度实行三级计划管理，及时调整计划偏差，现场每天召开一次碰头会，检查当天计划完成情况，提高对进度计划控制的预警和应变效率，确保对各控制点目标按期实现，对完不成计划的单位，要分析原因，采取措施，将损失的工期补回来施工中影响进度及各专业协调的问题在例会上要及时解决。如工期有延误要找出原因制定追赶计划。编制施工进度计划的同时也应编制相应的人力，资源需用量计划如劳动力计划，现金流量计划、材料、构配件、加工、装运到场计划等并派人追踪检查，确保人力资源满足计划执行的需要，为计划的执行提供可靠的物质保证。

五、分段分块交叉作业保证措施

为最大限度地挖掘关键线路的潜力，各工序的穿插以紧凑为前提，尽量压缩工序施工时间。结构施工阶段，安装预埋将根据需要随时插入，不占用主导工序时间，装修阶段各工种之间建立联合验收制度，以确保时间充分利用、同时保证各专业良好配合，避免互相干扰和破坏。

六、劳动力投入的保证措施

为确保工期完成，我们将选优良的施工队伍，并按工种需求选择专业施工队伍，加强其进度的竞争性，奖优罚劣，互相激励促进。不会因节假日或季节而导致劳动力缺乏，劳动力保障有力、及时。

七、施工机具及工器具投入的保证措施

为缩短工期，降低劳动强度，我们将最大限度地提高机械化施工水平。根据工程施工特点，考虑到塔吊安装、附臂、拆除等因素，我们准备投入适合型号的塔吊数量。其它施工机械，如：钢筋加工机械、木工加工机机械、砂浆搅拌机械、安装各专业施工机械等考虑若干，这些都是按时完成施工计划的有力保证。

八、资金材料管理保证措施

工程执行专款专用制度以防止施工中因为资金问题而影响工程的进展，充分保证劳动力、机械的充足配备，材料的及时进场。随着工程各阶段控制日期的完成，及时支付各专业队伍的劳务费用，为施工作业人员的充足准备提供保证。

九、采用先进的施工技术保证措施



积极推广应用新技术，增加科技含量，争取缩短工期。大体积混凝土采用远程自采集测温系统，电梯井采用定型模板，以提高劳动生产率；砼采用砼泵送技术，掺加高性能砼外加剂，采用钢筋现场加工成型绑机，接头采用滚压直螺纹钢筋连接等施工工艺和技术等。

十、外部环境保证措施

1) 积极主动与当地街道办事处，派出所、交通、环卫等政府主管部门协调联系，与他们交朋友，取得他们的支持理解，并多为施工提供方便条件。

2) 做好施工扰民问题的细致工作，积极热情地与当地居民联系沟通，取得周围单位和居民的理解和支持，做到必要时能全天候施工，保证施工进度要求。

十一、夜间施工保证措施

1) 施工照明与施工机械设备用电各自采用一条施工线路，防止大型施工机械因偶而超载后跳闸导致施工照明不足。

2) 施工准备期间，分别在场子四周搭设大功率镝灯，用于整个施工现场夜间照明。

3) 结构施工至-1层后，在塔吊支架处加设镝灯，用于施工作业层的夜间照明。

4) 同时配备20架以上碘钨灯，作为零星照明不足的补充。

5) 夜间施工时，加强进行安全设施管理，重点检查作业层四周安全围护、电梯洞口防护等部位，确保夜间施工安全。

十二、采取合理的施工方案保证措施

1) 充分熟悉工程的设计图纸，对拟定的施工组织设计、施工方案及方法进行认真的分析比较，作到统筹组织、全面安排，在施工过程中制定阶段性工期控制点，确保按期完工。针对工程特点，采用分段流水施工方法，减少技术间歇，对主要项目集中力量、突出重点，制定严密的方案、合理的施工穿插，尽可能压缩工期，加快施工进度。重视施工组织设计的动态管理和不断优化。

2) 提前进行砼的试配工作，尤其是高强度等级砼的配置。

3) 提前搞好模板的设计、加工，在模板工程中墙、柱、梁、板采用覆膜竹胶板，施工中采用满堂脚手架快拆支撑体系。

4) 合理地加大投入，提高机械化作业程度，充分满足工程所需的人、财、物要求，如：配备足够的塔吊、输送泵、周转材料，提高劳动效率。

十三、采用严格的管理与控制手段保证措施

1) 强化项目法管理，实行项目经理负责制，设立能协调各方面关系的协调机构，配备素质高、能力强，有开拓精神的管理班子，确保施工进度。



2) 利用微机,推行全面计划动态管理,控制工程进度,建立主要形象进度控制点,运用网络计划跟踪技术和动态管理方法,做到周保旬,旬保月,坚持月平衡、周调度、工期倒排,确保总进度计划的顺利实施。



3) 认真做好施工中的计划统筹、协调与控制。严格坚持落实每周工程施工协调会制度,作好每日工程进度安排,确保各项计划落实。编制详细的工程施工总进度计划,并采用微机管理技术,对施工计划实行动态管理;建立主要的工程形象进度控制点,围绕总进度计划,编制月、周施工进度计划,作到各分部分项工程的实际进度按计划要求进行;每期根据前期完成情况和其它预测变化情况,对当期计划和后期计划、总计划进行重新调整和部署,确保按原定或因非施工原因调整了的期限交工。

4) 实行奖励机制,拟订拿出一定的资金作为目标管理和科技进步奖励基金,充分调动全体施工人员的积极性和创造性,力保各项目标按期实现。

5) 制定各工序的操作规程和质量标准,强化施工现场管理,作到文明施工,努力实现施工管理的标准化、科学化、合理化,使施工生产有条不紊。

6) 作好冬、雨季施工的管理和安排,尽量减少冬、雨季对施工的影响。

7) 强化项目内部管理人员效率与协调,增强与业主的联系,加强对劳务分包方的控制和与各供货厂商的协作,并明确各方及个人的职责分工,减少扯皮现象,将本工程建设的各方面人员充分调动起来,共同完成工期总目标。

8) 创造和保持施工现场各方面各专业之间的良好的人际关系,使现场各方认清其间的相互依赖和相互制约的关系,增进与业主、监理、设计单位的联系和配合,及时解决问题。

9) 质量与成品保护:加强质量检查和成品保护工作,尤其是样板引路制度的贯彻和施工过程中的监督检查工作,确保各道工序施工一次成功,减少返工、窝工造成的时间浪费和对其他工序的延误、压缩和对整体工程的拖延。

第五节 工期保证措施

1、缩短施工准备期,努力创造提前施工条件

(1) 中标后立即组织项目主要管理人员及其他有关人员 14 日内进入现场,开展紧张而有序的准备工作的。进行详细的施工调查、测量、复测、三通一平等临时工程的规划和设计,落实施工图纸。同时组织其它人员、材料、机具设备迅速进场,生产、生活设施齐头并进,尽量缩短施工准备期,早日开工。

(2) 施工人员进入工地后若施工用电未能及时接通,即用临时发电和内燃机械投入施工。

2、确保工期的组织措施



(1) 抽调富有管理经验且年富力强的干部和有施工经验、战斗力强的施工队伍，按投标书附表配备数量充足、结构合理的施工人员和机械设备，并在施工中根据情况予以加强。

(2) 加强现场施工协调指挥，做到指挥正确、协调得力、效率高、应变能力强。以项目经理和项目经理部总工程师为首的管理体系，决策重大施工问题，确定重大施工方案，分析施工进度。

当实际进度落后于施工组织设计要求时，提出加快施工进度措施。

(3) 项目部有关人员参与施工前的各项工作，尽快熟悉工程特点、发包人要求和投标书内容，及时同当地政府联系、交流以取得当地的支持、理解，以提供良好的施工环境，认真实现我方的承诺。

(4) 建立、健全岗位责任制，施工人员定岗定责，明确技术标准、工艺措施、强调施工纪律，严格按设计规范要求施工。

(5) 深化改革，完善竞争机制和激励机制，实行全员风险承包，使任务层层落实。使工作效率和职工的经济利益挂钩，认真兑现，充分调动全体职工的积极性。

3、确保工期的技术措施

(1) 精心安排施组，强化管理，在深入调查复核、吃透设计文件意图的基础上，编制实施性施工组织设计，分级负责，贯彻实施，并在实践中不断优化。施组的实现关键在强化管理，要高起点、高质量、严要求。

(2) 通过合理的组织与正确的施工方法，尽快形成生产能力，提高施工进度，保持稳产高产，使施工作业程序化、标准化。

(3) 认真做好工程的统筹和网络计划工作，认真编制网络计划，明确关键线路和控制工程，报监理人批准。保证组织科学、安排合理、生产均衡。在安排工期时留有余地，确保全标段工程工期。牢牢抓住关键工序的施工管理，控制循环作业时间，提高施工效率。

(4) 优化施工方案，提高施工进度。在不良地质地段采用稳妥施工方法防止安全事故的发生。

(5) 注重依靠科技进步，提高生产效率和管理水平。大胆采用新技术，在关键工序采用施工效率高的机械。对影响施工进度的施工技术难题，积极组织攻关，充分吸取各方面的合理化建议和广泛开展小改小革活动，提高施工进度和经济效益。

(6) 根据施工总进度的要求，分别编制年、季、月、旬、周施工生产计划，实施中对照检查，找差距、找原因，及时调整进度计划，步步为营地保证施工总进度。

(7) 施工安排上充分考虑季节对施工的影响并制定相应措施，确保工程按期完工。

(8) 按生产计划情况编制材料供应计划，超前定货，并备有足够的合理库存量，保证工程



物资供应。

(9) 在施工中广泛采用电脑处理日常业务工作，形成内部局域网，使用符合实际情况的项目管理软件，从而提高管理效率，争取管理决策的程序化、科学化和数据化，实现施工管理的

信息化。



第六节、其他措施

1、特殊季节施工保障措施

根据本工程水文气象资料，项目所区域属亚热带海洋性气候，土地肥沃，雨量充沛，资源丰富。冬短夏长，冬暖夏凉，日照充足，雨量充沛，干湿季明显，区内年平均气温 21.3℃-22.8℃，年平均降雨量 1785 毫米，雨季多在 4 至 9 月，10 月至次年 4 月多年平均降雨量未 300mm，占全年雨量的 17%。区内受台风影响频繁，强热带气旋次数多年平均 1-4 次，风力一般 6-9 级，最大达 12 级。对于安排在汛期施工的部分项目，需做好雨季施工措施，应针对不同的工序提前制定应急方案。

(1) 雨季施工措施

根据本工程水文气象资料，工程区雨季多在 4 至 9 月，10 月至次年 4 月份。对于安排在汛期施工的部分项目，需做好以下雨季施工措施：

项目部成立防洪抗险领导小组，项目经理任组长，安全总监、项目副经理、总工程师任副组长，成员由安全环保部、设备物资部等各职能部门、以及各施工队负责人组成。防洪抗险领导小组负责组织雨期施工的生产、技术、质量、安全管理和物资的供应，负责防洪抗险期间施工工作的协调组织。

1、雨期施工的技术准备

在进入雨期施工前，制定防汛计划和紧急预防措施。对在雨期施工的分项工程，严格核对施工图纸，检查其是否能适应雨期施工要求。否则应提前与设计沟通，采取其它措施解决。在进入雨期施工前，对所有参施人员，进行雨期施工培训。

及时听取天气预报，合理安排施工生产。准备好完善的防雨器材以应付突来的不利天气，并组织相关人员进行一次全面检查，包括临时设施、临电、机械设备防雨、防护等工作，检查施工现场及生产生活基地的排水设施，疏通各种排水渠道，清理雨水排水口，保证雨天排水通畅。雨期前对现场配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查，需加固的及时加固。缺盖、罩、门的及时补齐，确保用电安全。

做好施工现场的排水工作，保证施工作业面及施工道路无积水；做好施工用料的防雨、防潮工作；做好生产、生活区的排水工作。



现场机械设备要有防雨、防潮、防淹措施，电动机械、手持电动工具必须设安全漏电保护器。雨季施工对动力、照明线路及供配电设备进行全面检查，杜绝跑漏电现象。配电箱、电闸箱有防雨、防潮措施，并外壳有接地保护。各种电气化动力设备经常进行绝缘、接地、接零保护的检测，发现问题及时解决，尤其在雨后对设备电缆线检查确无问题后，方可开闸施工。

现场的工棚、仓库等临时设施应在雨期施工前进行全面检查和整修，保证道路不塌陷，房间不漏雨，场区不积水。

大雨到来前，作好各、脚手架防雷装置，质量检查部门在雨期施工前要对避雷装置作一次全面检查，确保防雷。

2、雨期施工的生产物资准备

雨期施工材料准备表

序号	材料名称	单位	数量	备注
1	水泵	台	8	抽、排水
2	抽水软管	米	500	
3	草袋	个	1000	防洪
4	塑料布	平方米	3000	覆盖挡雨
5	毡布	平方米		
6	铁锹	把	60	
7	水桶	个	30	排水
8	雨鞋	双		
9	雨衣	件		
10	雨伞	把	20	现场检查
11	扫帚	把		

3、主要预防措施

在雨期所有施工用电设备，不允许放在低洼的地方，防止被水浸泡。在仓库内保管的怕水材料，要保证离地离墙不少于 30cm 的距离，室内要通风干燥，以保证焊接材料在干燥的环境下保存。露天存放的主材下边应架空 30cm 避免被水浸泡。材料周围应有畅通的排水沟以防积水。

4、雨季施工技术措施



土方工程受雨水影响较大，如不采取有关防范措施，将可能对施工安全及建筑物质量产生严重影响。因此在雨期施工时注意以下几点：

(1) 基坑、沟槽必须组织施工时应集中人力、机具尽早完成，挖土时应考虑雨水及地下水对土的影响以免塌方。

(2) 雨期开挖基槽（坑）或管沟时，应注意边坡稳定。按规定放坡或用支撑加固，必要时可适当调整边坡角度。施工时应加强对边坡和支撑的检查控制；对于已开挖好的基槽（坑）或管沟要设路支撑；正在开挖的以放缓边坡为主辅以支撑；雨水影响较大时停止施工。

(3) 防止边坡被雨水冲塌，可在边坡上加钉钢丝网片，并喷上混凝土；也可用塑料布遮盖边坡。

(4) 雨期施工的工作面不宜过大，应逐段、逐片的分期完成，雨量大时，应停止大面积的土方施工；基础挖到标高后，及时验收并浇筑混凝土垫层；如被雨水浸泡后的基础，应做必要的挖方回填等恢复基础承载力的工作；重要的或特殊工程应在雨期前完成任务。

(5) 为防止基坑浸泡，开挖时要在基坑上作好排水沟、集水井并组织必要的排水力量。

(6) 对雨前回填的土方，应及时进行碾压并使其表面形成一定的坡度，以便雨水能自动排出。

(7) 注意排除地表水措施，为防止地表水进入基坑，可在基坑水流方向采用挖引水沟的方法，以避免地表水流入基坑内现象发生。

(8) 对于堆积在施工现场的土方，应在四周做好防止雨水冲刷的措施。如在周围放路条石以阻止土方被雨水冲刷至开挖好的基槽（坑）或管沟内，或者埋设已完工的一些基础构筑。

(9) 基坑回填土，不宜在雨天施工，应在晴天用最佳含水量的土分层碾压回填。

(10) 具备回填条件后，应抓紧进行基坑四周回填工作。

5、雨期安全环保技术措施

现场用电必须按照规定实施。在雨施前，应对现场所有动力及照明线路，供配电电气设施进行一次全面检查，对线路老化、安装不良、瓷瓶裂纹、绝缘降低以及漏跑电现象，必须及时修理和更换，严禁迁就使用。风雨过后，电工也应对用电线路进行全面检查，确保安全后方可继续施工。

组织人员对雨后路面进行检查，及时排除积水。阴雨天施工应注意场地内排水，应避免场内积水，同时及时用潜水泵采用集中排水方法排出场外至市政管线。

雨天施工时，人员应注意防滑，上下应走安全通道及马道。大雨后应对塔基、道路、外架子等进行全面检查，确认无沉陷和松动方可施工使用。



配电箱、电闸箱等，要采取防雨、防潮，防淹，防雷等措施，外壳要做接地保护。

施工现场做到清洁整齐，无积水，垃圾定点存放，采用封闭式垃圾站。

6、雨季施工管理措施



及时掌握天气预报和气象动态，经常与当地气象部门联系，以利安排施工，做好防洪渡汛工作。

成立防洪组织，认真贯彻执行发包人、地方有关部门关于防洪工作的有关规定，加强对防洪工作的领导，建立汛期防洪值班制度，明确雨季施工岗位职责：

渡汛施工要立足于“防”，在汛期来临之前，对防洪组织机构、措施落实、抢险方案等进行全面检查，把防洪所需的资金、设备、物资、人员重点做出安排并予以保证。检查中发现问题或隐患，必须立即采取措施进行整改。

做好历史水、灾情调查，施工过程中加强与地方气象部门的联系，及时获取准确的水情预报，确保防洪工作的主动权。

施工临时堆放的物料要防止影响泄水排洪。及时清理不用的施工机具，防止水淹及堵塞河道引发水害。

(2) 高温季节施工措施

在夏季高温季节，为保证工程质量，保证广大职工的安全与健康，防止各类事故的发生，确保夏季施工顺利进行，拟采取以下几点措施，重点做好安全生产和防暑降温工作。具体措施如下：

1、成立夏季工作领导小组，由项目经理任组长，生产副经理、行政副经理担任副组长，安全部长、工程部长、综合办公室主任、安全员、外协员为组员。对施工现场和外施职工生活区进行管理，责任到人，切实改善职工食堂、宿舍、办公室、厕所的环境卫生，定期喷洒杀虫剂，防止蚊、蝇孳生，杜绝常见病的流行。

2、关心职工，特别是生产第一线和高温岗位职工的安全和健康，对高温作业人员进行就业和入暑前的体格检查，凡检查不合格者不得在高温条件下作业。认真督促检查，做到责任到人，措施得力，确实保证职工健康。

3、做好用电管理，夏季是用电高峰期，定期对电气设备逐台进行全面检查、保养，禁止乱拉电线，加强用电知识教育。做好各种防雷装置接地电阻测试工作，预防触电和雷击事故的发生。

4、加强对易燃、易爆等危险品的贮存、运输和使用的管理，在露天堆放的危险品采取遮阳降温措施。严禁烈日曝晒，避免发生泄露，杜绝一切自燃、火灾、爆炸事故。



1、高温期间根据生产和职工健康的需要，合理安排生产班次和劳动作息时间，对在特殊环境下（如露天、封闭等环境）施工的人员，采取诸如遮阳、通风、调整工作时间等措施，早晚工作，中午休息，防止职工中暑、窒息、中毒和其他事故的发生，炎热时期派医务人员深入工地进行巡回防治观察。一旦发生中暑、窒息、中毒等事故，立即进行紧急抢救或送医院急诊抢救。同时教育职工不得擅自到无游泳许可的人工或自然水域中洗澡、游泳，以免发生意外事故。



（3）特殊时期施工措施

- 1、六级以上大风、浓雾天气，不得进行高空作业。
- 2、大风期间，架子、脚手板及外墙门窗洞口处严禁存放松散小型块状材料，防止坠落伤人。
- 3、大风过后，要对高空作业的安全设施进行检查，发现松动、变形等现象立即修理，检查合格后使用。
- 4、暑期高温时，避免在阳光下的长期高空作业，防止中暑。夜间施工时要有足够照明，并严格遵守成都市有关夜间施工规定。

（4）冬季施工安排措施

- 1）冬季风大干燥，做好防火工作。在冬季来临之前进行一次防火安全大检查，发现有隐患及时采取整改措施防范于未然。
- 2）平均气温低于 10℃时，不安排沥青混合料施工；当气温下降到 15℃以下时，不安排较长运距的工作面施工，以保证混合料的碾压温度。
- 3）保证每辆沥青混合料料车覆盖厚实保温篷布，并根据运距及沥青摊铺机的摊铺能力安排运输车辆，避免过量的运料车在摊铺机前停留（确保正常摊铺过程中 3~5 辆等候卸料），保证沥青摊铺温度达到规范要求。

（5）夜间施工安排

如整体施工进度导致个别分项工程应安排夜间施工时，将采取下列措施：

- 1）根据现场情况，夜间施工尽量安排噪音小的工作，避免影响邻近居民休息。当因工程需要连续施工时，提前征得居民的谅解。
- 2）夜间施工时，保证有足够的照明设施，能满足夜间施工需要，并准备备用电源。
- 3）施工现场设置明显的交通标志、安全标牌、警戒灯等标志，标志牌具备夜间荧光功能，保证施工机械和施工人员的施工安全。
- 4）在人员安排上，夜间施工人员白天必须保证睡眠，不得连续作业。



(4) 项目经理部各部门建立夜间施工领导值班和交接班制度，加强夜间施工管理与调度。在项目经理部设置夜间值班室；在施工现场安排现场值班室。

二、应急措施

前期进场时，为保证正常开工，满足施工便道的开展及设备的进场，由拆迁协调小组配合业主有关部门，协调对红线范围内沿岸建筑物及设施的拆迁工作，与当地政府街道办事处配合做好群众工作，动员拆移，满足施工前提需求。

2、施工预防措施

(1) 突发停电

如甲方事先能提供两路电，则停电时自行切换，如不具备两路供电条件，在浇筑砼时，配备 1 台 200KVA 及 5 台 15KW 发电机，用做为现场照明及砼振捣器之用。

(2) 防火措施

现场临时工棚严禁使用明炉，减少隐患，避免火灾发生，同时工地配备同台灭火器，以备救火之用。

(3) 防雨水措施

1) 修好施工便道，硬化施工场地，保证晴雨畅通，为保证施工便道畅通，要经常对施工便道进行养护，清除排水沟的杂物，保证排水畅通。

2) 根据施工场地情况、机械设置防雨棚。施工电路、电器不受雨淋，不受潮，能安全使用。

3) 修建临时排水设施，保证雨季作业的场地不被洪水淹没并能及时排除地面水。

4) 注意钢筋的锈蚀和模板或支架的变形、下沉，做好水泥等材料的保管工作。雨季应避免工程材料与生活物资淋湿，并做好设备保养工作。

5) 砼工程应避免在雨天浇筑，施工前应注意收听天气预报，避免施工中遇上大雨，必须进行雨季施工以及砼连续浇筑时，施工场地、拌和场、运输车都必须有遮雨棚，保证正浇注的砼不受雨淋。

6) 雨季施工应加强抽水设备，对排水系统出现堵塞时，及时进行抽排和抢修，以防雨水流入施工现场。

7) 在雨季施工时，应配足雨天施工的劳保材料，如雨衣、雨鞋、蓬布等。

5、广泛开展劳动竞赛活动。对提前完成工作任务的集体或个人给予奖励，对未能按期完成工作任务的给予处罚，做到“奖勤罚懒”，激发广大员工的生产热情，提高劳动生产率，促进工程的施工进度。



6、采取合理施工程序，缩短工期。工程的关键工序关系到总工期的实现。因此，应将此关键工序放在重点保证其工期的实现：

7、组织机构的落实，建立以项目经理为首的管理层，推行项目法施工。在施工进度控制上，项目经理部着重将责任落实到人，同时做好与各有关单位及施工各方的协调配合工作，保证各工期控制点目标的实现。

8、实行奖罚措施，按经济规律办事，公司与项目经理部签订协议，根据工程合同条款实行奖罚；项目经理部为调动项目内全体员工的积极性，对各工期控制点制定奖罚措施，将工程的施工进度的奖罚与工程质量、安全、文明施工及各方协调配合的施工情况挂钩，以带动整个工程健康发展，按期完成。

9、选择性能优良的施工机具，先进的机具，合理布置，同时加强其管理，保证各设备运转良好。结构施工中，采用轻便、灵巧的、使用功能多样的多功能门式架作模板支顶；垂直模板使用拼装轻巧、装拆方便、工效显著、减轻工人劳动强度的钢木组合模板，加快结构施工进度。

10、做好各种资源的供应，按照施工组织设计要求，根据工程控制计划要求，进行工料分析，相应编制劳动力进场计划，材料进场计划，机械设备使用计划，资金使用，以保证各种资源能满足工程计划周期内的需要。

11、物资材料计划应明确材料的数量、规格和进场时间，现场材料储备应有一定的库存量，以保证工程提前或节假日运输困难时，工程对物质材料的需要，确保现场施工正常进行。

12、劳动力进场要保证质量。除保证数量外，施工人员的技术素质是一个重要的因素。工人进场前必须进行严格的培训和考核。

13、按计划进场的机具，进场前必须进行维护、保养和试运转工作，保证所有机具进场后能够投入正常的使用。

14、做好劳动力与机械设备、材料的优化组合及其优化组织设计、调度方案。

15、保持均衡施工。抓好关键项目的施工管理，对关键线路的工程项目给予优先考虑，以确保其按期完成。

16、加强施工人员的质量与安全防护意识，确保各工序施工质量一次验评合格，避免返工；切实做到安全施工，坚持预防为主，杜绝安全事故。



第四章、工程质量保证措施

第一节 质量总目标

1、在工程施工中，投入充足的人、财、物，强化工期意识，确保工期目标的实现。

2、本公司已针对本工程，建立健全的生产管理制度，一切施工生产活动必须坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，自始至终将安全生产意识落实到每个施工环节，保证安全生产投入，达到安全标化工地管理目标。

3、本公司以切实的文明施工管理制度为基础，强化文明施工意识，严格遵照公司施工现场管理规定，服从业主的文明施工管理，确保达到“安全、文明双标化工地”。

我公司已经通过 ISO9000 质量认证体系，我部对本合同段提出的质量总目标是：我们保证工程各项指标符合《公路工程质量检验评定标准》及其它相关质量检验评定标准的要求，并符合国家和本省有关法律法规的要求，并确保单位工程一次检验合格率 100%

为保证施工质量，在施工现场实行以总工程师为核心的质量管理网络。以优质工程为目标，实行工程质量目标管理，明确各部门的工作岗位职责，落实质量责任制。由质检员具体负责，各分项工程配备具有相当资历的专职质检员，实行全过程监督，并强化质量监控和检测手段。多年来我公司在施工实践中积累的充足的经验和建立的完善的施工管理制度，形成了一个完整的质量保证体系，确保了施工项目的工程质量。

在本工程施工中，我们力争优良。在施工中实行质量目标管理制度，把质量目标分解到各分项工程和各施工班组中去，实行签约包干，真正做到“人人创优良，安全文明双标化”。同时做好自身的监督制度。形成一个有效的质量保证体系，贯彻质量保证体系，根据有关质量管理的文件，从质量策划，合同评审，材料供应和采购把关，施工过程控制，检验和试验设备的控制，文件和资料管理，质量记录控制到各种培训等要素着手，在整个施工过程中形成一个符合国家系列标准的质量保证体系。

建立健全的质量管理体系。

(1) 各级施工质量管理人員做到认真学习合同文件，技术规范和监理规程，按设计图纸，质量标准及监理工程师指令进行施工，落实各项管理制度，严格按程序施工。各施工班组以自检为主，落实自检、互检、交接检的三检制。开展三工序（查上工序、保证本工序、服务下工序）活动，强化质量意识，教育全体施工人员，人人关心质量，人人搞好质量，分项工程质量不优良不交验。

(2) 坚持谁施工谁负责的原则，制订各部门、岗位质量责任制，使责任到人。企业一把手是工程质量的第一责任者，生产、技术、管理人员，从各自的范围和要求承担质量责任，并



把质量作为评比业绩时一项重要考核指标。

(3) 加强对各级施工管理人员和质检人员的培训学习工作，并认真学习贯彻招待文件、技术规范、质量标准和监理规程，除平时自学外，项目部要针对施工实际，定期进行分层次的集中培训学习，进一步提高业务素质，使之在施工过程中更好地落实标准，履行职责，提高管理水平，把好质量关，以一流质量创一流牌子。

(4) 开展质量教育及技术培训。本投标人接到中标通知书后，立即组织投入本合同的人员认真学习《技术规范》，并认真做好质量教育工作，提高质量意识，使全体人员树立质量第一、用户至上、预防为主观点。

(5) 技术制度

A、建立以总工程师为主的技术系统质量保证体系。以总工程师、施工技术员、施工管理部直到施工班组的各级技术负责人，从施工方案、施工工艺技术措施上确保达到质量标准，从技术上对质量负责。并积极采用和推广先进的施工工艺和科技成果，提高产品质量和产品优良率。

B、分部、分项工程开工前由施工技术员负责，进行分层次的书面技术交底、交施工方案、交施工工艺设计意图、交质量标准、交安全措施、形成施工程序化、技术标准化、质量规范化，使每个施工人员做到目标明确，心中有数。

第二节 质量保证组织机构

我们将按照质量认证体系有关要求建立本项目的质量保证体系，成立以项目经理为组长，技术负责人为副组长，各部门负责人为成员的全面质量领导小组，具体组织机构如下：

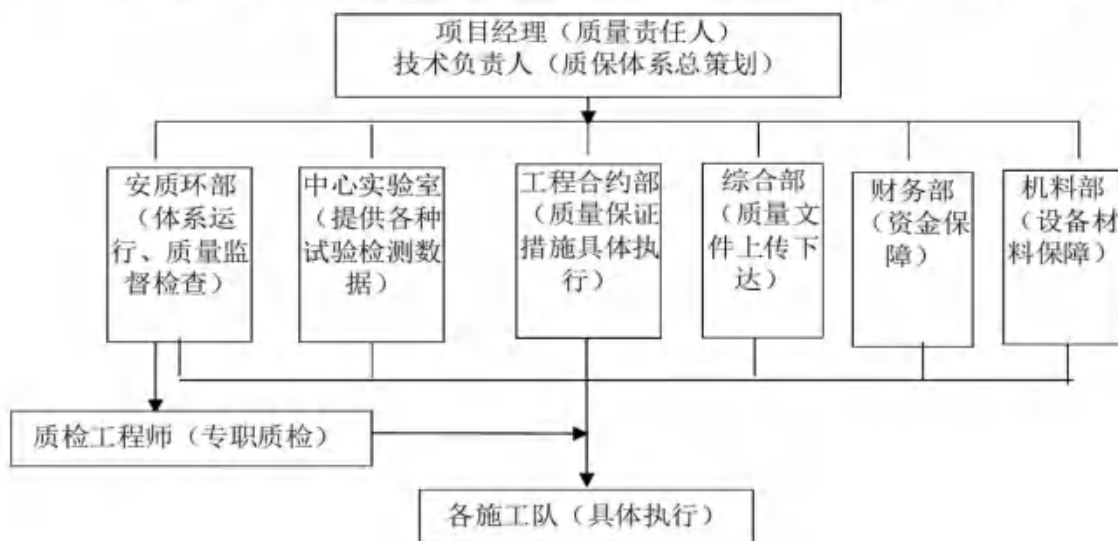


图 4—1 质量保证组织机构

建立健全以项目经理为第一责任人的工程质量管理领导小组。项目部工程各负责人、技术



人员、质量检查人员、安全监督人员、生产保障人员、财务人员、工地试验室、测量组等、要明确分工，各司其职，保证质量自控体系有效运行。

管理人员职责分工

一、项目经理

1、认真贯彻企业的质量方针和目标，确保本项目部全体人员理解和贯彻执行。

2、根据质量计划，结合工程实际，建立健全组织机构，配齐所需资源，落实质量责任制，保证质量体系的有效运行。

3、履行工程质量管理职责，杜绝重大、大质量事故的发生。

4、履行对工程质量的策划，组织质量审核，落实纠正措施。

5、深入工地调查研究，及时推广保证工程质量的先进方法。

二、项目总工

1、认真执行标准化管理措施，及时向项目部管理人员进行作业标准化技术交底。

2、认真贯彻企业的质量计划和目标，组织制定本工程质量保证措施。

3、主持编制项目工程实施性施工组织设计，明确其技术和质量保证措施。

4、主持制定和实施项目质量计划，实施工程的质量检验制度，加强施工过程的控制，严把“图纸、测量、试验”三关，杜绝因技术原因造成的重大质量事故。

5、主持组织推广应用统计技术，加强文件和资料管理并建立工程质量记录。

6、组织推广应用新技术、新工艺、新设备和新材料，主持对关键工序的施工人员的培训，编写施工技术总结。

三、生产经理

1、指挥现场施工按施工组织设计和质量要求进行实施。

2、负责工程质量和安全的过程控制，组织有关人员向工区和施工队进行技术交底，主持质量事故和不合格工程的分析处理，坚持“三不放过”原则。

3、负责协调各工区、施工队交叉施工中工序的衔接与工作配合，定期或不定期组织工程项目检查，及时统计与总结，提出建议和决策意见，对不合格和不经济的施工方案，行使否决权。

4、根据工程特点，建立施工现场的质量保证体系，并使之正常运转，确保工程质量。

5、在组织与指挥施工的过程中，以身作则，坚持“质量第一”的方针，结合实际，教育职工增强质量意识，在确保工程质量的前提下，完成施工任务。

6、严格按照施工及验收规范，技术标准，设计文件及施工程序组织施工。在检查工程完成情况的同时，检查工程质量指标完成情况，分析质量动态，采取措施，保证和提高工程质量。



四、质检员

1、负责制定工程质量计划，编写工程质量保证措施，并对计划和措施的实行进行监督。

2、定期对工人进行技术培训和质量教育，提高其技术水平和质量意识。

3、严格按照质量验收评定标准和有关技术要求对分部分项工程进行质量检查、评定和验收。

4、实行现场施工过程的质量监督，施工过程中发现问题及时处理，对施工现场的有不按设计要求、施工验收规范、操作规程及施工方案的行为，质安员有权停止现场施工，并勒令其限期整改。

五、材料员

1、深入现场，根据施工生产需要，做好料具供应工作。

2、熟悉各种材料规格及验收标准，进场材料除应有出厂说明书和合格证外，应对原材料进行试验，否则禁止使用。

3、实行计划用料，加强材料现场管理和使用，建立保管制度，严格领发料制度，做到定期盘点，账物相符。

六、试验员

1、认真执行现行有关检验和试验的标准、规范和规程。

2、具体负责生产中原材料、工序的检验工作，熟练操作各类仪器设备，按有关要求进各类检验和试验。

3、指导、检查和督促检验和试验人员开展工作，积极处理检验和试验工作中的技术问题。

4、按时收集、整理检验和试验报告，并及时上报。

七、施工员

1、对各分项工程的质量要求，并严格按作业标准化手册进行施工作业。

2、监督、指导各施工队严格按项目部布置的任务、质量、安全技术交底组织施工，遵守各项规范标准，并经常向项目部领导层反映质量进度等情况。

3、组织班组严格按图、按规范、按规程及技术交底进行施工。

4、组织班组开展三检制活动，对存在的质量问题及时处理，对交付的不合格工序返修费用负经济责任。

5、控制本工程的主要材料使用，无出厂证明、合格证、复试单不得使用，对不合格的材料造成质量低劣及事故负责任。

6、认真及时填写施工日记和整理好三检制的原始质量资料，支持、配合质量检查人员的工作，对存在的质量问题负主要责任。



7、熟悉图纸、施工质量标准、材料要求及性能，处理设计变更洽商记录，保证按图纸要求及施工规程施工。

八、测量员



- 1、负责工程的测量放线工作，严格执行设计及有关技术规范。
- 2、对测量仪器量具严格执行检验制度并妥善保管。
- 3、对工程有关的点、线桩位进行保护，测量记录要完善并加以保管。

九、班组长

- 1、认真贯彻公司的质量方针和目标，按照工程项目质量计划，落实质量责任制，组织制定工程质量管理实施细则。
- 2、组织工人按技术标准、规范组织施工，加强工艺、工序质量管理，不断提高施工质量。
- 3、工程质量检查以班组、现场自检和专业检查相结合坚持“三检”即自检、互检、交接检查。
- 4、下班前对当天工程质量进行自检，不符合质量要求的马上返工，上下道工序在交接上进行互检，不符合质量要求，不允许进行下一工序施工。

第三节 质量体系运转流程

各分项工程开工以前，工程技术人员必须仔细阅图，完全掌握工程的质量要求，并召开施工准备会议，对施工班组进行技术交底。各工程施工队(班组)在每一道工序过程及完成后，由自检员按设计图和技术规范要求严格进行自检，对自检合格工程填写质检申请表，经自检组核实后报质检部审查，质检部确认自检组的检查有效并签字报送现场(驻地)监理人申请检验，请监理人检查验收，唯有监理人的检验合格后，方可进行下一工序的施工。具体质量体系运转流程如下图：

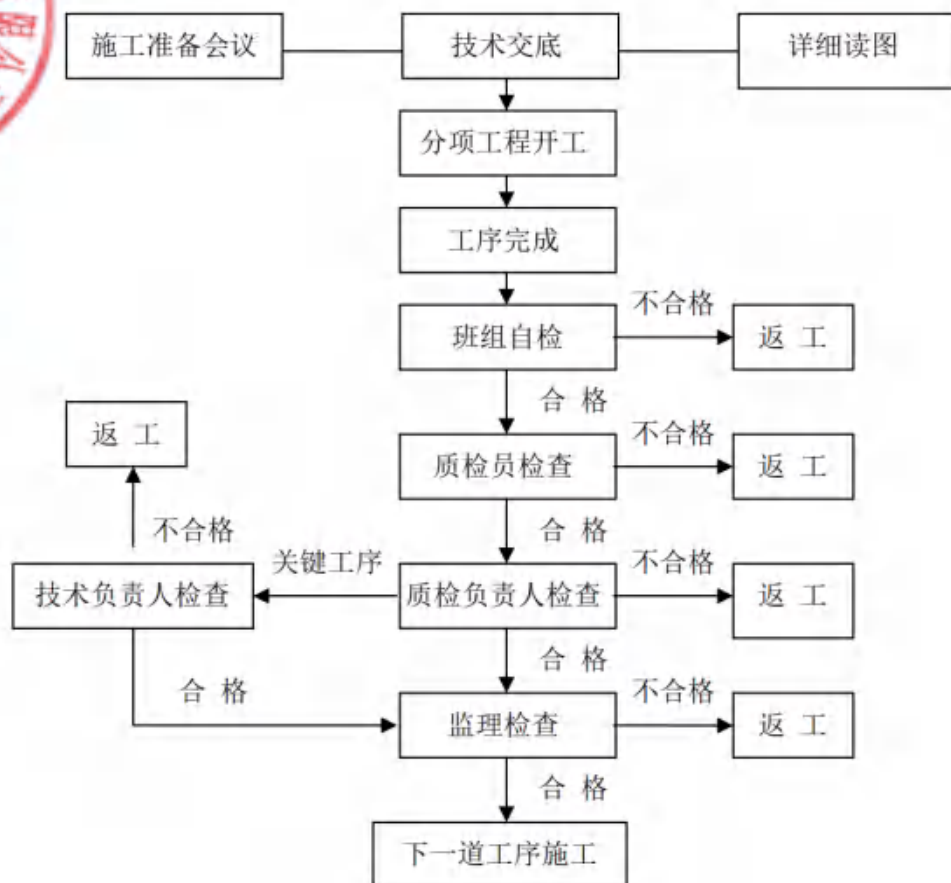


图 4-2 质量体系运转流程

一、组织保证措施

项目部成立以项目经理为组长的质量管理机构，副组长由项目总工、项目副经理担任，各管理人员为组员。从组织保证、思想保证、制度保证、施工质量保证、质量检查保证、经济保证、质量信息诸方面建立完善的质量保证体系。

二、思想保证措施

1、工程质量是施工活动的最终成果，它取决于工序质量而工序质量，是工程质量的保证和基础。工程质量是一个系统工程，领导是关键，制度是手段，技术是保证。施工队伍进场后，将分项目、分工序实施质量教育，有的放矢，做到人人明白质量要求，个个清楚质量标准。

2、实施领导把关，做到文明施工将“百年大计，质量第一”的思想贯彻到参战的每一个施工人员的行动中。

三、技术保证措施

1、开工前做好施工调查，认真复核设计文件、施工图纸；按要求精度完成复测和测量桩橛测设；编制本标段施工组织设计及重、难点工程的实施性施工组织设计，报建设单位、监理工程师审核批复后实施。对采用的新技术、新工艺、新设备认真研究吸收消化，并对有关人员



2、根据工程特点和质量目标要求，项目经理部配备责任心强、工作经验丰富、技术熟练的工程技术和管理人员，并在施工期间保持相对稳定，选择质量意识强、专业化程度较高、作风过硬的专业施工队伍负责本工程的施工。机械设备按先进实用的原则配备。原材料严把采购、

进场、使用、检验关，确保原材料检验质量，确保工程质量。

3、坚持设计文件、图纸分级会审制度和技术交底制度：由公司总工办牵头，专业工程师复核每份图纸，填写审核意见。由技术人员向施工队进行：施工方案交底、设计意图交底，质量标准交底、创优措施交底，重难点工程下发《作业指导书》。

4、加强工地试验、计量工作，严格技术标准，消灭无计量的施工行为。加强关键工序、关键部位、关键阶段的测量检查复核，坚决杜绝因测量原因造成的工程质量事故。

5、积极推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料依靠科学技术提高工程质量。推行样板引路，开展群众性的创优活动。强化全员质量意识教育，提高广大职工创优的积极性、自觉性，使群众性的创优活动有序展开。

6、大力开展克服质量通病活动，把克服质量通病作为质量管理和创优的基础性工作，根据本工程特点编制下发《常见工程质量通病及预防措施》，结合工程实际对照实施，把克服质量通病抓紧抓好落到实处。

7、关键工程、关键工序、关键岗位一律由经培训合格的技术工人施工，在施工高峰期时用少量民工作为普工，以弥补部分劳力不足，加快施工进度。使用外部劳务坚持岗前培训和持证上岗制度，强化外部劳工的技术培训和质量意识教育，提高外部劳工的作业水平和操作技能，提高全员的整体创优水平。

第四节 制度保证措施

一、质量责任制度

为确保施工质量，自上而下逐级建立工程质量责任制，签订质量责任书明确工作岗位的质量职责和义务，建立完善的质量责任制度，以确保施工质量得到有效控制。

2、质量目标管理制度

根据工程的总体质量目标进行量化分解，落实到每个分部分项工程、每一个施工环节和施工工序等，并逐级落实到相关科室、施工队、施工班组、作业人员，一级包一级，一级保一级，逐级签订包保责任状，使得质量管理工作标准化、程序化，确保总体质量目标的实现。

3、质量一票否决权制度

项目施工全过程实行质量一票否决制，派有资质和公路施工经验的技术人员担任质检员，



负责内部质检工作，并赋予质量员一票否决权力。凡进入工地的所有材料、半成品、成品，质检员同意后才能用于工程。对工程验工必须经过质员师的签认，一切需经监理签认的项目，必须经质检员检验合格后方上报。质检员以施工规范、工程质量检测评定标准为依据，行使一票

否决权。

林刘
印晓

4、质量预控制度

从准备工作，技术交底，预防措施，过程监控，工序验收，质量评定，材料整理等方面实施质量预检制度，把可能发生的质量事故消灭在施工前。

5、施工过程的质量检测制度

施工过程的质量检测按三级进行，即“跟踪检测”、“复测”、“抽检”三级。通过对施工过程的质量检测达到及时解决问题的目的，以便为验收时的质量检验打下良好基础。

6、原材料、成品和半成品进场验收制度

对采购进场的原材料、成品及半成品有出厂合格证并由质检员组织质量、技术、生产保障部门及施工队的有关人员进行验收，由试验人员进行现场取样试验，对经试验达不到标准的材料，坚决清退出场；对防水材料等委托有试验资质的单位进行试验，检验合格后并请监理工程师复检合格后方可使用。各种原材料、半成品均有出厂合格证、产品质量证明书和试验报告。进场后分类别堆码存放，并挂牌标识检验和试验状态，以防止误用和实现可追溯性。

7、仪器设备的标定制度

各种仪器、仪表均按照计量法的规定进行标定。项目部设专人负责计量工作，设立帐卡档案， 进行监督和检查。仪器设备由试验室和相关专业指定专人管理。

8、技术交底制度

各分项工程开工前，在认真熟悉设计图纸和规范标准的基础上，由主管工程师向全体施工人员进行技术交底，讲清该项工程的设计要求、技术标准、功能作用及与其他分项工程的关系、施工方法、工艺和注意事项等，要求全体人员明确标准，做到人人心中有数。

9、测量复核制度

测量资料必须经换手复核无误，再报监理工程师审查认可，方可用于施工，并对中线桩、水准点建立定期复测检查制度，测量与施工建立联系制度，对监控测量的数据及时反馈到施工方案中，并根据反馈信息及时调整施工方法，确保施工质量。

10、“三自管理”制度

加强技术管理的基础工作，施工中认真执行“三自管理”制度。

“三自管理”即在施工过程中需加强自纠、自检、自控管理制度及时发现问题，及时解决。



11、坚持“五不施工”、“三不交接”、“一不计价”制度

五不施工：未进行技术交底不施工；图纸和技术要求不清楚不施工；测量桩和资料未经换手复核不施工；材料无合格证或试验不合格者不施工；工程不经检查签证不施工。

三不交接：无自检记录不交接；未经专业人员验收合格不交接；施工记录不全不交接。

一不计价：未按施工要求和施工规范施工的不计价。



12、“三检”制度

施工中坚持“自检、互检、交接检”制度，上道工序不合格，不准进入下道工序，坚持上道工序为下道工序提供质量保证。对工序施工现场实行标示牌管理，标明责任人、作业内容、质量要求等，作业前进行核定，作业过程中进行严格监控。

13、隐蔽工程检查制度

凡属隐蔽工程项目，首先由施工队、施工员、质检员逐级进行自检，自检合格后，会同监理工程师一起复检，检查结果填入验收表格，由双方签字，最终签发隐蔽工程检查证。

14、变更设计管理

根据现场实际地形、地质变化情况，发现与设计不符的，应及时提出变更申请建议，邀请设计、监理、建设单位进行现场洽商并按规定办理有关手续。

15、施工资料记录整理和追溯制度

由资料室记录整理施工大事记和晴雨表，对甲方、监理关于工程质量的指示，包括电话、传真和书面指示分类列入工程档案，对图片、录像按日期和地点分类入档，分管工程施工的技术人员每天记录工程日志，真实记录施工过程，杜绝写回忆录，施工班组按规定坚持填写自检记录。

施工原始资料的积累和保存由分管人员负责，及时收集、整理施工原始资料，分类归档，确保数据记录真实可靠。质检员将全部质量保证文件和记录汇编成册，保存好原始资料，以备监理工程师检查时出具和竣工时随竣工文件移交。

16、质量事故报告制度

施工过程中出现质量事故，应逐级报告到项目经理，项目经理按规定以书面形式向有关单位报告，并全力做好事故的分析处理工作。

17、质量责任追究制度

强化施工现场管理，建立质量责任追究责任制，明确分工，责任到人，奖罚分明，做到突出重点，分批落实，规范施工，注重实效。质量责任人全部签订责任状。

18、坚持质量汇报会制度



质量组必须每月开一次质量汇报会，会议由项目总经理主持，质检主管讲评质量工作进行情况，总结好的做法和经验，提出改进方法指导后续工作。

四、三级质量管理体系

1、一级：项目部：督促检查和指导各工区质量活动的开展；负责本项目质量策划及创优规划的编制，监督指导各质量体系的建立、完善与运转；指导抽查“三检”制度的落实，考核质量管理人员职责落实情况；指导开展“QC 小组”活动；定期组织质量检查，对已完工程及时进行质量评定；组织优质样板工程的评选，定期分析总结通报本工区的工程质量情况，提出改进措施，协调下属和监理工程师之间的关系。

2、二级：质检组：发动施工人员，积极参加各种质量活动；落实质量策划和保证措施，落实“三检”制度，备好各种资料，严格控制工程材料、成品、半成品的进货质量，及时按规定频率提请试验人员进行抽样检验，严格施工控制，坚持作业标准和工艺要求，认真实施质量通病及技术薄弱点的质量预防措施。主动与现场监理配合，处理好各种质量问题。

3、三级：施工队：严格按验收标准、施工规范、技术指南和技术交底书组织施工。发现技术指导有误时，要及时与技术人员沟通，并进行纠正。做好工前技术、质量标准交底，严格工中质量自检、互检，进行工后讲评。定期分析所在施工工点存在质量薄弱点，有针对性地预防和改正；及时按监理要求纠正和处理施工中出现的的质量问题。上道工序不合格，不准进行下道各项施工，使工序操作始终处于受控状态。施工中，要加强监督检查，发现偷工减料，采用不合格材料、违章操作等现象，必须及时予以制止和纠正。对因操作方法不当或人为原因造成的工程质量问题承担直接责任。组织工（组）人员学习验标、规范和施工工艺，不断提高自身素质，增强质量意识。

第五节、施工控制措施

(1) 本项目配备足额的质检工程师和专项工程质检员，专司质量检查之职。

(2) 严格按质量检查程序进行质检，各工程施工队(班组)在每一道工序过程及完成后，由质检员按设计图和技术规范要求严格进行自检，对自检合格工程填写质检申请表，经质检组核实后报质检部审查，质检部确认自检组的检查有效并签字报送现场(驻地)监理人申请检验，请监理人检查验收，唯有监理人的检验合格后，方可进行下一工序的施工。

(3) 严格按监理人批准的施工组织设计和技术规范进行施工，施工全过程的每个环节遵循质量检查程序，并按规定予以记录和归档。

(4) 材料采购前，先对供货厂商资质进行评定，并报监理人和发包人批准，对不合格厂商提供的材料不予采购。



(5) 质检员、试验人员必须跟班作业，工程关键部位以及经监理人批准，实行“三班制”施工的项目必须有质检工程师守候现场。

2、技术保证措施

(1) 组成以总工程师为首，选派有多年施工设计经验的技术人员组成设计室，结合现场实际情况，精心绘制出详细的施工图纸，报发包人和监理人批准，杜绝因设计差错而引起工程返工和质量事故的发生。

(2) 项目经理部安排有协调组织能力和专业技术水平的技术干部任质检部负责人，并安排具有一定工作能力和工作实践经验，敢于坚持原则，廉洁奉公，有较强的事业心、工作责任感，热爱质量管理工作的人担当质检工程师、质检员和试验工程师。

(3) 采取各种途径，提高施工人员业务素质，利用雨天和施工间隙，请监理人或工程师代表讲授技术规范和施工操作方法，组织技术比赛，并适当派员外出学习，及时掌握高等级公路建设中新的施工工艺和技术。

3、设备保证措施

(1) 选用具有国际先进水平的一流设备投入本项目施工，保证机械设备有良好的出勤率和安全保障，配备一定的修理工跟班作业，确保工程设备处于最佳运行状态。

(2) 加强机械设备的现场管理，确保机械设备的完好率和使用性能，保证工程内在质量，杜绝由机械设备而引起的工程质量事故。

4、经济保证措施

(1) 将质量检测评定与工资奖金挂钩，根据规范要求制定详细的内部工程质量检测制度和工程质量检查评分办法，质量领导小组每月至少进行一次全面质量检查和评分，此结果将是核实职工及各工程队工资的首要依据。

(2) 发生质量问题或质量事故扣发质量直接责任人当月奖金，根据经济损失程度对质量领导小组 相关人员及质检程序中内部各级人员给予不同程度的罚款。



第五章、安全生产保证措施

第一节 安全生产目标

我公司已经通过 GB/T28001 职业健康安全管理认证体系，我们将按照职业健康安全管理认证体系的要求，遵守国家和本省有关安全生产法律法规的规定，以交通部《公路工程施工安全技术规程》和《公路工程质量检验评定标准》及其他相关安全生产条例中有关安全生产的规定来严格施工。

第二节 施工安全保证组织机构

成立以项目经理为组长、总工为副组长、工程施工队队长为安全员的安全小组，并配备一人专门管理安全生产，同样，在每个施工队中也设立一个专职安全员。经常性地组织全体施工人员学习施工安全制度和安全操作规程。对每个施工环节制订施工安全措施。

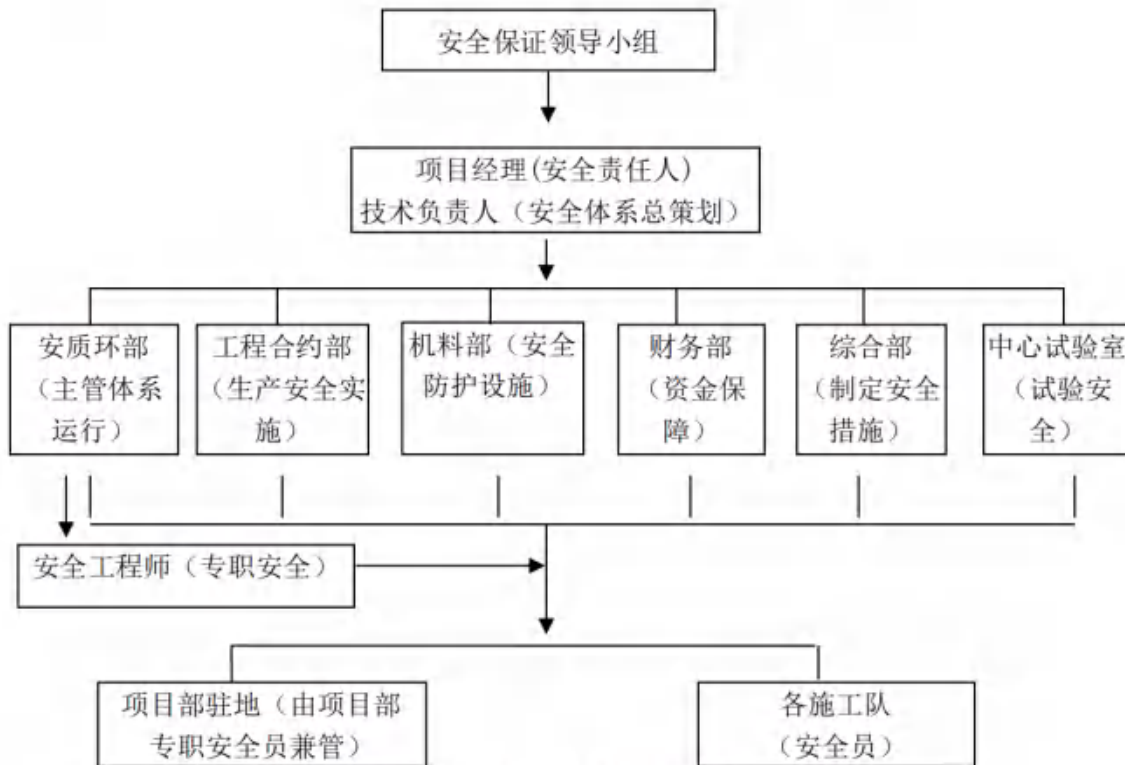


图 5-1 安全保证组织机构

安全生产管理体系人员和各部门职责：

项目经理：

- (1) . 认真贯彻执行国家有关法律、法规和规范，对本工程安全生产工作负全面责任。
- (2) . 定期主持召开安全生产会议，研究解决安全生产中的重大问题，注意改善劳动条件，关心职工的安全和健康，保证安全生产管理体系正常运行。
- (3) . 检查并考核项目部各部门安全生产责任制落实情况。



项目副经理（安全副经理）：

(1) .在项目经理领导下，负责本工程的安全生产工作，确保安全生产管理体系正常运行。



(2) .协助项目经理组织贯彻国家劳动保护方针、政策、法令和上级有关安全生产方面

(3) .贯彻安全生产“五同时”的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，同样要计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

(4) .领导编制和组织实施安全技术措施计划，监督劳动保护费用的使用，不断改善职工的劳动条件。

(5) .对各级干部、工程技术人员、工人经常进行安全生产教育。

(6) .组织安全大检查，定期召开安全专会。

(7) .组织均衡生产，注意工人的劳逸结合，对因加班加点致使工人过度疲劳造成事故负领导责任；对经理责成解决的安全工作或已决定急需解决的安全隐患，未及时采取措施解决而酿成的事故负直接责任；对虽采取措施，但由于下属人员执行不力造成的事故负领导责任。

项目总工程师：

(1) .在项目经理领导下，对本工程安全技术工作负责。

(2) .审批各工种安全技术操作规程，主管安全技术教育工作。

(3) .在审批技术文件和处理技术问题，认真贯彻落实国家的安全标准。

(4) .在审批采用新技术、新工艺、新材料、新设备和革新项目时，符合安全技术规定。

(5) .对已提出的技术方面的安全隐患，未能及时采取措施解决而酿成的事故负直接责任，对虽采取措施，但由于下属人员执行不力造成的事故负领导责任。

技术质量部：

(1) .在项目经理的领导下，协助主管领导贯彻落实安全技术工作。

(2) .在进行技术方案设计及工艺方案选择时，优先考虑安全设施的设计（如：脚手架、护栏、支撑、模板等），减少对施工人员的危害，以保证施工人员的安全和防止职业病的发生。

(3) .在使用新工艺、新材料时，必须组织施工人员进行作业前的交底和技术指导，以保证作业人员在施工中的人身安全和产品质量。

(4) .在项目经理的领导下，协助主管领导检查产品安全工作。

(5) .严格检验产品质量，保证产品安全。

(6) .发现安全隐患及时报告。



工程物资部：

(1). 在项目经理的领导下，协助主管领导贯彻落实安全生产工作。

(2). 按照“五同时”的要求，在组织安排生产计划时，必须同时对安全工作进行计划、布置、检查、总结、评比工作。



(3). 根据管生产必须管安全的原则，结合设备、场地、人员、负荷等因素在安排组织生产时，合理调配劳动力，尽量避免施工人员因疲劳作业而发生事故。

(4). 在在项目经理的领导下，协助主管领导贯彻落实安全、消防管理工作。

(5). 按现场施工人员的 1%~2% 配备专职安全员，在现场设置醒目的安全警示牌。经常性深入现场检查，及时发现各种事故苗头，并及时组织消除各种事故隐患，监督施工人员正确穿戴防护用品，制止各种违章操作行为，并按公司有关定置管理规定指导施工人员搞好现场定置管理，切实做到文明施工、清洁作业，达到工完料清场地净。

(6). 定期组织特种作业人员的学习，培训和考核，做到持证上岗。

(7). 保卫消防人员对各施工现场进行经常性的检查，根据各场地施工环境，合理布置防火器材，严格执行公司有关“危险作业场所的动火申报审批制度”的规定，做到“预防为主，防消结合”，以保障生产的顺利进行。

综合办公室：

(1). 在项目经理的领导下，协助主管领导做好本项目的环境保护和职工生活工作。

(2). 依据国家卫生和劳动条件分组管理标准 GB5817-85 的要求，加强现场作业、劳动过程和作业环境职业危害监测分析工作。确保人员身体健康，并做好防护用品穿戴和职业安全卫生的各项规定要求。

(3). 根据季节性劳动保护工作管理程序，做好防暑降温、防寒保暖工作，防止意外事故发生，确保施工人员有健康的体魄，满足工程建设高节奏、高效率的需要。

(4). 从事高空作业人员，按高空作业管理程序要求，上岗前必须体格检查，凡患有禁忌症者（高血压、心脏病、贫血等）不安排从事该作业，以确保施工的人员安全。

(5). 在工地和现场施工时，遵守国家和施工现场所在地方政府有关环境保护的规定。施工废水、生活污水不得污染水源、道路等，工程垃圾固体废物及时运至指定地方，采取妥善的处置方式处理，环缝焊接时，采用防护网、挡板等防止装焊作业的火花伤人，焊接作业的设备、设施按定置管理要求摆放整齐，固定合理，防止坠落。

为了确保施工期间符合国家对安全生产及职业健康的有关要求，符合我公司的《职业健康安全与环境管理手册》和《职业健康安全与环境作业文件》，我方从公司领导到项目班子人



员极为重视，由公司危险源辨识与风险评价小组采用“作业条件危险评价法（LEC）”，结合该工程实际情况对施工（生产、运输）过程和施工作业场所存在的危险源进行辨识与评价。考虑的范围包括：正常的作业活动和非正常的作业活动；所有进入作业现场人员的活动；作业场所内的设施、设备。从危险的根源和状态归结为：坠落；物体打击、起重伤害；坍塌；触电；火灾；车辆伤害；灼伤；机械伤害及其它等 20 种事故类别，最终评价为 I、II、III、IV、V 级危险等级，从而对其采取相应的职业健康安全措施。

项目经理部所有员工严格遵守总经理的职业健康安全承诺，严格遵守执行有关法律、法规、条例、标准及本岗位的岗位职责和操作规程，不违章作业，对本岗位的职业健康安全工作负直接责任。自觉接受职业健康安全培训，增强自身职业健康安全意识及防护能力。

本施组未做说明之处按照现行有关规定执行。

第三节、施工安全组织措施

（1）、建立健全施工安全措施，在抓生产、抓工程质量的同时，坚持抓施工安全。层层签订安全生产责任制，并落实到每一职能部门和在职人员。

（2）、严格执行国家和地方有关施工安全的各项法规、规范、规定、规程等，施工中把“安全第一，预防为主”的方针放在首位。

（3）、对分包施工队伍严格按程序进行安全资质审查，宣传现场安全秩序，签定安全生产协议，对参加施工的人员进行经常性的安全教育，使之熟知本工种的安全技术操作规程。施工中做好安全技术交底，并在施工进行中检查安全技术的落实情况。

（4）、正确分析、判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态。发生事故果断正确处理，及时向上级报告，并保护现场。

（5）、凡进入施工现场人员均按国家建筑安装工程安全技术规程的规定正确配戴和使用安全合格的防护用品。高空、深槽作业时，系安全带，设置防护栏和安全网。安全帽、安全带、安全网等防护用品，定期进行检查，不合格的不予使用。

（6）、当不具备职业健康安全的作业条件时，所有员工有权拒绝接受任务，有权拒绝违章作业指令，对他人违章作业有权加以劝阻和阻止。

（7）、为保证施工人员及操作者的安全，在重点部位（支撑、塔架、脚手架、护栏、马道等）设置明显标志，以提醒施工人员和操作者注意安全。

（8）、冬季施工现场采取有效的防滑措施。施工用路、铺道上严格控制生产、生活用水，泥浆洒漏。在雪天或冰冻路滑地段及时组织人力将冰雪进行铲除并铺洒粗砂粒防滑。对爬梯、马道、工作面上的冰雪组织人力进行清除。



(9) 对施工临建棚、架线杆、围挡、塔架、支架等设置拉索、斜撑进行加固，使之能抵抗 6~7 级风的袭击。对各种架空管线采用设置临时架线杆等措施进行加固，保证其正常运转。



(10) 现场材料堆放场地布置合理，临时或长时间放置皆做到稳固可靠，符合安全要求，防止倾倒、滑落。并按照要求设置警示、提示标志。雨后、雪后、风后进行专项安全检查，消除其危险状态。

(11) 技术工种，如电工、焊工、机械操作工、起重工及车辆司机等都持证上岗，经过专门培训，考试合格取证后，再进行操作。

(12) 施工中现场专职安全员经常巡视，发现问题及隐患及时处理。安委会定期对施工现场进行检查，对发现的隐患和整改情况做好记录，并在安全会上进行总评，限期整改。

第四节 施工安全保证制度

一、施工前的安全准备工作

1. 建立和健全安全保证体系

项目经理部建立以项目经理为总负责人的安全生产责任制，以及下属工程技术人员、班组长的安全生产保证体系。工程技术人员负责编制安全技术措施，班组长负责带领班组人员实施。专职或兼职安全员负责协助，项目负责人每星期进行一次安全例会，传达上级的安全指令，通报上一周项目施工中存在的隐患情况，明确下一步任务，确保施工安全的工作重点，对季节施工、环境变化做出指示，并制订相应对策。

2. 施工前的勘察

本工程施工前应应对所要施工区域、周围设施、道路、高压线路等进行必要的安全勘察，特别是高空作业，起重吊装作业及对周围人员、临时设施、道路的影响，应做充分的安全考虑。结合勘察情况及施工作业期限，根据本工程的施工现场平面图，有针对性制定出井架的平面位置、脚手架搭设、高空坠落和物体打击事故及施工用电等的技术措施方案。

3. 安全教育

工人进场必须进行岗位安全三级教育，即必须进行公司一级、项目一级、班组一级安全教育。新进场的工人队组，首先由生产安全管理处讲授安全生产常识和技术要求，治安由保卫科负责，道德教育由工会负责，教育后办理签字手续。新进场的工人队组到施工项目部施工前，由项目部进行安全技术教育，具体由项目经理负责，教育后办理签字手续。班组一级教育由主管工长具体负责，教育内容为事故教训及本工程工作环境等，教育后办理签字手续。安全生产知识教育，每月 1 日每个工种上一次安全课，由项目部安全员在工地授课，经考核合格后，



二、施工中的安全管理

1. 施工现场保卫工作

施工区域与工人生活区域要实行有效隔离。成立保卫领导小组，由项目经理任组长，负责全面保卫工作。工地设门卫值班室，由门卫昼夜轮流值班，白天对外来人和进出车辆进行检查，夜间值班守护施工现场。重点是仓库、办公室、井架及成品、半成品保卫。加强民工的管理，摸清人员底数，掌握每个人的思想动向，及时进行教育。每月对职工进行一次治安教育，每季度召开一次治安会，定期组织保卫检查，并将会议检查整改记录存入内业管理资料中。

2. 施工安全技术交底

安全技术交底的安全技术措施要全面，要有针对性，并经技术部门及分管经理签字及盖章后，方可实施。各分项施工前，由工长对队组进行安全技术交底，交底内容要全面，结合本工种及施工环境针对性要强，与队组办理手续。否则，要追究工长责任。开工前公司技术负责人要将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况向项目负责人及施工员进行详细交底。分部分项工程由施工员向各工种班组长进行安全交底。班组长要对工人进行施工作业环境的安全交底。安全技术交底的签字手续必须由交底者和接受交底者进行签字，绝对不允许代签。

3. 安全检查

项目部进行日、旬检查，并有记录，整改应做到“三定一落实”，即定人、定时间、定措施、落实整改回访。每次安全检查，施工项目经理必须进行整改安全隐患，并做出书面报告送回公司质安科。在上级部门的安全检查中，公司将根据各施工项目的检查情况分别给予奖励或处罚。班组的每周安全日，由工长组织班组和安全员进行安全检查，对存在问题提出整改措施和完成时间，凡不进行周安全活动队组，要追究工长和队组长的责任。

4. 特殊工种持证上岗

特殊工种操作人员，如电工、机械工、焊工、架子工等人员必须经地市级部门培训，在取得操作证后才能上岗。

5. 脚手架工程

在主体施工上部时即在四周搭设外脚手架，挂设立网，采取封闭式施工。立网应采取符合质量要求的密目式安全网，立网不得低于作业面的 1.2m，并办好检查交付使用验收手续。在建筑物的四周设置安全防护，保证施工人员的安全，保证现场无安全事故。架子搭设前，架子专业工长向全队架子操作工进行安全技术交底，组织好大家学习上级文件规定，架子工技术、安全操作规程、规范和评分标准，提高他们的技术素质，增强安全意识。搭设脚手架材料规格



必须符合有关规定。脚手架不得使用腐败、虫蛀、枯脆的木、竹材料。脚手架地基应平整夯实或加设垫木、垫板，使其有足够的确实承载力；与墙面应设置足够和牢固的拉结点，不得随意加大脚手杆的距离。架子搭设好后，要以工长、安全员全面检查鉴定、验收合格后，并办理好

验收手续，才允许使用该架子。架子验收必须分段进行，并进行中间验收和总验收。在架子搭设好后，要经工长、安全员全面检查鉴定、验收合格后，并办理好验收手续，才允许使用该架子。架子验收必须分段进行，并进行中间验收和总验收。在架子上作业时必须戴安全帽，系安

全带，穿软底鞋，所用的材料应堆放平稳，工具应放入工具袋中，上下传递物件，不得抛掷。在外墙施工前，必须对外架进行检查加固工作，经过检查加固合格后的外架，才能进行外墙装饰工作。架子拆除必须有专人指挥，并将红布系在栏杆上，用栏杆做危险区护栏，并派专人站岗，不允许进入危险区内。脚手架使用过程中，不经项目安全员允许不得随意改动脚手架。拆除脚手架时严禁从空中向下抛掷。

6. 模板工程

模板上施工荷载不得超过设计的规定值，模板的材料堆放均匀。模板拆除前需向技术人员申请批准，确保混凝土强度达到设计值方可拆模；拆模时拆除区域应设置警戒线并且设专人监护指挥，严禁建筑物上留有未拆除的悬空模板。

7. 钢筋工程

(1) 钢筋加工机械的操作人员，应经过一定的机械操作技术培训，掌握机械性能和操作规程后，才能上岗。

(2) 钢筋加工机械的电气设备，应有良好的绝缘并接地，每台机械必须一机一闸，并设漏电保护开关。机械转动的外露部分必须设有安全防护罩，在停止工作时应断开电源。

(3) 钢筋加工机械使用前，应先空运转车正常后，方能开始使用。

(4) 钢筋冷拉时，冷拉场地两端不准站人，不得在正在冷拉的钢筋上行走，操作人员进入安全位置后，方可进行冷拉。

(5) 使用钢筋弯曲机时，操作人员应站在钢筋活动的反方向，弯曲 400mm 的短钢筋时，要有防止钢筋弹出的措施。

(6) 粗钢筋切断时，冲切力大，应在切断机口两侧机座上安装两个角钢挡杆，防止钢筋摆动。

(7) 在焊机操作棚周围，不得放易燃物品，在室内进行焊接时，应保护良好环境。

(8) 搬运钢筋时，要注意前后方向有无碰撞危险或被钩挂料物，特别要避免碰挂周围和上下方的电线。



(9) 安装悬空结构钢筋时，必须站在脚手架上操作，不得站在模板上或支撑上安装。

(10) 现场施工的照明电线挂在横担木上，如采用行灯时，电压不得超过 36V。

(11) 起吊或安装钢筋时，要和附近高压线路或电源保持一定的安全距离，在钢筋林立的场所，雷雨时不准操作和站人。

(12) 在高空安装钢筋必须扳弯粗钢筋时，应选好位置站稳，系好安全带，防止摔下，现场操作人员均应戴安全帽。

8. 混凝土工程

(1) 混凝土搅拌开始前，应对搅拌机及配套机械进行无负荷试运转，检查运转正常，运输道路畅通，然后开机工作。

(2) 采用手推车运输混凝土时，不得争先抢道，装车不应过满；卸车时应有挡车措施，不得用力过猛或撒把，以防车把伤人。

(3) 使用井架时，应设制动安全装置，升降应有明确信号，操作人员未离开提升台时，不得发升降信号。提升台内停放手推车要平稳，车把不得伸出台外，车轮前后应挡牢。

(4) 使用溜槽及串筒下料时，溜槽与串筒必须牢固固定，人员不得直接站在溜槽帮上操作。

(5) 浇筑单梁、柱混凝土时，应设操作台，操作人员不得直接站在模板或支撑上操作，以免踩滑或踏断支撑而坠落。

(6) 混凝土浇筑前，应对振捣器进行试运转，振捣器操作人员应穿胶靴、戴绝缘手套，振捣器不能挂在钢筋上，湿手不能接触电源开关。

(7) 浇筑梁或墙上的圈梁时，应有可靠的脚手架，严禁站在模板上操作。浇筑挑槽、阳台、雨篷等混凝土时，外部应设安全网或安全栏杆。

(8) 楼面上的预留孔洞应设盖板或围栏。所有操作人员应戴安全帽；高空作业应系安全带，夜间作业应有足够的照明。

9. “三宝”“四口”防护

进入施工现场必须正确佩戴安全帽。安全网、安全带、安全帽计划由项目经理编写，材料科负责采购，质安科负责质量鉴定。安全防护用品厂家必须有生产许可证，安全防护用品必须有合格证、有国家建设部推荐书。安全网按照要求搭设，佩戴安全带必须坚持高挂低用的原则。“四口”防护必须按《建筑施工高处作业安全技术规范》中的要求进行设置。楼梯口、电梯口、电梯井口、预留洞口、坑井口、通道口及阳台、走廊、屋面等临边必须设置临时防护栏杆。在施工中，要经常检查与维修“四口”防护。所有安全防护设施，未经安全员批准，任何



人不得拆除移动，以确保安全生产。

10. 安全用电

工地设电工二名，负责工地施工用电管理。所有用电器具均作接地保护，安装漏电保护开关，用电线路架设严格执行安全规范。尽量采用架空线路，如有临时用到拖地线路时，必须是耐磨压绝缘性能良好的无损伤电缆，不允许使用普通电线代替。每个用电器要有各自专用的闸刀开关，不允许一闸多用，不允许线路混乱。配电箱要防雨并上锁，由电工保管，其他人员一律不得私自接线。用电器、闸刀开关必须使用符合要求的保险丝，绝不允许用其他金属线代替。

11. 机械设备

操作人员必须有高度责任心，严格按《建筑机械使用安全技术操作规程》操作，经常检查消除故障，进行维修保养设备。井架严禁乘人上下、不准在井架底下穿行，不准超载运行，并必须做警告标志、指挥信号、安全防护工作。机电设备进场后，应细致检查各部位和防护装置是否齐全灵敏、可靠，然后进行启动运转，运转正常经机械员验收合格后方可使用。搅拌机、灰浆机进场，安置地应平整夯实牢固，安装完毕后交由“三机工”进行操作。电焊机、小圆锯等设备零件必须齐全良好，有防护装置。施工机械应有防雨设施。开机操作应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。

12. 现场防火、防爆的消防措施

严格执行“中华人民共和国消防条例”和公安部关于建筑工地防火的基本措施。储存：存在专用仓库内，分类存放，设专人严格管理，并建立台帐，定期清点。领用：对领用人、领用品、领用数量、领用日期进行控制。防止施工现场的火灾事故发生：以现场管理人员和操作人员人员进行消防培训，增强消防意识。对电锯房、油库、化学品仓库等一律配备符合规定的灭火器，严格落实各项消防规章及防火管理制度。不准在宿舍内私自用电炉、电饭煲、煤油炉等，不准私自乱拉乱接电灯，不准在宿舍内使用 60W 以上的电灯泡。各类电气设备线路不准超负荷使用，线路接头要接实接牢。穿墙电线或靠近易燃物的电线要穿保护。

13. 立体交叉作业及高空的防护、保护措施

(1) 立体交叉作业的防护、保护措施：立体交叉作业在下部的作业面上搭设安全防护棚。立体交叉作业时要有专人在场进行监督指挥。建筑物的道路、通道口、出入口等部位要搭设安全防护棚。

(2) 高空作业安全防护措施：凡患不适宜从事高空作业疾病的人员一律禁止从事高空作业。高空作业区域必须划出禁区并设置围栏，禁止行人、闲人通过闯入。建筑物的入口处及周



围的人行通道均搭设防护棚，棚顶满铺 2 层脚手板。高空作业人员必须按规定路线行走，禁止在没有防护设施的情况下，沿高墙、脚手架、起重臂攀登和行走。高空作业夜间施工应有足够的照明设备和避雨设施。

第五节 安全保证措施

1、路基土方施工安全

(1) 挖掘机作业安全

作业时应保持水平位置，行走机械予以制动；铲斗工作没结束时，不准旋转大臂和走车。进行装车作业时，铲斗应尽量接近车箱，但不得碰撞汽车的任何部位；汽车未停稳时不准装车；铲斗装车时升降不能过猛。挖掘机手离开驾驶室时铲斗应放落在地面上。禁止用挖掘机起吊重物。

(2) 推土机作业安全

在斜坡上推土时，应先推土填平工作场地；坡道行驶时，要低档前进并不得换档，也不准空档滑行；横向行驶坡度不得超过 10 度。沟槽边沿作业时，刀片不能超出沟槽边沿，并且要有专人指挥。两台以上推土机在同一现场作业时，前后距离不得小于 8m，左右距离不得小于 1.5m。工作结束时，应将机械停放在平坦安全的地方，放下刀片，锁好门窗。

(3) 压路机作业安全

作业中需人工清除碾子上的粘物时，清理人员要站在两旁，禁止正面跟进。两台以上压路机在同一场地作业时，前后间距不得小于 5m，左右不得小于 1.5m，坡道上不得纵队行驶。作业后应将压路机停放在平坦坚实的地方，不得停放在土路边缘及斜坡上或妨碍交通的地方。

(4) 平地机作业安全

平地机行驶的前方不得有坚实障碍物和人员，转弯、调头时应用最低速度，行驶时必须将刀片升到最高位置，并将其斜放，两端不得超出后轮外沿。作业后应停放于平坦安全的地方，放下刀片并拉上制动器。

2、混凝土拌和站安全措施

(1) 设备安装必须严格按照施工平面图和设备使用说明书进行。安装工作要有组织、有计划，安装完毕必须进行综合试运转并办理验收手续，方准正式投入使用。

(2) 每个操作间应悬挂安全操作规程，操作人员必须严格按程序操作。道路出入口、重要安全装置等处要悬挂安全警告标志。

(3) 配电箱开关要分开设置，必须坚持一机一闸用电，并采用两级漏电保护装置；配电箱、开关箱必须安装牢固，电具齐全完好，注意防尘。



第六章、环境保护、水土保持保证措施

施工阶段所有活动符合国家、市地方环保法律、法规的要求；在七个环保、水保防治区的一切活动，最大限度地做到不影响周边居民的正常生活，不影响施工沿线的水土保持和生态环境。

具体环保目标如下：

1、施工现场场界噪声达到排放标准，明确施工场界噪声限值为：6：00～22：00 不大于 70dB，22：00～6：00 不大于 55 dB。

2、生产、生活污水尽可能地回收循环利用。

3、固体废弃物集中、分类堆放。

4、取土场遵循复耕和生态防护为主，工程防护为辅的原则，做到“三同时”，施工期临时排水系统畅通，将水土流失降到最低限度。

5、洒水降尘，确保空气质量。

6、节约能源、资源，降低钢材、水泥、木材等材料和水电的消耗量。

在整个施工过程中，严格遵守国家环保部门对环境保护、水土保持的有关规定，切实遵守招标文件对环境保护、水土保持的具体要求。

第一节 环境保护、水土保持保证体系组织机构

我公司将从保护环境的根本利益出发，按照总公司通过的 ISO14001 环境管理认证体系来运行和控制。项目经理部成立以项目经理为首的环保水保领导小组，由安质环部负责日常工作，下设专职环保工程师，专门负责施工期间环境保护工作的联络、组织和落实，并协助发包人、监理人和环境保护机构开展日常工作。

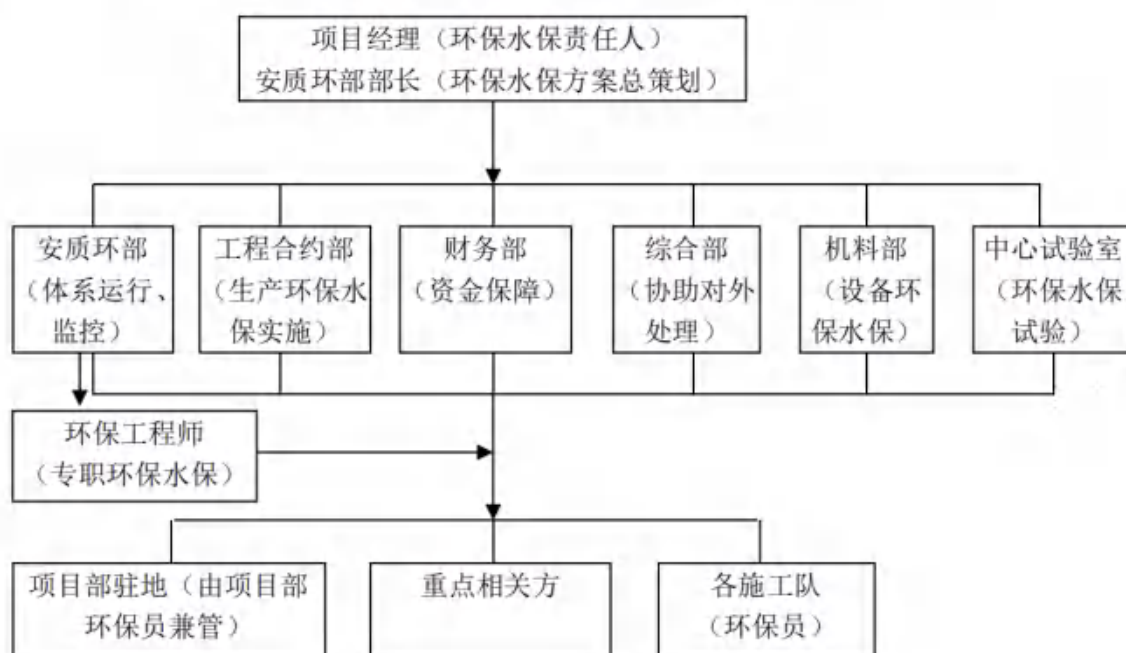




图 6-1 环境保护、水土保持保证组织机构

建立健全环保、水保体系，制定全面而系统的环境与生态保护、水土保持的管理办法和措施，符合国家、地方政府有关环保、水保的标准，坚持施工过程中对环保工作的持续监督检查。

项目部环保、水保领导小组的职责是结合施工组织设计，制定实施性的环境保护措施，从思想、宣传、组织、制度、措施、经济等方面入手，形成严密的控制格局，确实保证环境保护工作落到实处，使施工现场环境与生态保护、水土保持工作满足国家和各级环保部门的标准。在施工过程中，有计划地保护和改善环境，预防环境质量的恶化，控制环境污染，减少和消除有害物质进入环境，创造适宜的劳动和生活环境，保护自然生态和人身健康。

第二节 环境保护、水土保持保证措施

施工环境保护的重点有：噪声与振动控制，取土场节约用地及临时用地恢复，工程跨越沟等敏感水体的保护，沿线居民区施工噪声、扬尘控制，施工扬尘对农作物生长的影响控制和施工固体废弃物管理等。

加强施工期生态环境保护管理，建立高效、务实的生态环境保护管理体系，制订相应的生态环境保护管理办法。主动接受地方环境和水土保持的主管部门提前介入，对施工环境和水土保持进行监控、指导、及时处理。

1、临时工程环保措施

1.1 临时工程按照设计统一规划、《省高速公路工程工地建设标准化细则》（试行）要求和施工环保的要求进行实施。严格在设计核准的用地界和临时用地范围内开展施工作业活动，绝不随意开挖、碾压界外土地。

1.2 临时工程设施（如砼拌合站、预制场、钢筋加工厂、生活与生产房屋等）选址在地表植被稀少、易于恢复的地方；确有困难时，经有关部门批准后修建。施工现场生产区和生活区种植树木花草进行绿化，美化施工环境。临时用地使用完后恢复至原有的地形地貌或比原有更改善的状况。

1.3 合理布置施工便道，尽量减少施工便道数量，不在便道两侧就近取土。施工营地合理选择在一定的距离范围内。

1.4 临时工程设施修建不切割、阻挡地表径流的排泄，不在临时工程附近形成新的积水洼地或负地形。

2、废水、废渣处理措施

2.1 施工机械维修产生的含油废水、施工营地产生的生活污水经处理达到排放标准后尽可能地回收循环利用，多余的排入地方水系。施工废水按有关要求进行处理达标后排放，不污染



周围水环境。

废水处理采用多级沉淀池过滤沉淀，废水处理的工艺流程为：废水→收集系统→多级沉淀池→沉淀净化处理→排入地方水系。在施工时，对天然排水系统加以保护，不随意改变，必要时修建临时水渠、水沟、水管等。



2.2 拌合站砂石料存放场设沉淀池，处理清洗骨料和冲洗机械车辆产生的废水，沉淀达标后排放。

2.3 废碴主要包括冲洗拌合站沉淀池中的废碴、建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。

2.4 工程施工期，加强施工营地及施工队伍的环境保护管理，合理设置垃圾箱、垃圾池等环卫设施，集中收集的生活垃圾定期送到当地的垃圾卫生填埋场进行填埋处置，不随意倾倒，以免污染当地环境和影响景观。施工产生的建筑废料尽量回收、利用其中的有用部分，剩余废物送到当地的建筑垃圾填埋场填埋或作妥善处置，严禁乱堆乱放。

3、防止空气污染和扬尘措施

3.1 拌合站、工程材料存放场地、生产和生活区道路采取硬化处理，施工便道用混凝土硬化，施工过程中经常洒水和及时清扫，防止扬尘对施工人员造成危害和对周边农作物的影响。

3.2 在运输易飞扬的散料时，装料适中并用蓬布覆盖。储料场松散易飞扬的材料用彩条布遮盖。避免运输、装卸过程中和刮风时扬尘。

3.3 六级以上大风停止土方倾倒、摊铺工序作业。

4、施工噪音控制措施

4.1 对施工机械和运输车辆安装消声器并加强维修保养，降低噪音。钢筋加工、混凝土拌和、预制场等场地选择在远离居住区的 K3+755 左侧。车辆途经施工生活营地或居住场所时减速慢行，不鸣喇叭。适当控制机械布置密度，条件允许时拉开一定距离，避免机械过于集中形成噪音叠加。

4.2 在靠近学校、医院和居住区较近的地方施工时，合理安排作业时间，对噪音较大的机械设备修建隔音棚或隔音墙，减少对居民的干扰。

4.3 在比较固定的机械设备附近，修建临时隔音屏障，减少噪音传播。合理安排施工作业时间，尽量降低夜间车辆出入频率，夜间施工尽量不安排噪音很大的机械施工。

4.4 当噪声敏感点规模较大，优先选用低噪声施工机械、设备和工艺，仍不能满足噪声要求的，考虑夜间不施工。振动较大的固定机械设备加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持良好运转，降低噪声。

5、对沿线风景区和敏感水体的施工环保措施



对通过的自然风景区和人造景区，在施工中对其予以充分保护。

5.1 施工前，会知线路所通过地区的当地政府、环保部门，经充分沟通、协商，明确风景区或敏感水体范围并制定相应措施后方可施工。

5.2 施工中，争取景区或水域管理部门的配合并严格按照制定的环境保护措施实施，确实保证不污染周围环境。

5.3 完工后，成立专门的清理队伍，清理施工中留下的泥浆、余土、废渣等污染物，拆除施工围堰以及栈桥等临时设施，尽量恢复原有的状况或有所改善。

6、节能减排优化措施

节能减排主要是减少能源浪费和降低废气、废水排放。施工过程全面推行节能减排活动，将拌合站、钢筋加工厂、预制场等集中布置，并配备变压器，防止线路长电能损耗；施工机械维修产生的含油废水、施工营地住宿产生的生活污水经生化处理和多级沉淀池过滤达到排放标准后尽可能地回收循环利用，减少对环境污染；采用大功率设备以减少设备的用量；建立调度中心加强对项目部坐行车辆的管理，充分发挥车辆的在工作中的利用率，减少车辆数量，达到节能减排效果；食堂采用液化气、电能作为主要能源，不采用木材，减少对资源的直接破坏。

7、施工水土保持措施

7.1 合理安排施工用地，施工场地范围内的树木进行移植，保护施工场地和临时设施附近的植被；临时用地范围内的裸露地表植草或种树进行绿化；及早施作防护工程、排水工程、环保工程和裸露地表的植被覆盖，防止水土流失。

7.2 临时工程设施修建不切割、阻挡地表径流的排泄，不在临时工程附近形成新的积水洼地或负地形。对施工人员加强保护自然资源的教育，在施工期内严禁随意砍伐树木。

7.3 在当地排水沟边施工，防止弃土、弃碴淤积、污染沟内水质。

7.4 施工场地硬化和道路灰土板结处理，周边和两侧设排水沟，防止排水引起水土流失。

7.5 路基、桥涵施工时，做好临时排水系统，按照防洪要求配备足够的应急物资、设备和队伍，确保不因暴雨等原因引起水土污染和流失。

8、熟悉法律法规，人员培训

专职环保员负责收集相关的环境保护法律法规和当地政府的有关环境保护条例，整理出与工程实地有关的条款和要求，由环境保护领导小组评审通过后传达到各个部门和各个作业班组、相关方(如材料供应商)。通过培训，使全体员工自觉遵守。

9、制订预防措施

对影响环境的水、气、声、渣等因素进行评价，对可造成环境污染的施工行为制订预防措



施工方案，并将此方案形成文件传达到相应部门和班组、个人。

10、水土及生态环境的保护措施

(1) 保护植被，对施工界限内、外的植被、树木等尽量维持原状。如因施工需要砍除树木和其它经济作物时，事先征得环境保护和水土保持部门、所有者和发包人的批示同意，严禁乱

砍乱伐。

(2) 营造良好环境。在施工现场和生活区设置足够的临时卫生设施，经常进行卫生清理，同时在生活区周围种植花草、树木，美化生活环境。

(3) 工程完工后，及时彻底进行现场清理，并按设计要求采用植被覆盖或其它处理措施。

(4) 对有害物质按规定处理后，运至监理人指定地点进行掩埋，防止对动、植物造成损害。

(5) 运输车辆必须作好防漏措施，以防物料污染道路。

11、水环境保护措施

(1) 靠近生活水源的施工，用沟壕或堤坝同生活水源隔开，避免污染生活水源。

(2) 清洗机械、施工设备的废水及生活污水，采用必要的净化措施达到一定卫生标准才得排放。施工机械应防止严重漏油，禁止机械在运转中产生油污未经处理就直接排放，或维修机械时油水直接排放。

(3) 施工产生的废浆要用专用汽车拉运至监理人指定的地点倾倒，并设渗坑进行处理，不得排放到河流、水沟、灌溉系统里，以免造成河流和水源污染。

12、环境监控、指标检测

施工中配合有关部门进行环境监控，提供协助。噪音检测由专职环保员配备仪器自行检测。各项指标检测记录存档备查。

13、纠正与改进措施

在施工中如出现对环境造成污染的情况，专职环保员现场核实，提出纠正和改进措施，报领导小组审批后实施。



第七章、文明施工、文物保护保证措施

第一节 原有道路保通措施

本项目沿线分布有村庄及城镇，施工时需考虑与本项目相交的道路施工期畅通问题，保证原有道路畅通。施工过程中，应限制车辆随意行驶，并对施工便道按时进行洒水养护，防止由此引发的具有水土保持功能和防尘功能的原生地表的破坏。为了减少对交通的影响，保证本项目的顺利实施，开展交通组织施工。

一、施工作业区划分

为路面施工作业所设置的交通管理区域，分为警告区、上游过渡区、缓冲区、工作区、下游过渡区和终止区等。

1、警告区

从作业控制区起点设置施工标志到上游过渡区之间的路段，用以警告车辆驾驶人已经进入养护作业区，按交通标志调整行车状态。

2、警告区最小长度

保证驶入警告区的车辆减速至工作区规定的限速所需要的警告区路段的最短长度。

3、上游过渡区

保证车辆平稳地从封闭车道上游横向过渡到缓冲区旁边非封闭车道路段。

4、缓冲区

上游过渡区和工作区之间的路段。

5、工作区

养护作业的施工操作区域。

6、下游过渡区

保证车辆平稳地从工作区旁边的车道横向过渡到正常车道的路段。

7、终止区

设置于工作区下游调整车辆行车状态的路段。

二、临时设施

1、临时交通标志

根据项目交通组织方案临时交通标志是设于作业区或作业区前方，起提示和管理交通的作用。作业区需要设置的标志一般有道路施工安全标志、警告标志、禁令标志等。

(1) 警告标志：用以对车辆、行人提出警告的作用。警告标志的种类、规格及设置地点均应符合《道路交通标志和标线 第二部分：道路交通标志》GB5768.2中4的相关要求。



(2) 禁令标志用以对车辆、行人起限制作用。禁令标志的种类、规格及设置地点均应符合《道路交通标志和标线 第二部分：道路交通标志》GB5768.2中5的相关要求。

(3) 指示标志用以对车辆、行人的行为提出指示。指示标志的种类、规格及设置地点均应符合《道路交通标志和标线 第二部分：道路交通标志》GB5768.2中6的相关要求。



2、临时安全设施

(1) 施工路栏：用于养护作业现场的外围防护提示，可放在需要的地方主导交通，以防止意外撞击事件发生，减少损失。用于夜间作业时应有反光功能，并应符合《道路交通标志和标线 第二部分：道路交通标志》GB5768.2的要求。

(2) 施工隔离墩：防止车辆占用人行道、便道、消防通道，也可以用于管理车辆的出入。

(3) 移动式标志车：带有动力装置或可移动装置（拖车）的安全防护设施，使用时其尾部应面向交通流方向，设置于上游过渡区内或缓冲区后端。

(4) 道路安全警告灯：养护作业现场用以警示驾驶人员和行人前方路况的闪光装置，与施工标

3、临时设施设置注意事项

(1) 施工现场安全设施的设计和布置在满足规范要求的前提下，应规格统一，合理放置，清晰醒目，对失去可辨认性的标志、标牌应迅速替换，并正确维护，便于驾驶人识别和遵守，提高作业控制区人员、通过作业控制区的驾乘人员、车辆与施工设备的安全，减少作业控制区存在的交通安全隐患。

(2) 根据施工周期、施工道路交通量的大小、车速、施工位置等因素，选择合适的作业控制区布设方案。

(3) 根据施工现场的实际道路、交通条件，对布设方案进行一定修改调整。

(4) 确认作业控制区布设方案中各类安全设施齐全，否则应做出相应的调整。

(5) 根据布设方案安装作业控制区的各类安全设施，必须从驾驶人能看到的第一个交通标志开始。

(6) 作业条件或道路交通条件发生变化时，应及时调整作业控制区的布设方案并在施工现场予以修正。

(7) 作业完成后，必须撤除作业控制区内所有的安全设施。安全设施拆除顺序从终止区开始依次进行。

(8) 安全标志与隔离设施的摆放原则是：标志摆放人员应按照先上游后下游、先紧急停靠带后中央分隔带、先交通标志后安全隔离设施（如锥形交通路标、隔离墩等）的次序顺车流



方向摆放。

第二节 社会交通安全与责任

本项目施工期间会存在施工场地、机具设备以及施工人员与既有道路通行车辆相互交织、相互影响，加之一定阶段内局部道路需要封闭半幅，车流密度增加，车速降低，使得车辆驾驶员驾驶心理发生变化、波动，行车安全感大大下降，容易发生交通安全事故；同时，高速通行车辆对现场施工人员及施工机具设备安全也会构成一定威胁，二者相互影响，因此需要进行精细施工组织，确保行车安全与施工安全。

一、交通维护组织保证措施

- 1、成立交通协调管理小组，视情况协调有关单位，检查处理有关交通组织问题等。
- 2、配置交通协管员，负责现场交通的疏导及配合交警部门做好维持交通秩序及维护交通安全等工作。
- 3、做好施工人员的交通安全教育，通过多种形式，提高施工人员的交通安全意识，杜绝野蛮施工，切实落实交通组织方案。

二、交通管制措施

- 1、在项目实施过程中，与交警部门建立良好畅通的沟通渠道，确保交通疏导工作的高效率运作。
- 2、施工现场的标志要醒目，夜间配有安全警示灯。
- 3、在离施工区域2Km的位置开始，按规范设置各类警示牌标志。

三、夜晚施工的交通安全维护措施

- 1、购置施工照明车和其他安全设施，保证同时作业区有足够的设施。
- 2、在施工指示牌上安置足够的施工警告灯。
- 3、配备人员夜间巡视，发现安全设施由于车辆碰撞或气流吹倒，及时撤离损坏设施，并及时补充。

四、施工过程中出现交通事故的交通疏导措施

施工过程中，由于交通意外造成通行不畅时，项目部及时组织人员疏导交通，充分考虑小车的灵活性特点，指挥小车先行，货车、大车后行。

五、异常天气状况下的交通安全维护

- 1、在台风季节期间，加强路面的巡查工作，落实安全设施和施工机械的防台风措施，预防设施被吹翻，影响行车安全。
- 2、在雨雾、雨雪天气等行车视距不良的情况下，可通过与交管部门协商，建议如下：



设立提示警告标志，让驾驶员在行车过程中提高警惕。

限时控制放行车辆，实行流量管控。

在整个施工过程中，严格遵守国家对文明施工、文物保护的有关规定，切实遵守招标文件对文明施工、文物保护的具体要求。



第三节 文明施工、文物保护保证体系组织机构

我公司将从坚持文明施工、保护文物的要求出发，成立以项目经理为首的文明施工、文物保护领导小组，由工程合约部负责日常工作，下设专职监督员，专门负责施工期间的文明施工、文物保护工作的联络、组织和落实，并协助发包人、监理人和相关机构开展日常工作。



林刘
印晓

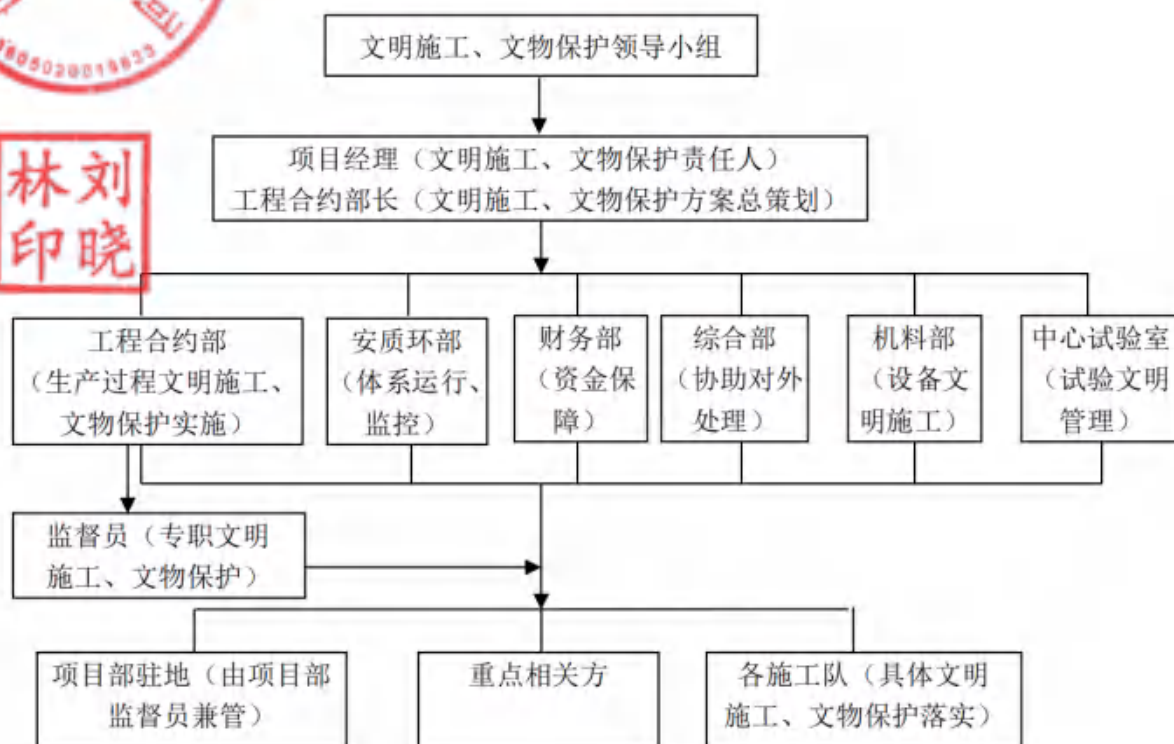


图 7-1 文明施工、文物保护保证组织机构

第四节文明施工、文物保护保证措施

一、文明施工组织机构

文明施工目标：实现规范化管理，创建文明施工标准化工地，施工材料堆放整齐，生活设施清洁文明，开展以创建文明工地为内容的思想政治工作，争取实现海南省“安全文明工地”。


在施工中，我单位将严格按照“集中施工、快速施工、文明施工”的十二字方针，把文明施工作为施工中的一个重点，以建立安全标准化工地为文明施工目标，总结我单位在其它工程施工中取得的经验，精心组织，合理安排，做到优质施工，文明施工。

健全机制，明确责任：项目经理作为文明施工的组织者，对现场文明施工负全权责任。现场文明施工的直接管理由项目经理部施工技术部负责，安全质量部负责监督检查。由项目经理和有关人员组成文明施工监督小组，按照文明施工细则每周检查，并在生产调度会上通报情况，提出整改措施。

文明施工和文物保护管理组织机构



林刘
印晓

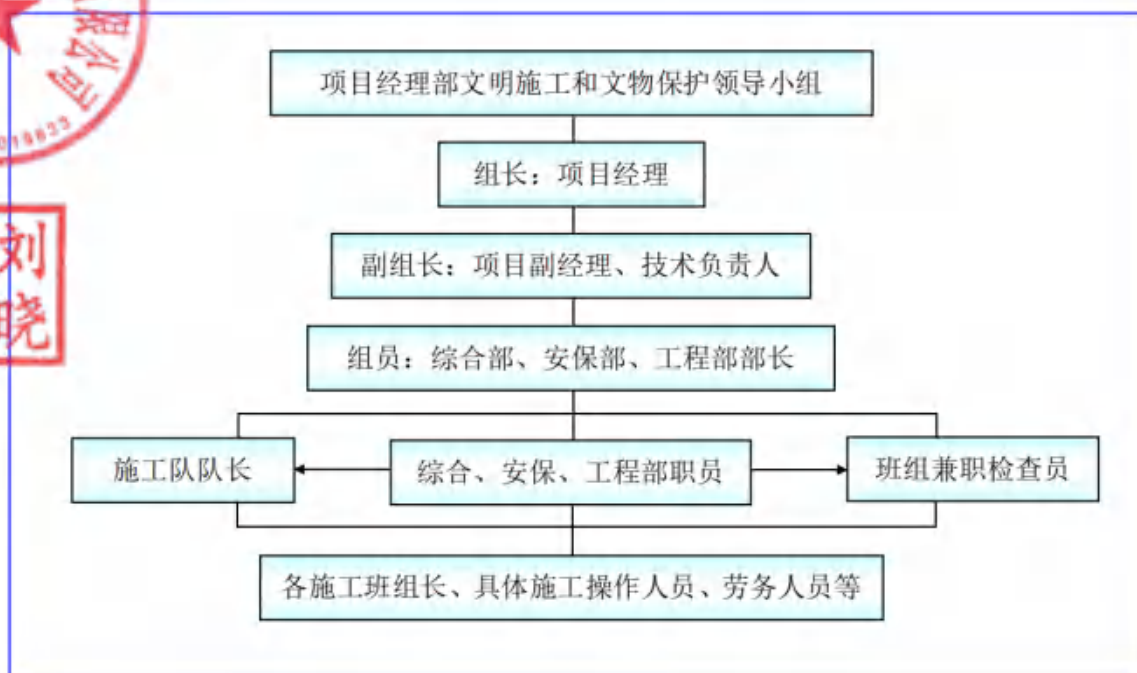

二、文明施工保证措施

加强全体职工职业道德的教育，制定文明施工准则。在施工组织、安全质量管理和劳动竞赛中切实体现文明施工要求，发挥文明施工在工程项目管理中的积极作用。

1、推行施工现场标准化管理

严格按照技术规范施工，按操作规程作业；随时保持现场整洁，机械停放井然有序，原材料堆码整齐，各标志、标牌齐全规范；施工便道经常洒水，防止尘土飞扬；各工点严格执行工完场清制度，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走，保持施工现场整洁。

2、实行持证上岗、挂牌施工制度

通过职工教育培训，使全员均能熟练掌握相关的操作规程、技术标准和工作标准，经考试合格方可持证、挂牌上岗。对于第一次考试不合格，补考一次仍不合格的人员，坚决不予上岗。施工现场设立工程简介、施工总平面布置图、安全质量宣传板，标明工程项目名称、范围、开工竣工期限、工地负责人，设立监督电话，接受社会监督。

3、施工内业资料齐全、数据可靠，办公室内按要求布置各类图表，及时反映现场状况及工程进度状况。

4、改善作业条件，保障职工健康

采取有效的卫生防护措施，经常保持现场及驻地的整洁与卫生，为职工提供清洁的饮用水和合格的施工用水，以保护职工和工人的健康。做好施工人员的医疗保障工作，配备医务人员



建立工地卫生所，并与当地卫生部门合作，防止传染病和准备常用急救药物。高温炎热季节施工时，采取一定的防暑降温措施。

5、深入调查，加强地下既有管线保护

施工前主动调查了解，详细掌握施工范围内地下既有管线布局 and 数量，并与有关部门密切配合，做好光缆、电缆等的保持和处理工作，在经过或邻近水利工程设施以及各类管线时，更要明确施工操作程序，采取必须的预防措施，避免发生堵塞、污染或损坏工程设施和各类管线。

5、做好已原有道路的保护工作

在施工中对已原有道路和原有设施都进行妥善保护，不损坏原有设施。在运输中采取运输路线，选用运输车辆，限制和分配载运重量及其他合理措施，防止任何运输车辆因超过载重限制而损坏或损伤所通行的道路或桥梁。大型施工装备和超重件的运输，事先取得道路管理部门的许可。

6、不扰民及妥善处理地方关系

合同段起讫点和固定工点设工程公告，施工便道干线和引入线设置明显规范的交通引导标志；爆破作业等特殊作业区，设安全防护员和安全防护标志；施工期间，经常对施工机械车辆通行的道路进行维修，确保道路晴雨畅通；加大工程建设意义的宣传力度，争取地方百姓对施工生产的大力支持。

7、广泛开展共建活动

与当地政府积极配合，加强对施工人员的全面管理，确保在施工地区内，施工人员无违纪违法现象发生。与当地政府和群众积极开展共建活动，积极推进精神文明建设，支持地方经济建设。自觉执行当地政府有关部门规定，施工中接受群众监督。

8、尊重当地民风民俗

教育全体职工，加强对地方法规、法令的学习，进一步在思想上提高认识，坚决执行党的民族政策，了解当地的民风、民俗和风土人情，充分认识到尊重民风、民俗是促进民族团结的需要，是维护国家安全的保证。遵守地方法规，乡规民约，自觉尊重、遵守当地民风民俗习惯，不做有损于民风民俗的事。

9、积极开展建家达标活动

平面布置整齐划一，周围种植花草树木，创造良好的生活环境；生活区设文娱室，丰富业余文化生活；现场和生活区设置临时卫生设施，每天清扫处理，保持清洁。

三、文物保护体系及保证措施

1、文物保护体系



施工现场发现的所有文物都是国家的财产，为此，项目部成立以项目经理为组长的文物保护领导小组。

2、文物保护保证措施

①、加强对干部、职工文物保护教育，增强全员的文物保护意识，提高文物保护的主动性。营造“文物保护责无旁贷”的氛围，并建立奖惩制度。

②、本着既对工程建设负责又对文物保护负责的原则，施工中，发现有历史文物、古墓葬、古生物化石及矿藏等，立即停工，及时向当地政府、文物及有关管理部门报告并办理有关手续。

③、采取严密的专人看守与保护现场措施，绝不允许人员移动及损坏任何这类物品。


④、配合文物管理部门做好必要的其它保护，并将对文物遗迹的各类现场保护情况及时书面报告建设单位。

后附：《文明施工和文物保护保证体系框图》



林刘
印晓

文明施工和文物保护保证体系框图

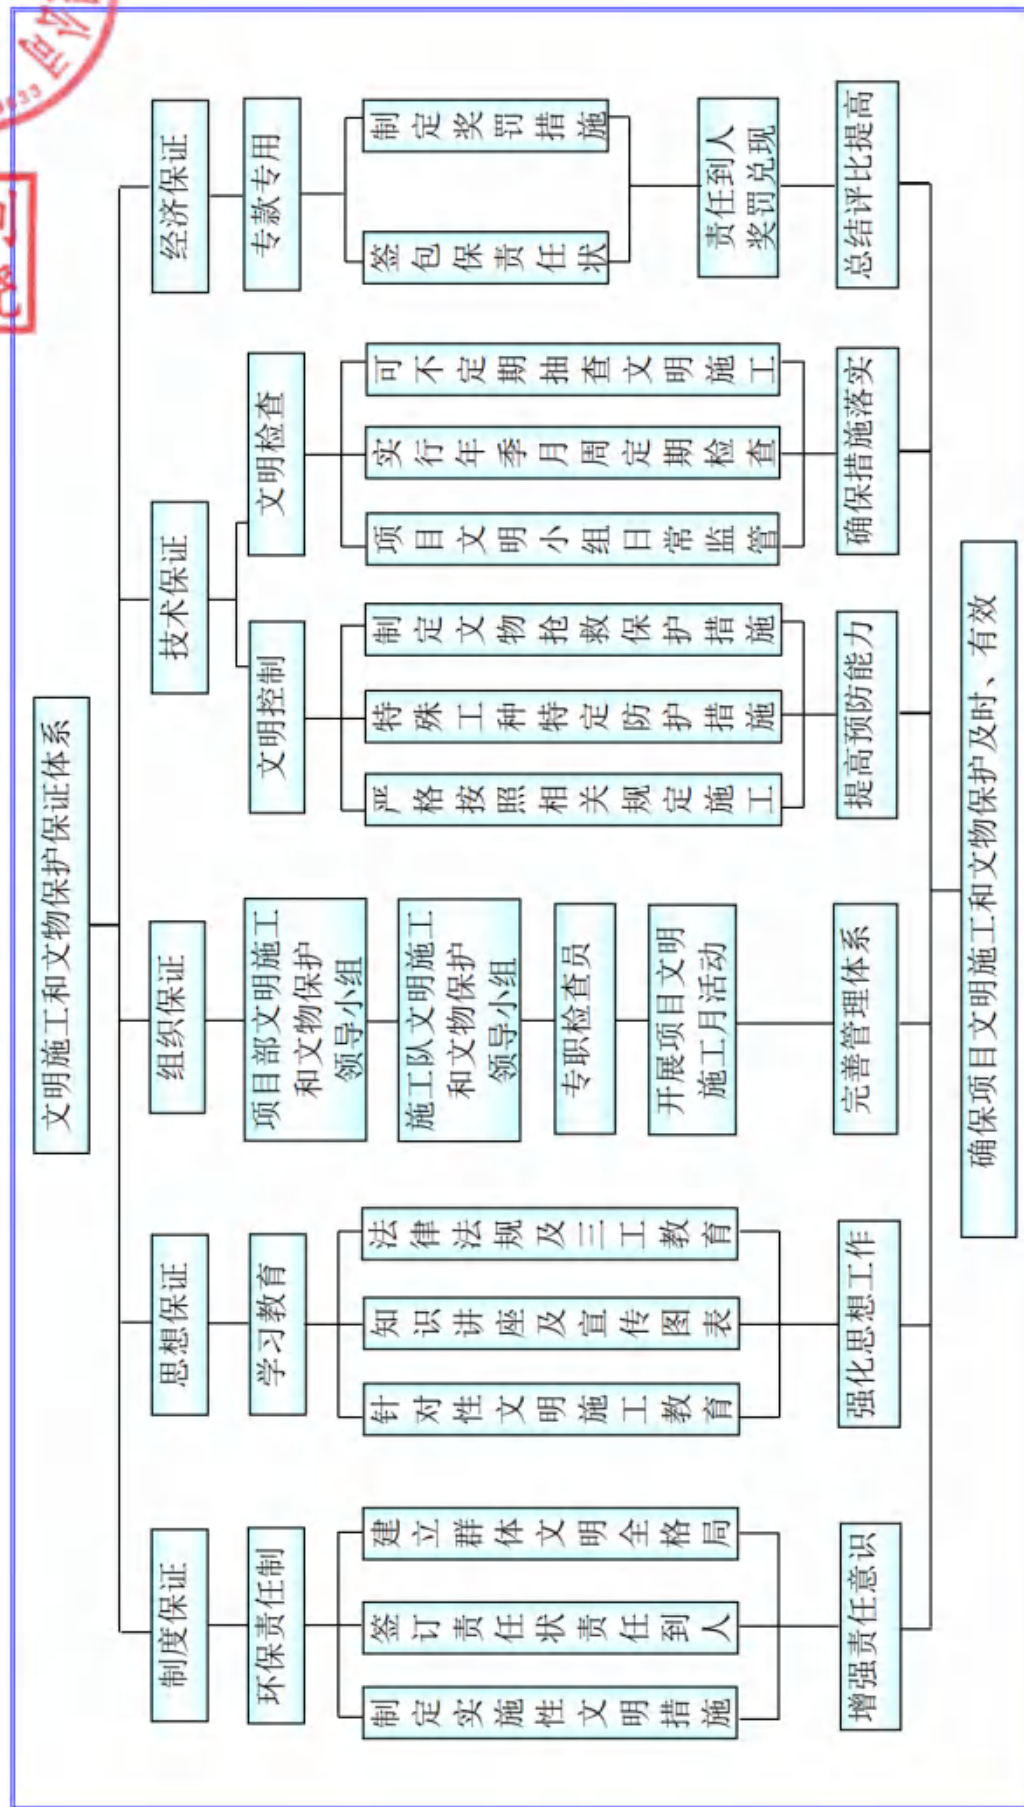



1、设置文明施工管理组，负责现场的文明施工形象。

2、项目部与各施工队之间层层签订文明施工协议，明确目标与责任。

3、施工现场的各项临时设施严格按照总平面布置图的要求进行布置，现场设置文明施工标语和施工标牌。



4、施工现场的用水、用电线路统一按规划建设并尽可暗埋或沿路幅外侧布设。

5、施工材料进场后，应到堆码有序，标识清楚，严禁乱堆乱放，减少浪费。

6、尽量降低施工现场的机械噪音，减少施工灰尘，晴天安排洒水车保持地面湿润。

7、加强对项目部职工的文明施工教育，教育大家遵纪守法，做到人人讲卫生、讲文明、讲道德讲礼貌，避免与周边居民发生纠纷和冲突。

8、现场施工人员需佩带标牌和戴好安全帽。

9、在工程现场施工过程中挖掘出的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品，采取一切必要的措施保护现场，防止其他任何人员移动或损坏该类物品，并且立即将此发现通知监理人，抄报发包人，并执行监理人关于处理此事的指令。



第八章、其他应说明的事项

公路工程施工具有野外、露天、高空作业多，施工场地点多线长，流动性大，不安全因素多，建设周期长等特点，因此工程建设期间所承受的风险也比较大。

第一节 项目风险的分类

工程项目风险划分为以下几类：自然风险、政治风险、经济风险、市场风险、技术风险、管理风险等。

第二节 项目风险管理的步骤

风险管理就是对工程项目中的风险进行管理，以降低工程项目中风险发生的可能性，减轻或消除风险的影响，用最低成本取得对工程项目保障的满意结果。风险管理可分为五个步骤：

① 识别项目中潜在的风险源。② 分析各风险对项目的影响，并选出对项目有重大影响的那些风险以便进一步分析。③ 综合评价这些重大风险对项目的总体影响程度。④ 制定控制风险的应对计划，确定降低风险发生的可能性并减少其不良影响的方法。⑤ 对已识别的风险实施监测、检查；不断识别新的风险；对风险计划及时修订和评估并实施。

第三节 项目风险的防范控制措施

1、熟悉和掌握工程施工阶段的有关法律法规。依据法律法规办事，增强用法律保护自己利益的意识，有效地依法控制工程风险。

2、深入研究和全面分析招标文件。全面分析招标人须知，详细审查图纸，复核工程量，分析合同文本，研究招标策略，以减少合同签订后的风险。

3、签订完善的施工合同。综合分析、慎重决策，不能签订不利的、独立承担过多风险的合同。通过合同谈判，对合同条款拾遗补缺，尽量完善，防止不必要的风险；对不可避免的风险，应有相应的策划和对策。

4、掌握要素市场价格动态。及时掌握要素市场价格，使报价准确合理，减少风险的潜在因素。

5、在项目实施过程中，要实行全面成本控制，按照所选定的施工方案，严格按照成本计划实施和控制。降低材料成本。对主要材料实行限额领用，根据施工预算严格控制，按理论用量加合理损耗的办法与施工班组结算。健全收料制度，实行三级收料。降低人工及机械费用。减少窝工浪费，压缩非生产性用工与辅助用工。正确选配和合理利用机械设备，尽量减少施工中所消耗的机械台班量。降低施工管理费用。

6、加强合同管理，分析不可避免的风险。对风险较大的工程项目要强化合同分析，及时进行工程结(决)算。



7、制定先进的、经济合理的施工方案，制定施工方案要以合同工期为依据，结合施工项目规模、性质、复杂程度、施工现场条件等因素综合考虑。可同时制定几个施工方案，相互比较，从中优选最合理、最经济的一个。

8、推行索赔制度。学会索赔方法，工程量变化、设计有误、加速施工、施工图变化、不利自然条件或非乙方原因引起的施工条件的变化和工期延误等进行合理索赔以规避风险。

9、进行工程保险。对工程项目进行工程一切险、第三方责任险及人生财产意外伤害保险，以减少风险影响。

第四节 事故应急预案

项目部根据安全施工的具体要求，制定了意外事故等紧急情况的应急预案，使灾害发生时能得到有效控制，降低人员伤害、财产损失和对环境造成的负面影响。

制定紧急处理措施包括：① 紧急处理机构与人员组成；② 与相关单位/部门或外部服务机构、政府主管部门、周围居民和公众等的联络与沟通；③ 应急准备与响应物资与设施的需求与提供；④ 紧急处理程序，包括紧急处理对象、负责人、方法与步骤、路线与地点、工具和设备等；⑤ 重要设施、记录等的保护方案；⑥ 紧急处理措施及善后处理工作；⑦ 后勤保障机构及其作用。

发生事故或紧急情况时，责任部门及相关人员应按紧急处理预案进行响应，以控制或尽可能减少伴随的伤害、损失和影响。组织做好事故或紧急情况的响应情况的详细记录，以便于评审紧急处理预案及相关措施的有效性。

事故应急预案和应急计划确立后，按计划组织施工项目经理部的全体人员进行有效的培训，从而具备完成其应急任务所需的知识和技能。经过有效的培训后，项目经理部人员每年还需演练一次，施工作业人员变动较大时增加演练次数。每次演练结束，及时作出总结，对存有一定差距的，在日后的工作中加以提高。

事故应急预案制定后报监理人和发包人备案后正式实施。具体的事故应急预案框图如下：



林刘
印晓



图 8—1 事故应急预案



林刘
印晓

附表一 施工总体计划表

注：每月按 30 天计算


年度		2026年						
月	份	2	3	4	5	6	7	
1. 施工准备								
2. 路基处理								
3. 路基填筑								
4. 涵洞								
5. 通道								
6. 防护及排水								
7. 路面基层								
(1) 底基层								
(2) 基层								
8. 路面铺装								
9. 路面标志标线								
10. 桥梁工程								
(1) 基础工程								
(2) 墩台工程								
(3) 梁体工程								
(4) 梁体安装								
(5) 桥面铺装及人行道								
11. 隧道								
12. 其他								



林刘
印晓

附表二 分项工程进度率计划（斜率图）

注：每月按 30 天计算

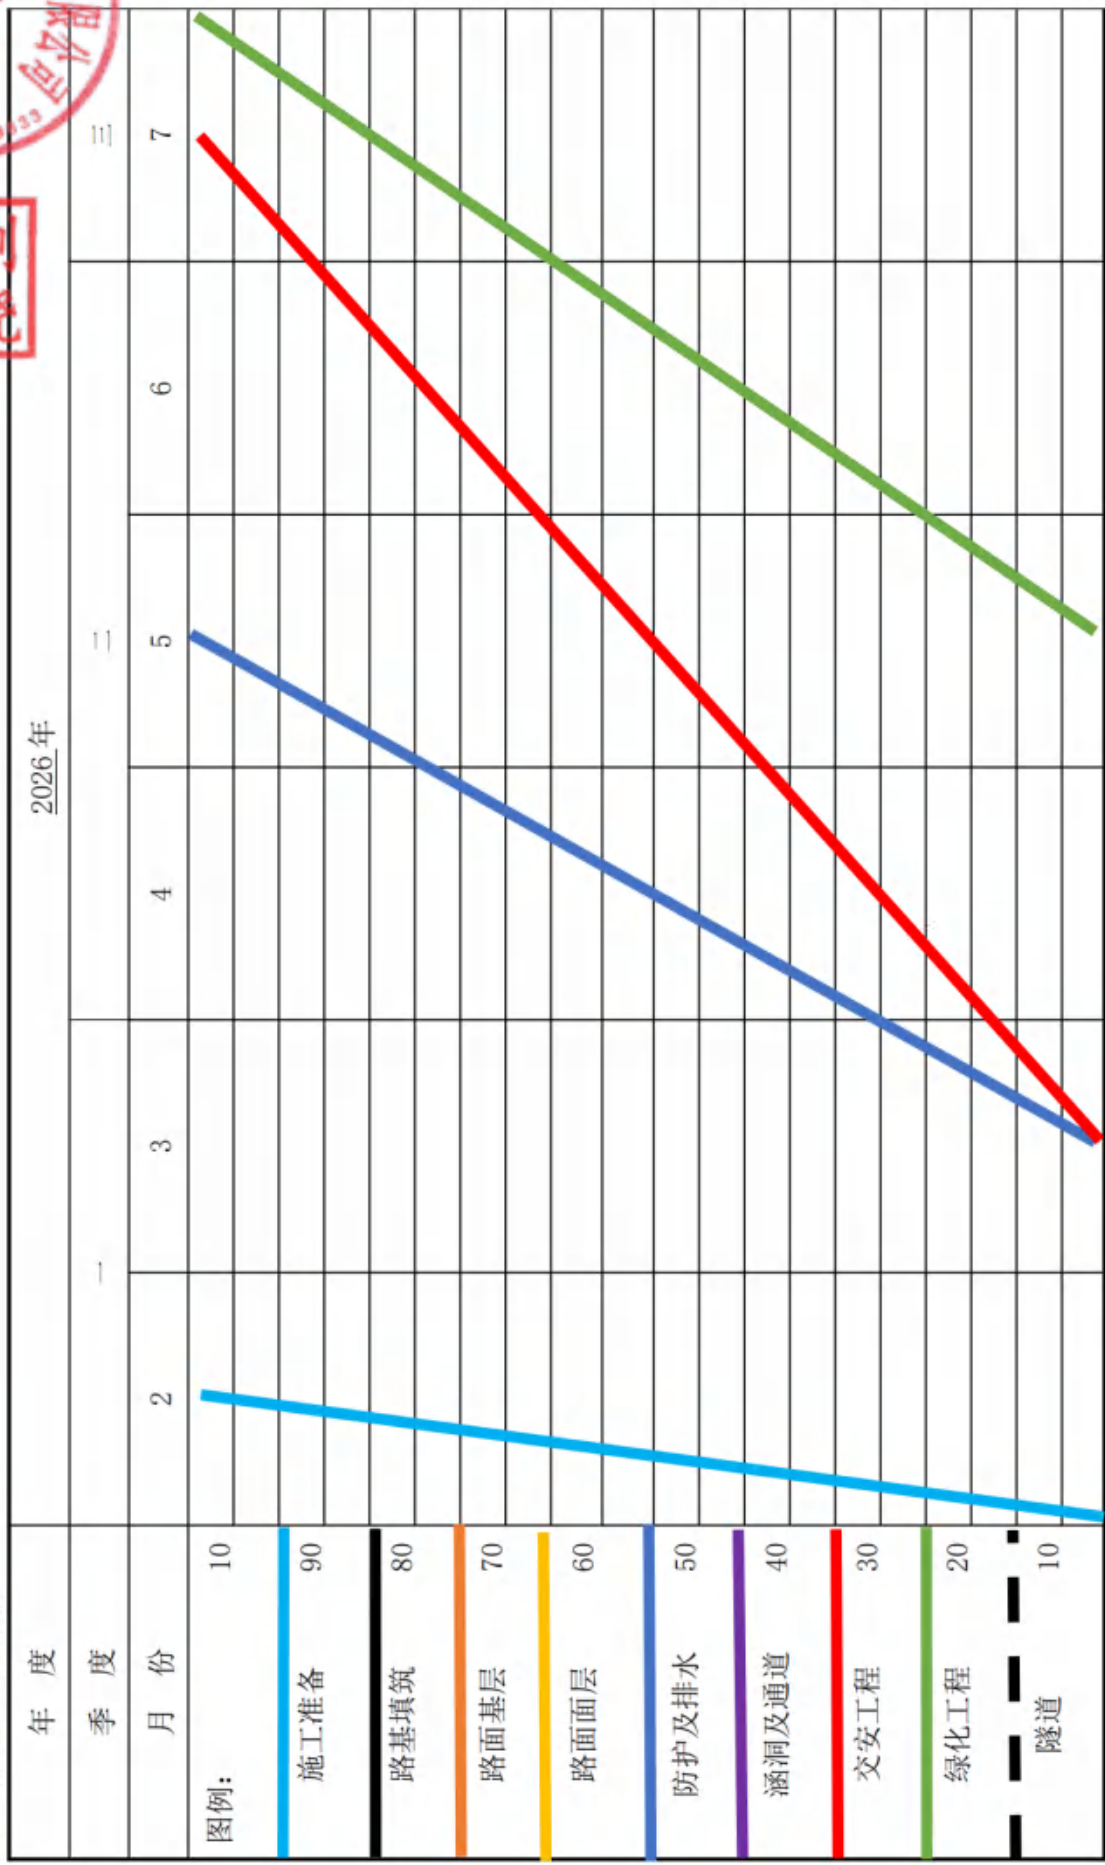




林刘
印晓

附表三 工程管理曲线

注：每月按 30 天计算

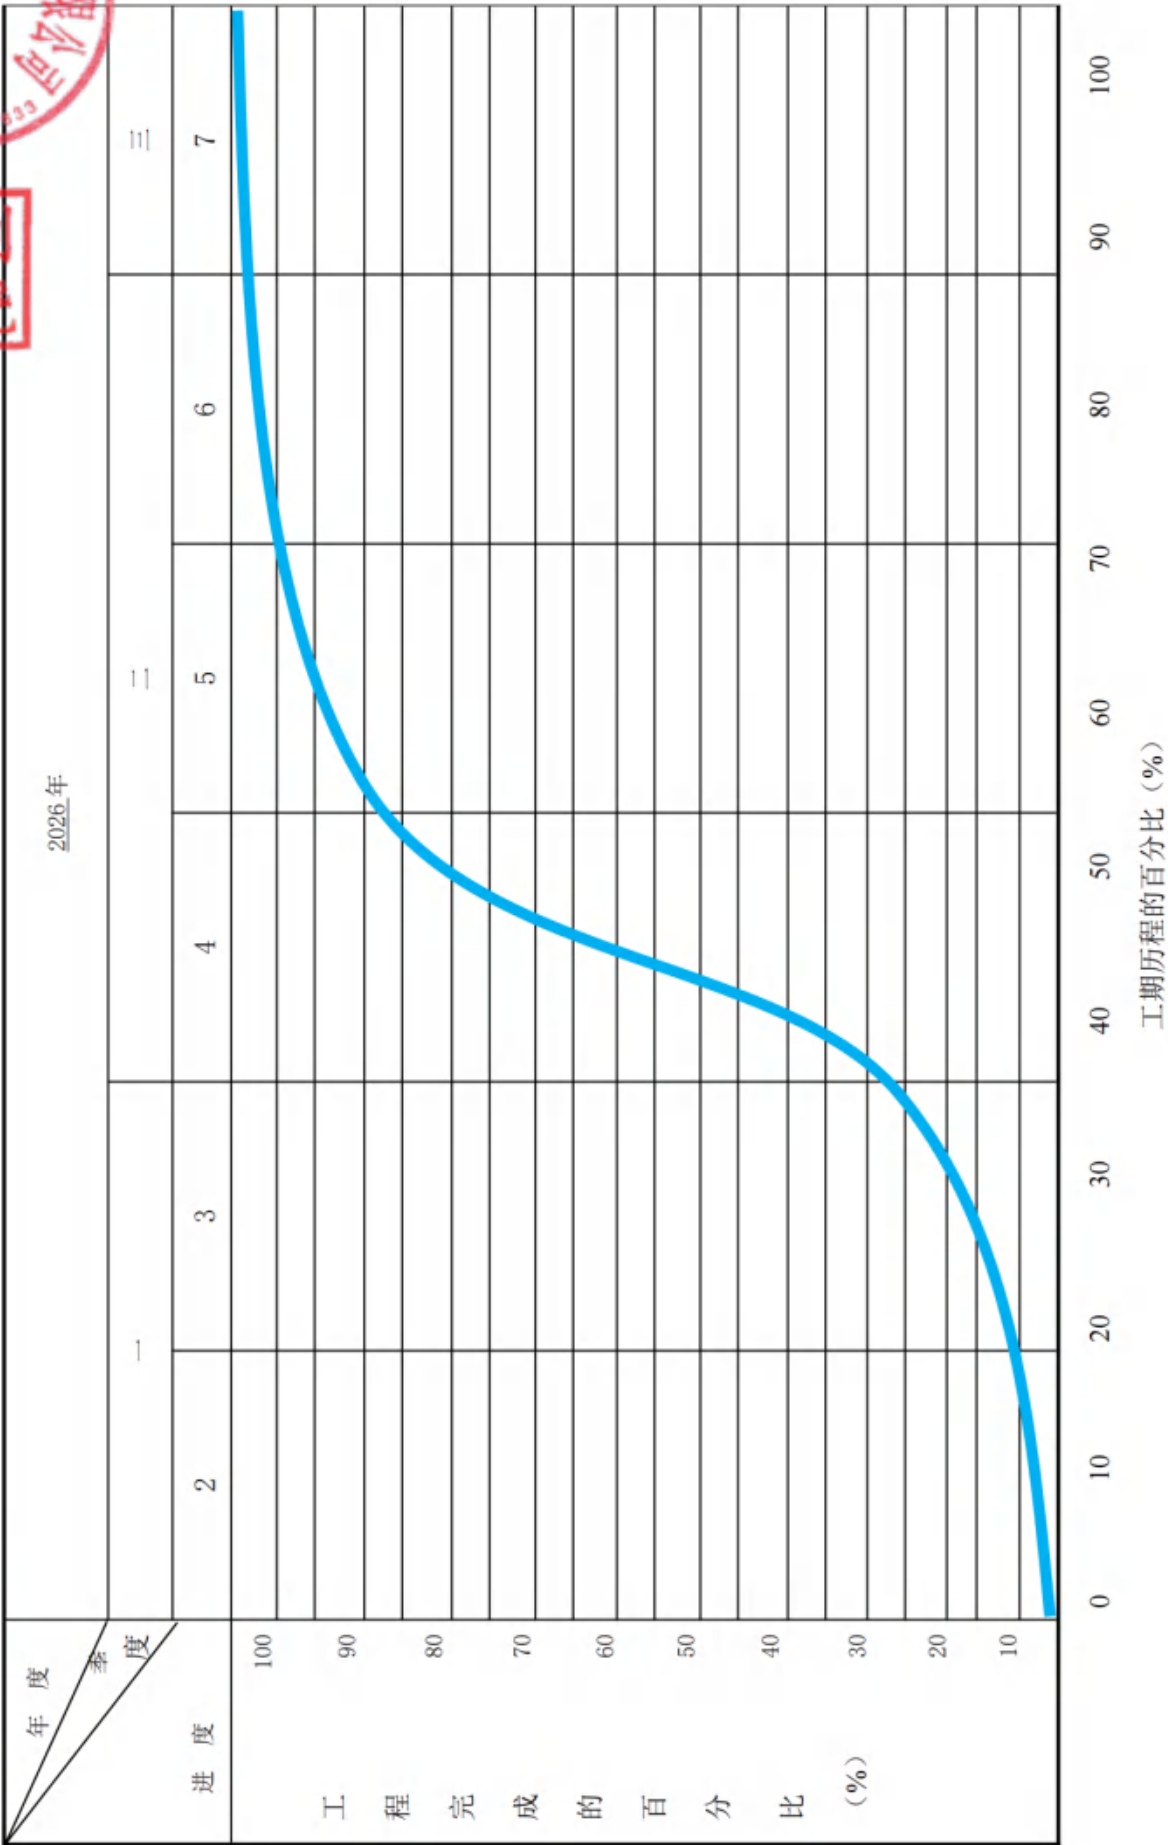



林刘
印晓

附表四 分项工程生产率和施工周期表


注：每月按 30 天计算

序号	工程项目	单位	数量	平均每生产单位规模(人, 各种机械_台)	平均每生产单位生产率 (数量, 每周)	每生产单位 平均施工时间(周)	生产单位总数 (个)
1	特殊路基处理	km	按图纸施工	18 人, 各种机械 9 台	根据施工现场实际配备	根据施工现场实际配备	1
2	路基填筑	km					
3	路基层	km					
4	路基层	km					
5	路基防护及排水	km					
6	涵洞	道					
7	通道	道					
8	桥梁基桩	根					
9	桥梁墩台	座					
10	梁体预制安装	片					
11	交安工程	km	按图纸施工	45 人, 各种机械 26 台	根据施工现场实际配备	根据施工现场实际配备	1
12	绿化工程	km	按图纸施工	39 人, 各种机械 18 台	根据施工现场实际配备	根据施工现场实际配备	1



林刘
印晓

附表五 施工总平面图

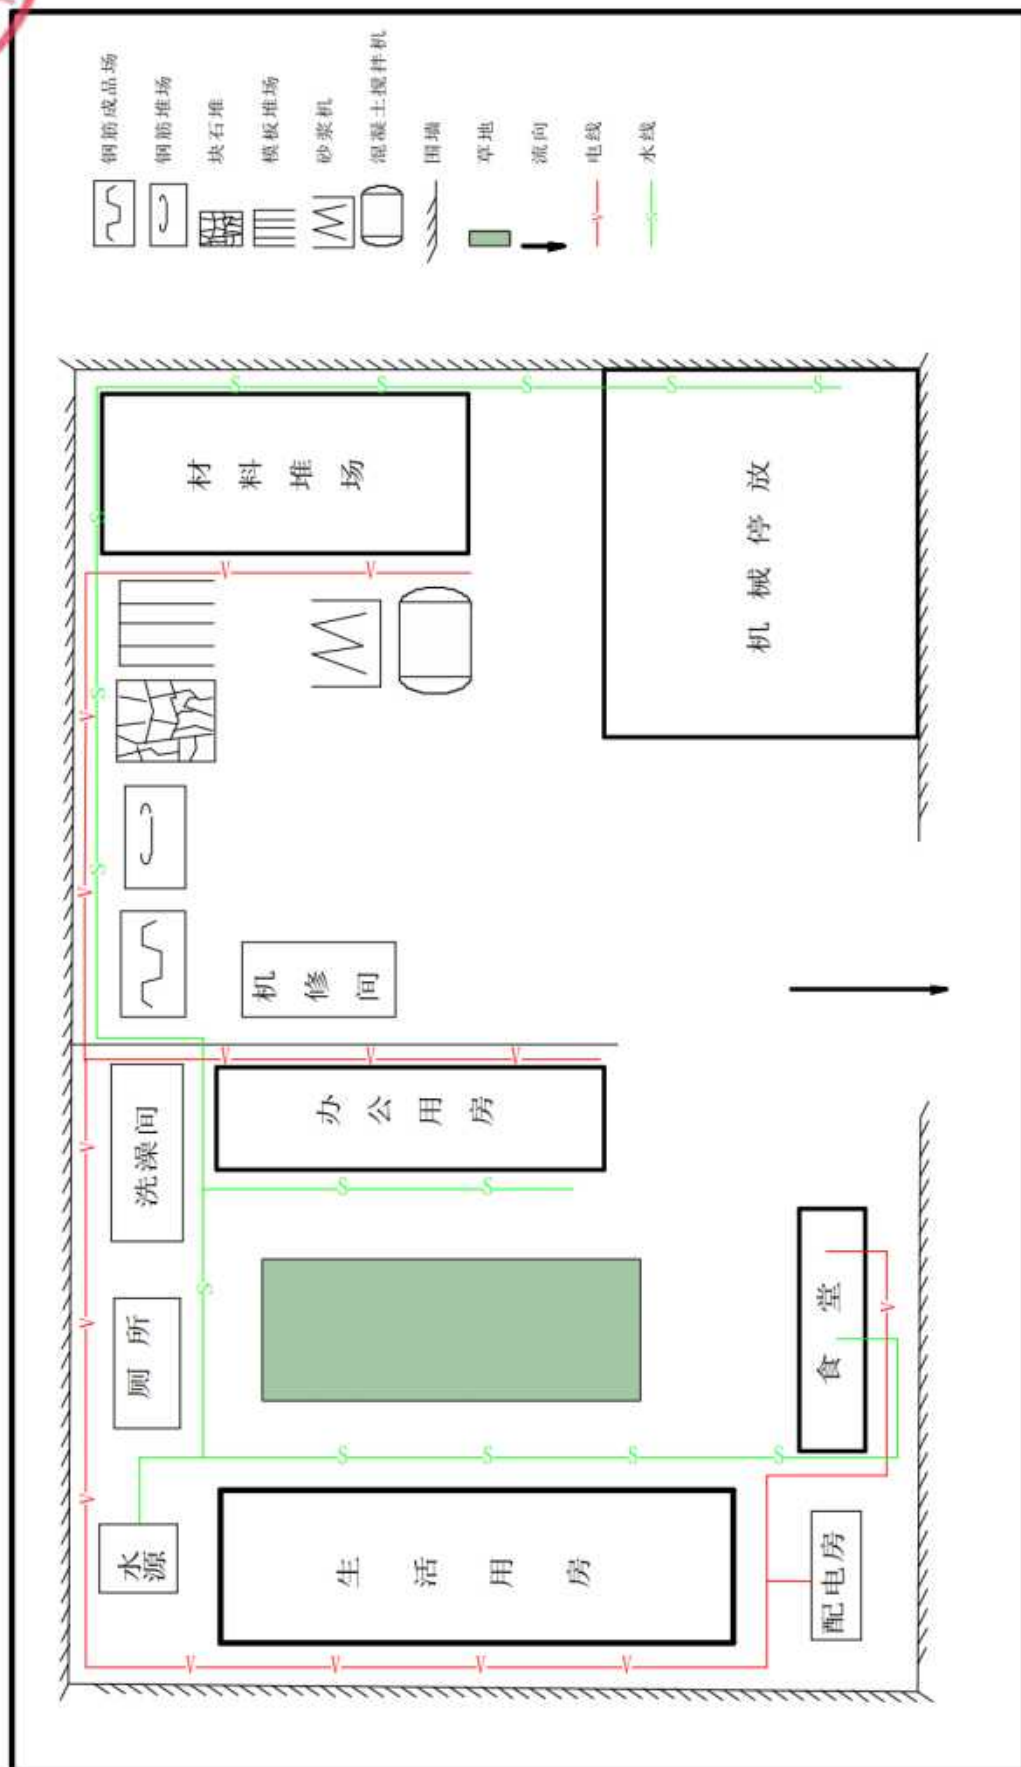




五、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

林刘
印晓

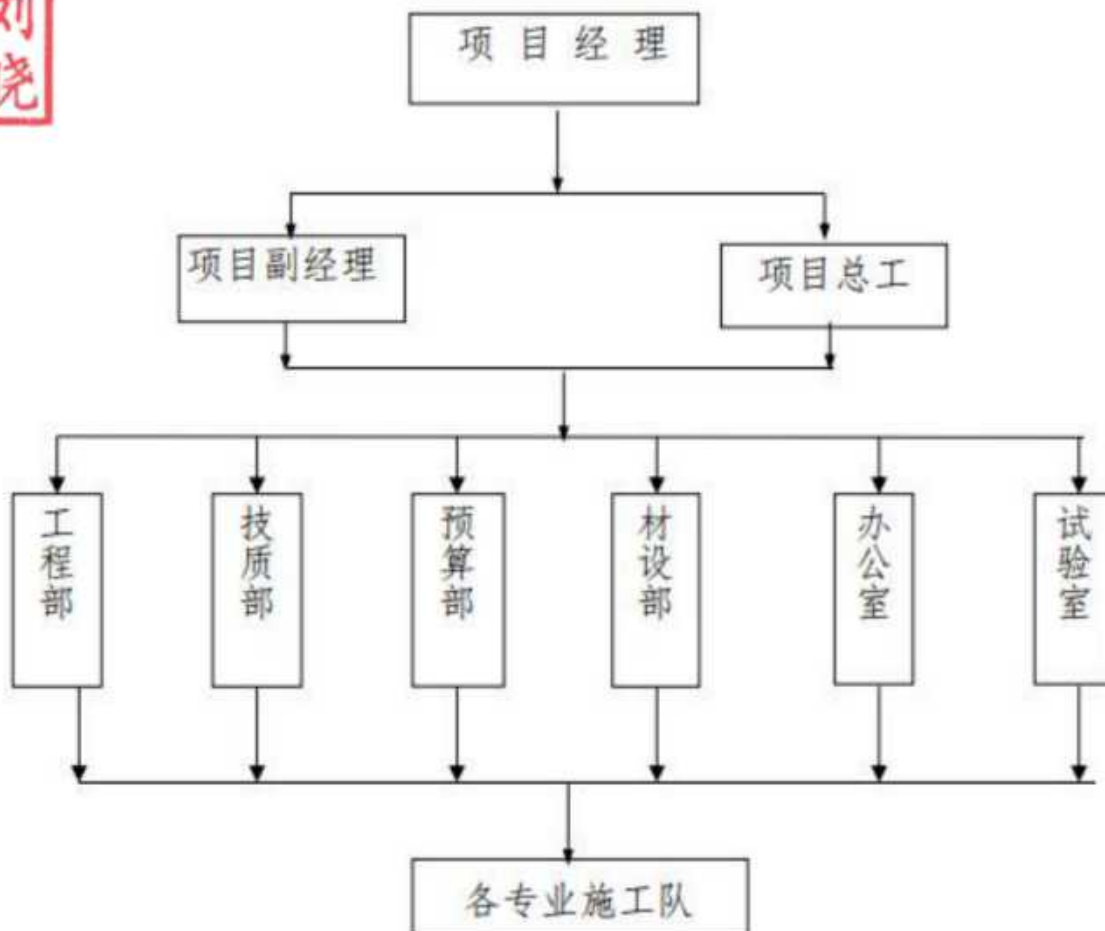

说明：

针对本项目的实际情况和工程特点，我司配置了一个满足项目管理要求的强有力的项目管理组织体系。我司决定抽调最精干、具有丰富工程经验的、组织实施过类似工程的管理人员担任项目经理，在项目实施过程中，采用项目经理负责制，有绝对权利可以调配本工程现场人力、物力、财力、合伙施工队和优先使用我司其他工程范畴的资源，项目部内管理人员职责明确，保证工程保质保量按时完成。



六、拟分包项目情况表

拟分包的工程项目	主要工程内容	预计造价（万元）	备 注
林刘印晓无	无	无	注：若无分包计划，则投标人应在本表填写“无”
拟分包工程造价合计（万元）		无	

- 注：
- 1. 若投标人中标须按本招标文件的约定执行。
 - 2. 本表填写的造价不属于投标报价的内容。
 - 3. 如投标人不具备拟分包工程所需的某专项工程相应资质或投标人如有分包计划，应符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.11 款规定，且按本表的要求填写。



七、资格审查资料



(一) 投标人基本情况表

(二) 投标人企业组织机构框图

(三) 近年财务状况表

(四) 近年完成的类似项目情况表

(四)-1 完成的类似项目情况汇总表

(四)-2 完成的类似项目情况表

(五) 投标人的信誉情况表

(六) 拟委任的项目经理和项目总工情况表

(六)-1 拟委任的项目经理和项目总工汇总表

(六)-2 拟委任的项目经理和项目总工资历表



七、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表



印晓投标人名称	江西省四通路桥建设集团有限公司					
注册地址	江西省新余市渝水区仙来东大道 347 号			邮政编码	338000	
联系方式	联系人	刘庆平		电 话		
	传 真	0790-6420803		电子邮件		
法定代表人	姓名	刘晓林	技术职称	高级工程师	电 话	0790-6420803
技术负责人	姓名	袁会军	技术职称	高级工程师	电 话	0790-6420803
营业执照号	913605001598709648			员工总人数：584 人		
企业资质等级	公路工程施工总承包壹级 公路路面工程专业承包壹级 公路路基工程专业承包壹级 施工劳务资质不分等级 桥梁工程专业承包贰级 市政公用工程施工总承包贰级 公路交通工程（公路安全设施） 专业承包贰级			其中	项目经理	33 人
注册资本	人民币伍亿壹仟万元整				高级职称人员	33 人
成立日期	1996 年 12 月 02 日				中级职称人员	66 人
基本账户开户银行	中国银行股份有限公司新余市渝水支行				初级职称人员	224 人
基本账户银行账号	202207469136				技工	235 人
经营范围	许可项目:建设工程施工,公路管理与养护,路基路面养护作业,建设工程设计,建设工程质量检测,建设工程勘察,道路货物运输(不含危险货物),城市公共交通,水泥生产,河道采砂,河道疏浚施工专业作业,房地产开发经营,旅游业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务,机械设备租赁,市政设施管理,园林绿化工程施工,水泥制品制造,机械设备销售,					



	以自有资金从事投资活动, 自有资金投资的资产管理服务, 建筑材料销售, 建筑用钢筋产品销售, 信息技术咨询服务, 创业投资(限投资未上市企业), 水资源管理, 水利相关咨询服务, 园区管理服务, 冶金专用设备销售, 化工产品销售(不含许可类化工产品), 针纺织品及原料销售, 针纺织品销售, 物业管理, 房地产经纪, 房地产咨询, 广告发布, 电动汽车充电基础设施运营, 产业用纺织制成品销售(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)
投标人关联企业情况	投标人应提供关联企业情况, 包括: (1) 投标人的所有股东名称及相应股权(出资额)比例: 如投标人为上市公司, 投标人应提供股权占公司股份总数___%以上的所有股东名称及相应股权比例; 新余市吉泰产业投资集团有限公司100%控股 (2) 投标人投资(控股)或管理的下属企业名称、持有股权(出资额)比例: 新余市国有资产经营有限责任公司 100%持股 新余路通沥青混凝土有限公司 100%持股 (3) 与投标人单位负责人(即法定代表人)为同一人的其他单位名称 无
备注	/

注:

1. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。
2. 上述信息如经调查核实未如实填写的, 按提供虚假材料对待。



林刘
印晓

证件编号 K22011323



营业执照

(副 本) 1-1

名称 江西省四通路桥建设集团有限公司
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 刘晓林
注册资本 伍亿壹仟万元整
成立日期 1996年12月02日
住所 江西省新余市渝水区仙来东大道347号

经营范围
许可项目：建设工程施工，公路管理与养护，路基路面养护作业，建设工程设计，建设工程质量检测，建设工程勘察，道路运输（不含危险货物），城市公共交通，水泥生产，河道采砂，河道疏浚施工专业作业，房地产开发经营，旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：工程管理服务，机械设备租赁，市政设施管理，园林绿化工程施工，水泥制品制造，机械设
备销售，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理
服务，建筑材料销售，建筑用钢筋产品销售，信息技术咨询
服务，创业投资（限投资未上市企业），水资源管理，水利相
关咨询服务，园区管理服务，冶金专用设备销售，化工产品销
售（不含许可类化工产品），针纺织品及原料销售，针纺织品
销售，物业管理，房地产经纪，房地产业咨询，广告发布，电动
汽车充电基础设施运营，产业用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关
2024年08月29日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告
国家市场监督管理总局监制



公司变更通知书

江西省四通路桥建设集团有限公司经我局办理变更登记，其注册号/统一社会信用代码为 913605001598709648，现将变更项目通知如下：

变更类别	变更前内容	变更后内容	核准日期
法定代表人变更	马林	刘晓林	2020-06-17
主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更)	姓名：孙小青,职务：监事 姓名：赖东庆,职务：董事 姓名：廖根宝,职务：监事 姓名：杨云晖,职务：董事 姓名：龙飞,职务：监事 姓名：马林,职务：董事长 姓名：马林,职务：经理	姓名：刘晓林,职务：董事长 姓名：孙小青,职务：董事 姓名：龙飞,职务：董事 姓名：邓志刚,职务：董事 姓名：桂志军,职务：监事会主席 姓名：龚军生,职务：监事 姓名：吴余忠,职务：监事 姓名：刘晓林,职务：经理 姓名：甘斌,职务：副经理 姓名：袁庆波,职务：副经理 姓名：简仕青,职务：副经理 姓名：袁会军,职务：副经理	2020-06-17

登记机关：新余市市场监督管理局

2020年06月17日





公司变更通知书

江西省四通路桥建设集团有限公司经我局办理变更登记，其注册号/统一社会信用代码为 913605001598709648，现将变更项目通知如下：

变更类别	变更前内容	变更后内容	核准日期
投资人(股权)变更	新余市发展投资集团有限公司	新余市吉泰产业投资集团有限公司	2024-07-03

登记机关：新余市市场监督管理局

2024年07月03日





公司变更通知书

江西省四通路桥建设集团有限公司经我局办理变更登记，其注册号/统一社会信用代码为 913605001598709648，现将变更项目通知如下：

变更类别	变更前内容	变更后内容	核准日期
经营范围变更	市政工程建设；企业投资；园林绿化；物业管理；资产运营；建筑材料销售；开发建设教育园区；文化旅游产业开发；城市公共基础设计建设、投资；培训咨询；机械、建材、化工产品（不含危险化学品）、冶金产品、纺织品、轻工产品销售；物业管理；水利国有资产的运营管理；对水利建设及基础设施投资、管理及相关服务；对水利水电工程、污水处理以及水利相关的土地资源综合利用开发等各类水利工程项目的投资建设、经营管理、设计咨询和中介服务；房地产开发、设计、施工、销售和中介服务；水泥预制构件制造；市政园林、土木建设、工程建设、亮化工程建设、交通基础设施建设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*	许可项目：建设工程施工，公路管理与养护，路基路面养护作业，建设工程设计，建设工程质量检测，建设工程勘察，道路货物运输（不含危险货物），城市公共交通，水泥生产，河道采砂，河道疏浚施工专业作业，房地产开发经营，旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务，机械设备租赁，市政设施管理，园林绿化工程施工，水泥制品制造，机械设备销售，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，建筑材料销售，建筑用钢筋产品销售，信息技术咨询服务，创业投资（限投资未上市企业），水资源管理，水利相关咨询服务，园区管理服务	2024-08-29



林刘
印晓

		，冶金专用设备销售 ，化工产品销售（不含 许可类化工产品），针 纺织品及原料销售，针 纺织品销售，物业管理 ，房地产经纪，房地产 咨询，广告发布，电动 汽车充电基础设施运营 ，产业用纺织制成品销 售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）	
--	--	---	--

登记机关：新余市市场监督管理局

2024年08月29日




建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称:江西省四通路桥建设集团有限公司

详细地址:新余市仙来东大道347号



法定代表人:刘晓林

经济性质:有限责任公司(国有控股)

证书编号:D136060268

有效期:2028年12月22日

资质类别及等级:

公路工程施工总承包壹级;
公路路面工程专业承包壹级;
公路路基工程专业承包壹级。



发证机关:



中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO.DF 00071124



全国建筑市场监管公共服务平台



建设单位	从业人员	建设项目
建设施工单位		

[illegible]

[返回首页](#)
[联系我们](#)
[网站地图](#)
[诚聘英才](#)
[政策法规](#)
[电子信箱](#)
[问题解答](#)
[网站功能](#)
[友情链接](#)

手机直拨
田田田田

江西省-新余市

统一社会信用代码	91360500158709648	企业法定代表人	刘树林
企业登记注册类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	企业注册地址	江西省新余市
企业经营地址	江西省新余市渝水区仙平东大道347号		

[illegible]

序号	监理单位	资质证书号	单位名称	资质证书有效期	资质证书号	资质证书有效期
1	建等业正非理限	D136060268	公路路面工程专业承包一级	2023-12-22	住房和城乡建设部	证书编号
2			公路路面工程专业承包一级	2023-12-22		
3			公路工程施工总承包一级	2023-12-22		
4			桥梁工程专业承包二级			
5		D236001369	公路交通工程（公路安全设施）工程专业承包二级	2024-06-28	江西省住房和城乡建设厅	证书编号
6			市政工程施工总承包二级			

智慧唯一体化平台

网站: www.163.com

0
5
10
15
20
25
30
35
40





建筑业企业资质证书

企业名称：江西省四通路桥建设集团有限公司

详细地址：江西省新余市渝水区仙来东大道347号

法定代表人：刘晓林

经济性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

证书编号：D236001369

有效期：2029年06月28日

资质类别及等级：

市政公用工程施工总承包贰级(2024/04/22)

公路交通工程(公路安全设施)专业承包贰级(2021/06/02)

桥梁工程专业承包贰级(2016/03/10)



证书信息通过支付宝搜索“赣服通”或
微信搜索“江西住建云个人服务平台”
小程序扫描二维码查询

发证机关：



2024年06月28日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

江西住建云平台查询网址：<http://zjy.jxjst.gov.cn/>



建筑业企业资质证书

企业名称：江西省四通路桥建设集团有限公司

详细地址：江西省新余市渝水区仙来东大道347号

法定代表人：刘晓林

经济性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

证书编号：D336122569

有效期：2029年05月30日

资质类别及等级：

施工劳务企业备案(2020/04/10)



证书信息通过支付宝搜索“赣服通”或
微信搜索“江西住建云个人服务平台”
小程序扫描二维码查询

发证机关：



2024年05月30日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

江西住建云平台查询网址：<http://zjy.jxjst.gov.cn/>



林刘
印晓



安全生产许可证

企业名称：江西省四通路桥建设集团有限公司

法定代表人：刘晓林

单位地址：江西省新余市渝水区仙来东大道347号

经济类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

许可范围：建筑施工

有效期：2023年04月17日至2026年04月17日

发证机关：江西省住房和城乡建设厅
发证日期：2023年04月17日





基本存款账户信息

账户名称：江西省四通路桥建设集团有限公司

账户号码：202207469136

开户银行：中国银行股份有限公司新余市渝水支行

法定代表人：
(单位负责人) 刘晓林

基本存款账户编号：J4260000041508



2020 年 06 月 23 日



林刘
印晓

http://nanchang.pbc.gov.cn/nanchang/132354/3061117/Andex.html

中国人民银行 南昌中心支行
THE PEOPLE'S BANK OF CHINA Nanchang Central Sub-branch

公告信息 工作动态 金融新闻 区域金融 政务公开 金融知识 综合专题

2019年7月18日 星期六 您的位置: 南昌中心支行 > 公告信息

中国人民银行南昌中心支行关于江西省取消企业银行账户许可的公告

文号: 金发〔2019〕11号 文章来源: 南昌中心支行 2019-07-18 10:47:25

[打印本页](#) [关闭窗口](#)

为贯彻落实2018年12月24日国务院常务会议精神，根据中国人民银行令〔2019〕第1号，《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）以及相关要求，中国人民银行南昌中心支行决定在江西省全面取消企业银行账户许可。现将有关事项公告如下：

一、自2019年7月22日起，江西省全面实施取消企业银行账户许可。中华人民共和国境内依法设立的企业法人、非法人企业、个体工商户（以下统称企业）在江西省辖内银行机构开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户，由核准制改为备案制，中国人民银行不再核发开户许可证。开户许可证不再作为企业办理其他事务的证明文件或依据。

二、企业申请开立基本存款账户、临时存款账户的，开户银行按规定完成开户审核后，即可为符合条件的企业办理开户手续。企业银行账户自开立之日即可办理资金收付业务。企业申请变更取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户名称、法定代表人或单位负责人的，应当交回原开户许可证。

三、根据国务院“放管服”改革有关“放管结合”精神，以及国务院常务会议有关强化银行账户管理职责的要求，中国人民银行在取消企业银行账户许可的同时，加强企业银行账户管理。其中，为防范不法分子冒名开户，保护企业合法权益，企业开立基本存款账户时，开户银行将采取面对面、视频等方式向企业法定代表人（单位负责人）核实企业开户意愿，并留存相关工作记录。请各银行机构积极引导企业法定代表人（单位负责人）予以配合。

四、取消企业银行账户许可后，企业申请开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户的，应当向开户银行提供基本存款账户编号。开户银行为企业开立基本存款账户后会告知企业基本存款账户编号。如遗忘基本存款账户编号，企业可按照开户银行规定申请查询。

特此公告。

中国人民银行南昌中心支行

2019年7月18日

[打印本页](#) [关闭窗口](#)

法律声明 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏

地址：江西省南昌市洪都大道 邮政编码：330008 电话（传真）：0791-86613095
银联卡、信用报告业务办理地址：南昌市红谷滩区（与民德路交叉路）12层 咨询电话：0791-86601180
登记CP备05073429号 网络备案：赣ICP备05000001 公安网安备 11010202000016号
网站主办单位：中国人民银行南昌中心支行 赣公网安备：36040202000016号

政府网站 找错



林刘
印晓

人无信不立 业无信不兴

全国公路建设市场监督管理系统

用户登录

从业人员

从企业

工作动态

政策法规

首页

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

江西省四通路桥建设集团有限公司

搜索

请输入名称： 请输入类型： 请选择： 请输入等级： 请选择： 请输入省份： 请选择省份： 请输入年份： 请选择年份：

序号	企业名称	法人代表	企业资质	备注
1	江西省四通路桥建设集团有限公司	刘晓林	桥梁工程 专业承包 贰级 公路路面工程 专业承包 壹级 公路工程施工总承包 壹级 公路路基工程 专业承包 壹级 市政公用工程 总承包 贰级 施工劳务企业 资质 其他 不分等级 公路交通工程-交通安全设施工程 专业承包 贰级 公路工程 其他 不分等级 公路工程 其他 不分等级 公路工程 其他 不分等级 公路工程 其他 不分等级	

相关链接

北京市
吉林省
福建省
广东省
云南省
新疆维吾尔自治区

天津市
黑龙江省
江西省
广西壮族自治区
西藏自治区
新疆生产建设兵团

河北省
上海市
山东省
海南省
陕西省

山西省
江苏省
河南省
重庆市
甘肃省

内蒙古自治区
浙江省
湖北省
四川省
青海省

辽宁省
安徽省
湖南省
贵州省
宁夏回族自治区



全国公路建设市场监督管理系统

Copyright © 2017-2027 中华人民共和国交通运输部



全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索



江西省四通路桥建设集团有限公司

企业信息 人员信息 业绩信息 资质证书 全国综合评价 企业自建的信用等级 企业变更记录 企业特殊历史记录

基本信息			
统一社会信用代码	913605001598709648	企业名称	江西省四通路桥建设集团有限公司
注册省份	江西省	注册城市	新余市
曾用名	新余市四通路桥建设有限责任公司、江西省四通路桥建设有限公司	注册资本(万元)	51000
企业类型	施工	企业性质	国有企业
营业执照注册日期	1996-12-02	成立日期	1996-12-02
法定代表人	刘晓林	法定代表人职称	高级工程师
企业负责人	刘晓林	企业负责人职称	高级工程师
技术负责人	黄会军	技术负责人职称	高级工程师
经营范围	许可项目:建设工程施工,公路管理与养护,路基路面养护作业,建设工程设计,建设工程质量检测,建设工程勘察,道路货物运输(不含危险货物),城市公共交通,水泥生产,河道采砂,河道疏浚工程专业承包,房地产开发经营,旅游业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务,机械设备租赁,市政设施管理,园林绿化工程施工,水泥制品制造,机械设备销售,以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,建筑材料销售,建筑用钢筋产品销售,信息技术咨询服务,创业投资(限非上市企业),水资源管理,水利相关咨询服务,园区管理服务,冶金专用设备销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),针纺织品及原料销售,针纺织品销售,物业管理,房地产经纪,房地产咨询,广告发布,电动汽车充电基础设施运营,产品用纺织制成品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		

举报

相关链接

北京市	天津市	河北省	山西省	内蒙古自治区	辽宁省
吉林省	黑龙江省	上海市	江苏省	浙江省	安徽省
福建省	江西省	山东省	河南省	湖北省	湖南省
广东省	广西壮族自治区	海南省	重庆市	四川省	贵州省
云南省	西藏自治区	陕西省	甘肃省	青海省	宁夏回族自治区
新疆维吾尔自治区	新疆生产建设兵团				



附件下载



联系我们



政府网站 找错

全国公路建设市场监督管理系统

Copyright © 2017-2027 中华人民共和国交通运输部



全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

林刘
印晓

江西四通路桥建设集团有限公司

基本信息 资质信息 人员信息 业绩信息 诚信记录 全国综合评价 企业在各地的信用等级 企业变更历史 企业转移历史记录

主项资质

资质名称:	公路工程施工总承包	资质承包类型:	总承包
资质等级:	壹级	证书编号:	D136000268
发证机关:	中华人民共和国住房和城乡建设部	发证日期:	2023-12-22
申报			

增项资质

序号	资质证书编号	资质名称	资质类型	资质等级	发证机关	发证日期	备注	申报
1	D236001369	桥梁工程	专业承包	贰级	江西省住房和城乡建设厅	2024-06-28		申报
2	D136000268	公路路面工程	专业承包	壹级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2023-12-22		申报
3	D136000268	公路路基工程	专业承包	壹级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2023-12-22		申报
4	D236001369	市政公用工程	总承包	贰级	江西省住房和城乡建设厅	2024-06-28		申报
5	D336122589	施工劳务企业资质	其他	不分等级	新余市住房和城乡建设局	2024-05-30		申报
6	D236001369	公路交通工程-交通安全设施工程	专业承包	贰级	江西省住房和城乡建设厅	2024-06-28		申报

其他资质

序号	资质证书编号	资质名称	资质类型	资质等级	发证机关	发证日期	备注	申报
1	赣—GY—913605001596709648	(路基路面养护申报)	公路工程	其他	不分等级	江西省交通运输厅	2023-07-06	申报
2	赣—GY—913605001596709648	(桥梁养护申报)	公路工程	其他	不分等级	江西省交通运输厅	2023-07-06	申报
3	赣—GY—913605001596709648	(隧道养护申报)	公路工程	其他	不分等级	江西省交通运输厅	2023-07-06	申报
4	赣—GY—913605001596709648	(交通安全设施养护)	公路工程	其他	不分等级	江西省交通运输厅	2023-07-06	申报

相关链接

北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省
吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省
福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省
广东省 广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省
云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区
新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团



附件下载



联系我们



政府网站
找钢

全国公路建设市场监督管理系统
Copyright © 2013-2027 中华人民共和国交通运输部



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信息填报 经营异常名录 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



15909...

林刘
印晓

江西省四通路桥建设集团有限公司

存续(在营、开业、在册)



统一社会信用代码: 913605001598709648
注册号:
法定代表人: 刘晓林
登记机关: 新余市市场监督管理局
成立日期: 1996年12月02日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 行政许可信息 行政处罚信息 列入经营异常名录信息 列入严重违法失信名单(黑名单)信息 公告信息

■ 营业执照信息

统一社会信用代码: 913605001598709648
企业名称: 江西省四通路桥建设集团有限公司
注册号:
法定代表人: 刘晓林
类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期: 1996年12月02日
注册资本: 51000.000000万人民币
核准日期: 2024年06月29日
登记机关: 新余市市场监督管理局
存续状态: 存续(在营、开业、在册)
住所: 江西省新余市渝水区仙来东大道347号
经营范围: 许可项目: 建设工程施工; 公路管理与养护; 公路路面养护作业; 建设工程设计; 建设工程质量检测; 建设工程勘察; 道路货物运输(不含危险货物); 城市公共交通; 水泥生产; 河道采砂; 河道疏浚施工专业作业; 房地产开发经营; 旅游业务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动); 具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 工程管理服务; 机械设备租赁; 市政设施管理; 园林绿化工程施工; 水泥制品制造; 机械设备销售; 以自有资金从事投资活动; 自有资金投资的资产管理服务; 建筑材料销售; 建筑用钢筋产品销售; 信息技术咨询服务; 创业投资(限投资未上市企业); 水资源管理; 水利相关咨询服务; 园区管理服务; 冶金专用设备销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 针纺织品及原料销售; 针纺织品销售; 物业管理; 房地产经纪; 房地产咨询; 广告发布; 电动汽车充电基础设施运营; 产业用纺织制成品销售(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)
提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照面额的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照面额公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zhaogk/fdzdkgm/dqzq/art/2023/art_9c57139da37a465c8955d42d130947b2.html

■ 营业期限信息

营业期限自: 2012年11月12日
营业期限至: 2062年11月11日

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	新余市吉泰产业投资集团有限公司	企业法人	企业法人营业执照	91360500561068937R	查看

共 1 页 1 条记录 共 1 页

■ 主要人员信息

董军生 监事	杜志军 总经理	袁庆波 副总经理	简仕青 监事会主席	杜志军 董事	吴余忠 监事	袁会军 副总经理	甘斌 副总经理
邓志刚 董事	孙小青 董事	刘晓林 董事长					

共计 11 条信息

■ 分支机构信息

江西省四通路桥建设集团有限公司资溪分公司 统一社会信用代码/注册号: 91360208MA399WCH 登记机关: 资溪县市场监督管理局	江西省四通路桥建设集团有限公司黎川分公司 统一社会信用代码/注册号: 91361130MADW3BMF 登记机关: 黎川县市场监督管理局	江西省四通路桥建设集团有限公司进贤分公司 统一社会信用代码/注册号: 91362344MA7N36LM 登记机关:
--	--	---

共计 3 条信息

■ “多证合一”信息公示

提示: 该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	营业执照名称	备注

暂无多证合一公示信息

共 0 页 0 条记录 共 0 页

■ 清算信息

暂无清算信息

■ 变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
----	------	-------	-------	------



关注



订阅



评价



返回



关注



订阅



评价



返回



关注



订阅



评价



返回



关注



订阅



评价



返回



变更信息

序号	变更项目	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	经营范围变更	市政工程建筑；公路建设、园林绿化；苗木繁育；房产开发；煤炭材料销售；开展建设工程监理；充... 查看详情	许可项目：建设工程设计、公路管理与养护、路基路面养护作业、建设工程设计、建设工程质量监理。 查看详情	2024年05月29日
2	分支机构备案	91361020MA79PWCMA3江西省通商控股集团有限公司南昌分公司9153... 查看详情	91361020MA79PWCMA3江西省通商控股集团有限公司南昌分公司9153... 查看详情	2024年05月13日
3	投资人(股权)变更	投资人：新余市宏源投资有限公司,出资额：51000万人民币,占100%,出资方式：... 查看详情	投资人：新余市宏源投资有限公司,出资额：51000万人民币,占100%,出资方式：货币... 查看详情	2024年7月3日
4	分支机构备案	91361020MA79PWCMA3江西省通商控股集团有限公司南昌分公司	91361020MA79PWCMA3江西省通商控股集团有限公司南昌分公司9153... 查看详情	2022年08月19日
5	章程备案	监事：廖永祥,姓名：刘国林,性别：男,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：7... 查看详情	监事：廖永祥,石永刚,性别：男,证件类型：中华人民共和国居民身份证,证件号码：7... 查看详情	2021年09月10日

共查询到 15 条记录 共 3 页

首页 上一页 1 2 3 下一页 末页

动产抵押登记信息

提示：根据《国务院关于实施动产和权利担保统一登记制度的决定》（国发〔2020〕18号）和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》（〔2020〕第23号），自2021年1月1日起，本系统信息不再更新，详细情况请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看（<http://www.zhongdengwang.org.cn>）。

序号	登记编号	登记日期	登记机关	抵押担保债权数额	详情
暂无动产抵押登记信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

股权出质登记信息

序号	登记编号	出质人	出质/质押号码	出质担保数额	质权人	出质/质押号码	股权出质登记日期	状态	公示日期	详情
----	------	-----	---------	--------	-----	---------	----------	----	------	----

变更信息

序号	变更项目	变更前内容	变更后内容	变更日期
6	分支机构备案		91361020MA79PWCMA3江西省通商控股集团有限公司南昌分公司	2020年08月10日
7	法定代表人变更	马林	刘国林	2020年6月17日
8	股东信息	姓名：孙小勇,性别：男,身份证号：赣东,职务：董事长,姓名：廖永祥,职务：监事,姓名：杨云... 查看详情	姓名：刘国林,职务：董事长,姓名：孙小勇,职务：董事长,姓名：王飞,职务：董事长,姓名：印晓... 查看详情	2020年6月17日
9	章程备案		章程备案	2018年5月7日
10	投资人(股权)变更	投资人：新余市宏源投资有限公司,出资额：51000万人民币,占100%,出资方式：货... 查看详情	投资人：新余市宏源投资有限公司,出资额：51000万人民币,占100%,出资方式：货... 查看详情	2017年1月25日

共查询到 15 条记录 共 3 页

首页 上一页 1 2 3 下一页 末页

动产抵押登记信息

提示：根据《国务院关于实施动产和权利担保统一登记制度的决定》（国发〔2020〕18号）和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》（〔2020〕第23号），自2021年1月1日起，本系统信息不再更新，详细情况请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看（<http://www.zhongdengwang.org.cn>）。

序号	登记编号	登记日期	登记机关	抵押担保债权数额	详情
暂无动产抵押登记信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

股权出质登记信息

序号	登记编号	出质人	出质/质押号码	出质担保数额	质权人	出质/质押号码	股权出质登记日期	状态	公示日期	详情
----	------	-----	---------	--------	-----	---------	----------	----	------	----



林刘
印晓

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
11	经营范围变更	市政工程建设; 企业投资; 路桥绿化; 物业管理; 资产管理; 路桥材料销售; 开发建设工程咨询; 文... 更多	许可项目: 建设工程施工; 公路管理与养护; 路基路面养护作业; 建设工程设计; 建设工程监理... 更多	2024年8月29日
12	分支机构设置	91361028MA399WCM3F江西四通路桥建设有限公司分公司9151... 更多	91361028MA399WCM3F江西四通路桥建设有限公司分公司9151... 更多	2024年8月13日
13	投资人(股权)变更	出资人: 新余市宜富投资集团有限公司, 出资额: 51000万元人民币, 占100%, 出资方式: ... 更多	出资人: 新余市宜富投资集团有限公司, 出资额: 51000万元, 占100%, 出资方式: 货币... 更多	2024年7月1日
14	法定代表人变更	91361028MA399WCM3F江西四通路桥建设有限公司分公司... 更多	91361028MA399WCM3F江西四通路桥建设有限公司分公司... 更多	2022年4月19日
15	董事备案	职务: 董事长, 姓名: 李晓林, 性别: 男, 证件类型: 中华人民共和国居民身份证, 证件号码: ... 更多	职务: 董事长, 姓名: 李志明, 性别: 男, 证件类型: 中华人民共和国居民身份证, 证件号码: ... 更多	2021年8月18日
16	分支机构设置	91361028MA399WCM3F江西四通路桥建设有限公司分公司... 更多	91361028MA399WCM3F江西四通路桥建设有限公司分公司... 更多	2020年8月18日
17	法定代表人变更	马林	刘晓林	2020年8月17日
18	其他变更	姓名: 孙小虎, 职务: 董事长, 姓名: 孙小虎, 职务: 董事长, 姓名: 孙小虎, 职务: 董事长... 更多	姓名: 孙小虎, 职务: 董事长, 姓名: 孙小虎, 职务: 董事长, 姓名: 孙小虎, 职务: 董事长... 更多	2020年4月17日
19	章程备案	章程备案	章程备案	2018年5月7日
20	投资人(股权)变更	出资人: 新余市宜富投资集团有限公司, 出资额: 31000万元人民币, 占100%, 出资方式: 货... 更多	出资人: 新余市宜富投资集团有限公司, 出资额: 31000万元人民币, 占100%, 出资方式: 货... 更多	2017年1月25日
21	注册资本(金)变更	31000万元	31000万元	2017年1月25日
22	其他变更	913605001306789648	913605001306789648	2016年5月23日
23	投资人(股权)变更	新余市宜富投资集团有限公司, 出资额25000万人, 货币, 占100.0%, 实缴出资额25000万... 更多	新余市宜富投资集团有限公司, 出资额31000万人, 货币, 占100.0%, 实缴出资额... 更多	2014年7月1日
24	注册资本变更	25000万人民币	31000万人民币	2014年7月1日
25	投资人(股权)变更	新余市宜富投资集团有限公司, 出资额25000万人, 货币, 占100.0%, 实缴出资额25000万... 更多	新余市宜富投资集团有限公司, 出资额25000万人, 货币, 占100.0%, 实缴出资额25000万... 更多	2014年4月22日

共 15 条记录 共 3 页

首页 上一页 1 2 3 下一页 末页

知识产权出质登记信息

提示: 根据《国务院关于实施知识产权质押融资试点的通知》(国发〔2020〕18号)和《中国人民银行 国家知识产权局公告》(〔2020〕第23号), 自2021年1月1日起, 本系统信息不再更新, 详细信息请登录中国人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看 (<http://www.zhongdengwang.org.cn>)。

序号	登记编号	登记日期	信息类型	权利质押期限	注销
暂无知识产权出质登记信息					
共 0 条记录 共 0 页					
首页 上一页 下一页 末页					

股权出质登记信息

序号	登记编号	出质人	证明/证件号	出质股权数额	质权人	证明/证件号	股权出质期限	状态	公示日期	注销
暂无股权出质登记信息										
共 0 条记录 共 0 页										
首页 上一页 下一页 末页										



关注



订阅



评论



返回顶部



关注



订阅



评论



返回顶部



■ 股权出质登记信息

序号	登记编号	出质人	证期/证种号	出质股权数	质权人	证期/证种号	股权出质设立登记日期	状态	公示日期	详情
----	------	-----	--------	-------	-----	--------	------------	----	------	----

暂无股权出质登记信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

■ 知识产权出质信息

序号	名称	申请号	申请日期	专利权人	详情
----	----	-----	------	------	----

暂无知识产权出质信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

■ 知识产权出质登记信息

序号	知识产权出质登记号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质押登记期限	状态	公示日期	详情
----	-----------	----	----	-------	-------	--------	----	------	----

暂无知识产权出质登记信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

■ 商标注册信息

暂无商标注册信息

■ 抽查检查结果信息

序号	检查实施机关	类型	日期	结果
----	--------	----	----	----

暂无抽查检查结果信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

■ 商标注册信息

暂无商标注册信息

■ 抽查检查结果信息

序号	检查实施机关	类型	日期	结果
----	--------	----	----	----

暂无抽查检查结果信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

■ 产品质量监督抽查结果信息

序号	结果发布时间	产品名称	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	主要不合格项目	中介机构
----	--------	------	------	---------	------	---------	------

暂无产品质量监督抽查结果信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

■ 认证监督抽查检查信息

序号	抽查年度	认证证书号	产品种类	产品名称(规格)	规格型号	抽查发现的不符合项目	认证机构名称	认证机构已采取的证书处理结果	证书撤销日期
----	------	-------	------	----------	------	------------	--------	----------------	--------

暂无认证监督抽查检查信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

■ 食品抽查检查信息

序号	样品名称	规格型号	生产日期/批号	任务来源	抽检结果
----	------	------	---------	------	------

暂无食品抽查检查信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

■ 食品抽查检查信息

序号	样品名称	规格型号	生产日期/批号	任务来源	抽检结果
----	------	------	---------	------	------

暂无食品抽查检查信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

■ 双随机抽查结果信息

★ 关注

📄 订购

💬 异议

🔍 返回

★ 关注

📄 订购

💬 异议

🔍 返回

★ 关注

📄 订购

💬 异议

🔍 返回

★ 关注

📄 订购

💬 异议



林刘
印晓

■ 双随机制办结率信息

序号	随办计划编号	随办计划名称	随办任务编号	随办任务名称	随办类型	随办机关	随办完成日期	随办结果
1	36000020231078	2023江西省市场监督管理局 关于大型企业年检公示收费 专项服务	360000202310241001	2023江西省 市场监管局社 大型企业年保 公示收费专项 服务	不定向	省市场监管局	2023-12-04	办结
2	36000020211008	2021江西银保监局 金融信用信息基础数据库 维护	360000202104211001	2021江西银保 监局金融信用 基础数据库维 护	不定向	江西省银保监 管理局	2021-06-10	办结
3	36000020191032	2019年第三次全省 企业信用信息公示系统 “双随机、一公开” 抽查计划	360000201910211001	2019年第三 次全省企业信 息公示系统“双 随机、一公开” 抽查任务（企 业户）	不定向	江西省市场监 管局	2019-12-20	办结

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页 < 上一页 1 下一页 > 末页

■ 司法协助信息

序号	被执行人	债权金额	执行法院	执行标的文号	案件状态	详情
暂无司法协助信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 1 下一页 > 末页

■ 人民法院判决申请强制执行信息

序号	申请执行	法院名称	判决书文号	申请执行	申请执行日期	申请执行金额	详情
暂无人民法院判决申请强制执行信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 1 下一页 > 末页

■ 协助冻结信息

序号	执行法院	协助执行通知书文号	被执行人姓名	被冻结人身份类型	冻结日期
暂无协助冻结信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 1 下一页 > 末页

■ 承诺不实施情况

序号	承诺不实施情况	核查时间	处理结果
暂无承诺不实施情况			

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 1 下一页 > 末页

■ 信贷信息

序号	信贷记录	日期	操作单位
暂无信贷信息			

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 1 下一页 > 末页

■ 名称转让信息

序号	转让主体	受让主体	转让日期	转让时间
暂无名称转让信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 1 下一页 > 末页

以下信息由该企业提供，如有不实请及时向我们反馈，否则将依法处理

■ 企业年报信息

序号	报告年份	公示日期	详情
1	2024年度报告	2025年4月10日	查看
2	2023年度报告	2024年5月8日	查看
3	2022年度报告	2023年4月7日	查看
4	2021年度报告	2022年3月25日	查看
5	2020年度报告	2021年4月26日	查看
6	2019年度报告	2020年4月26日	查看
7	2018年度报告	2019年6月13日	查看
8	2017年度报告	2018年5月26日	查看
9	2016年度报告	2017年3月27日	查看
10	2015年度报告	2016年5月20日	查看
11	2014年度报告	2015年5月18日	查看
12	2013年度报告	2015年5月18日	查看

■ 股东及出资信息



林刘
印晓

以下信息由该企业填报，企业对其真实性负责，合法合规类

股东信息

股东	认缴信息		实缴信息		
	认缴额(万元)	实缴额(万元)	认缴出资方式	认缴出资期限	实缴出资方式
新余市国投控股集团有限公司	51000.0	0.0	货币	51000.0	2017年1月23日

共 1 条记录 共 1 页

股权变更信息

序号	原股东	变更前持股比例	变更后持股比例	股权转让日期	公示日期
----	-----	---------	---------	--------	------

暂无股权变更信息

共 0 条记录 共 0 页

行政许可信息

序号	许可文号	许可内容	有效期	许可机关	许可内容	状态	详情
----	------	------	-----	------	------	----	----

暂无行政许可信息

共 0 条记录 共 0 页

知识产权登记信息

序号	知识产权编号	名称	种类	权利人名称	权利人名称	登记日期	状态	公示日期	详情
----	--------	----	----	-------	-------	------	----	------	----

行政处罚信息

序号	决定文号	违法行为	处罚内容	处罚机关	处罚决定日期	公示日期	备注
----	------	------	------	------	--------	------	----

暂无行政处罚信息

共 0 条记录 共 0 页

集团成员信息

序号	成员名称	统一社会信用代码	成员类型	母公司持股比例
----	------	----------	------	---------

暂无集团成员信息

共 0 条记录 共 0 页

执行标准自我声明

提示：根据《中华人民共和国标准化法》第二十七条规定，企业执行自行制定的企业标准的，还应当公开产品、服务的功能指标和产品的性能指标，请登陆企业标准信息公共服务平台 (www.qybz.org.cn) 完成注册备案！

序号	产品或服务	产品或服务分类	标准类型	标准编号	标准名称	编制日期
----	-------	---------	------	------	------	------

暂无执行标准信息自我声明

共 0 条记录 共 0 页

信用承诺信息

序号	信用承诺事项	信用承诺期限	信用承诺内容
----	--------	--------	--------

暂无信用承诺信息

共 0 条记录 共 0 页

信用承诺信息

序号	信用承诺事项	信用承诺期限	信用承诺内容
----	--------	--------	--------

暂无信用承诺信息

共 0 条记录 共 0 页

名称授权信息

序号	授权方	被授权方	授权名称	开始日期	授权期限	授权状态	变更日期
----	-----	------	------	------	------	------	------

暂无名称授权信息

共 0 条记录 共 0 页

- ★ 关注

📄 订购

💬 评论

👇 返回
- ★ 关注

📄 订购

💬 评论

👇 返回
- ★ 关注

📄 订购

💬 评论

👇 返回



林刘印晓

· 登记状态: 存续 (在营、开业、在册)

· 登记机关: 新余市市场监督管理局

· 住所: 江西省新余市渝水区仙来东大道347号

· 经营范围: 市政工程建设; 企业投资; 园林绿化; 物业管理; 资产运营; 建筑材料销售; 开发建设教育园区; 文化旅游产业开发; 城市公共基础设施投资; 咨询; 设计; 施工; 销售; 水利水电工程; 污水处理以及水利相关的土地资源综合利用开发等; 水利工程的投融资建设; 经营管理; 设计咨询和中介服务; 房地产开发; 设计; 施工; 销售; 物业管理; 水利国有资产的运营管理; 对水利建设及基础设施投资、管理及相关业务。

股东及出资详细信息

■ 股东信息

股东名称	新余市吉泰产业投资集团有限公司
认缴额 (万元)	51000
实缴额 (万元)	

■ 认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	51000	2012年11月12日

■ 实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
--------	-----------	--------

■ 主要人员信息


■ 分支机构信息

暂无分支机构信息



(二) 投标人企业组织机构框图

以框图方式表示。

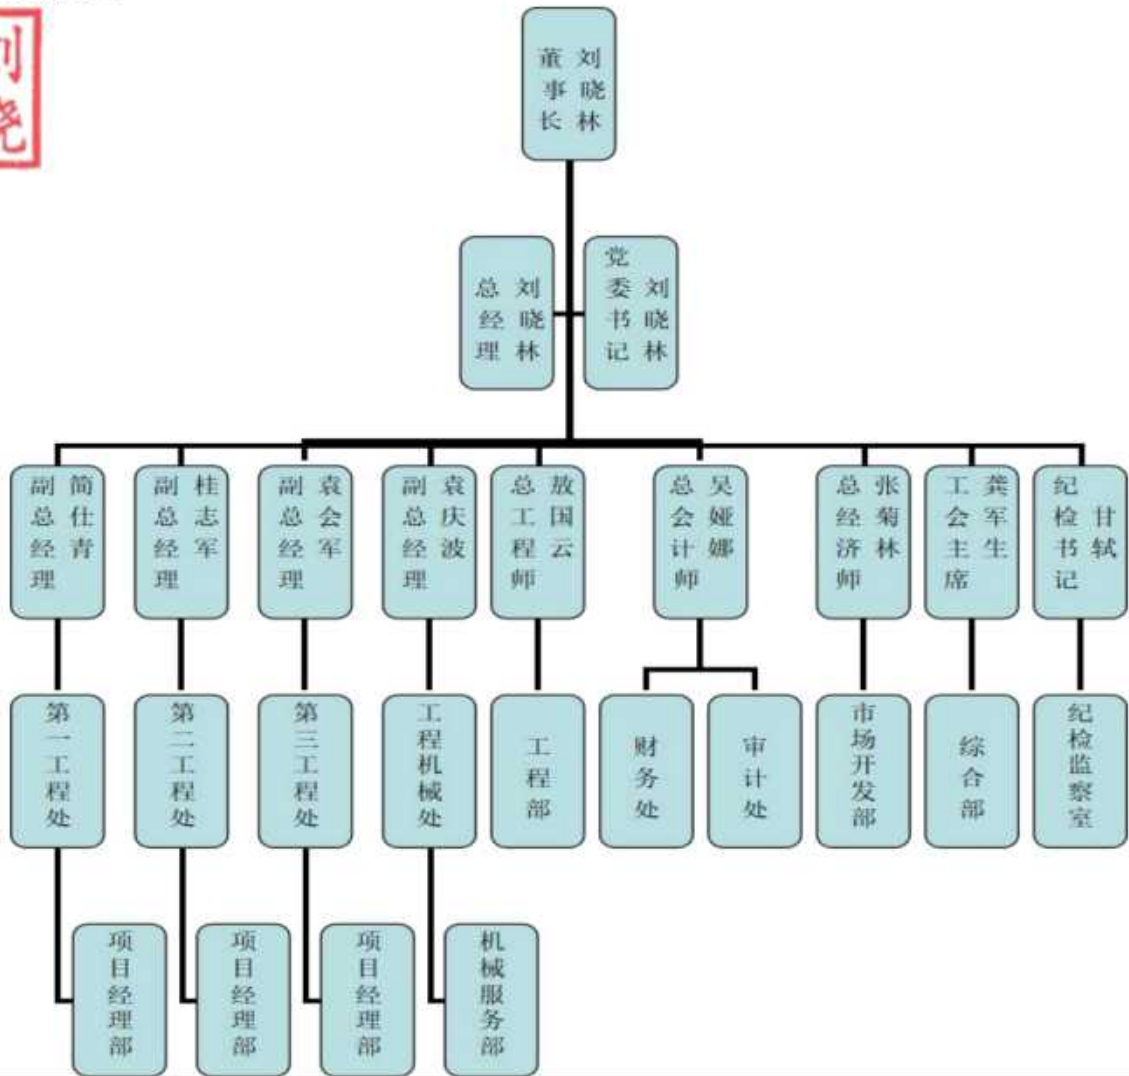

说明：

本公司具有一个团结、精干的领导班子，领导们具有较高技术职称和管理职称，并且具有丰富的企业管理经验和施工管理水平。目前公司上下齐心协力，经营发展蒸蒸日上，运行管理规范有序。



(三) 近年财务状况表

林刘 印晓 注册资本	项目或指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
	一、注册资本	万元	51000	51000	51000
	二、净资产	万元	103043	107491	150969
	三、总资产	万元	182345	196164	263624
	四、固定资产	万元	9065	7851	7822
	五、流动资产	万元	172278	186050	213529
	六、流动负债	万元	79302	88673	112654
	七、负债合计	万元	79302	88673	112654
	八、营业收入	万元	161742	159215	146793
	九、净利润	万元	4627	4546	3784
	十、现金流量净额	万元	5746	14473	23243
	十一、主要财务指标		/	/	/
	1.净资产收益率	%	4.59	4.23	2.51
	2.总资产报酬率	%	3.72	3.03	3.06
	3.主营业务利润率	%	6.48	6.88	6.54
	4.资产负债率	%	43.49	45.2	42.73
	5.流动比率	%	217.24	209.81	189.54
	6.速动比率	%	136.96	135.18	126.3496
	近三个年度的年平均营业总收入	万元	155916.67		
	最新年度具有的营运资金（流动资产-流动负债）	万元	100875		

注：

- 1. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。
- 2. 本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。



史記卷一百一十五

[illegible][illegible]



118



（四）近年完成的类似项目情况表

（四）-1 完成的类似项目情况汇总表



序号	项目名称	路面类型及里程（km）
1	宜宾经南溪至泸州快速通道（南溪段）项目	沥青混凝土路面 22.281
2	G205 五里亭至桃林公路改建工程施工（三期）	沥青混凝土路面 53.167
3		
4		
...		
业绩合计		沥青混凝土路面 75.448

注：

1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知前附表”第 3.5.3 项及附录 3 资格审查条件(业绩最低条件)的要求和 10.6 款的要求，在本表后附在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”（网址：<https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/>）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件或网页打印件，即包括“项目名称”、“标段类型”、“合同价”、“主要工程量”等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件或网页打印件。
3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
4. 业绩要求应符合投标人须知前附表 3.5.3、10.6 及 10.7 款的要求。

施工 从业单位名称或统一社会信用代码

這輸入位數理數的單位是秒

100

林印

江西省公路桥梁建设集团有限公司

[公司简介](#)
[联系我们](#)
[诚聘英才](#)
[服务网络](#)
[品牌信息](#)
[荣誉资质](#)
[新闻公告](#)
[产品目录](#)
[工程案例](#)
[设备展示](#)
[客户评价](#)
[网站地图](#)

2005 年 1 月 1 日 1 月 1 日 1 月 1 日

2000年 1 月 1 日 进入 注册

系统自动审核的业绩取自以下两种情况：1、企业在2010.10.1之前录入的业绩；2、企业在2010.10.1至2013.1.1之间录入的，且完工时间在5年之前的业绩。

000000

自總機在廣州：一週連續賣出。

6. 1000

序号	项目名称	标段名称	合同金额 (万元)	结算价 (万元)	开工日期	完工日期	录入日期	会签所在省份	信息来源	备注
1	2010年省道3534北碚至永川段续修(路面)改造工程	02	6054.1806	5218.8819	2015-10-02	2016-07-22	2017-08-07	安徽省	银行审核	
2	G205五里亭至柏林公路改建工程施工(二期)	/	5086.2066	5036.8050	2019-07-30	2021-10-29	2022-04-01	安徽省	银行审核	
3	G329(原G104)芜湖段一段公路改建工程(K30+000~K46+700)	01标段	13076.5549		2017-04-01	2019-09-30	2020-08-27	安徽省	银行审核	
4	G330线(原S110线)宁波市奉化至宁波市慈城公路改建工程	B标段	14480.4263		2014-06-28	2017-05-18	2018-02-09	四川省	银行审核	
5	K222什宜县至西永至硃石碛二处公路改建(K0+000~K12+780)路面工程	K222什宜县至西永至硃石碛二处公路改建(K0+000~K12+780)路面工程	5080.8016	5080.2009	2020-11-10	2023-11-17	2024-05-21	江西省	银行审核	
6	5300万东钱湖乡上里村平望美丽乡村公路(石料垫层面层)改建工程项目	/	3185.7500	3185.7500	2018-11-22	2018-10-18	2021-03-31	江西省	银行审核	
7	上犹县渡改桥(头大桥)	C标段	1114.5241		2015-08-16	2022-09-07	2024-12-27	福建省	银行审核	
8	民和县武定至积石道路改建工程	/	1840.3928	1806.7094	2017-06-20	2018-06-15	2022-04-08	安徽省	银行审核	
9	利用亚洲开发银行贷款江西省永修县基础设施综合改造项目(永修县至黄岗山公路项目)路面工程(K+000~K1A点)同标(K225关于至永修公路改建工程)		5080.4000	6219.9000	2017-02-10	2020-12-22	2021-03-31	江西省	银行审核	
10	南昌至宁都高速公路项目上至宁都段	L2	12806.2300	11666.8600	2014-01-03	2015-12-29	2017-09-14	江西省	银行审核	
11	岳塘332线(原岳塘345线)K47+485~K50+000米道路中间带(黄斑线)工程及K50+000~K57+700米道路重建工程	/	3126.8000	3311.7000	2017-11-30	2018-04-20	2021-09-09	福建省	银行审核	
12	宜黄至南溪至沙州快速通道(南溪段)项目	/	75483.9236	72010.5314	2020-04-08	2022-12-28	2023-03-08	四川省	银行审核	
13	铜东大道东段至永春至青神县中段(永春至江)工程段	/	23930.7222	23930.7222	2017-06-06	2019-01-11	2019-03-01	四川省	银行审核	
14	巴中市清江大桥建设工程施工一标段	一标段	7140.0489	7140.0489	2015-05-20	2016-11-17	2017-06-07	四川省	银行审核	
15	抚琴桂昌道台微改造设计施工总承包(EPC)项目	/	8000.0000	8787.7300	2020-05-06	2022-09-16	2023-05-05	江西省	银行审核	

2 下一頁 到第 頁 確定 共27條

附录三

北京市	天津市
吉林省	黑龙江省
福建省	江西省
广东省	广西壮族自治区
云南省	西藏自治区
新疆维吾尔自治区	新疆生产建设兵团

河北省	山西省
上海市	江苏省
山东省	河南省
海南省	重庆市
陕西省	甘肃省

内蒙古自治区
浙江省
湖北省
四川省
青海省

辽宁省
安徽省
湖南省
贵州省
宁夏回族自治区

 附件下载
  联系我们

政府网站
行情

全国公路建设市场监管管理系统
Copyright © 2017-2027 中华人民共和国国家交通运输部



企业名称	江西赣西通信建设集团有限公司	项目类型	公路
工程名称	资兴经耒阳至永州快速通道（新建段）项目	估算价（万元）	76483.9236
合同价（万元）	76483.9236	技术等级	一级公路
开工日期	2020-04-28	合同段名称	1
竣工日期		完工日期	2022-12-28
合同段开始桩号	K0+000	建设状态	招标已建
质量评定情况	合格	合同段结束桩号	K22+281
项目代码	G353	所在省份	四川

[illegible]

A. 明證的證據

序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	刘树林	项目校理	2021-09-16-2022-12-26
2	钟源辉	项目总工	2021-09-16-2022-12-26
3	周小兰	项目副经理	2020-01-02-2022-12-26
4	舒继翔	项目副经理	2020-01-02-2022-12-26
5	胡小鹏	项目副总工	2020-01-02-2022-12-26
6	黄龙	项目副总工	2020-01-02-2022-12-26
7	邵凡	工程部门负责人	2020-01-02-2022-12-26
8	占磊	质检负责人	2020-01-02-2022-12-26
9	王娟	技术员	2020-01-02-2022-12-26
10	徐浩辉	安全负责人	2020-01-02-2022-12-26





林刘
印晓

企业名称	江西省四通路桥建设集团有限公司			
工程名称	G205五里亭至桃林公路改建工程施工（三期）			
合同价（万元）	5686.2066	项目类型	其他工程	
技术等级	二级公路	结算价（万元）	5636.9850	
开工日期	2019-07-30	合同段名称	/	
竣工日期		交工日期	2021-10-29	
合同段开始桩号	K1619+500	建设状态	总包已建	
质量评定情况	合格	合同段结束桩号	K1672+800	
项目代码		所在省份	安徽省	
主要工程量	本合同段的起点终点起点为K1619+500（黄山学院），终点为K1672+800，另在陶源村、江田村、涸田村设置连接线，连接线共长9.895km，路线全长53.167公里。设计速度60公里/小时，采用双向双车道，路基宽8.5-12米，路面宽7.0-9.0米。主要工程量：路基土石方92645立方米，路基防护挡墙24156立方米，路基排水边沟2788立方米，GPS2主动防护网440平方米，挂网客土喷播防护边坡16450平方米，水泥稳定碎石基层66901平方米，透层、封层、粘层沥青135299平方米，细粒式沥青混凝土73683平方米，中粒式沥青混凝土59242平方米，水泥混凝土面板1795立方米，圆管涵59米，盖板涵51米，波形护栏18172米，交通标志348套，交通标线20440平方米。			

人员履约信息

序号	姓名	担任职务或专业负责人	任职日期
1	敖国云	项目经理	2019-07-30-2021-10-29
2	孙小青	项目总工	2020-12-23-2021-10-29





(四) -2 完成的类似项目情况表

序号	1
项目名称	宜宾经南溪至泸州快速通道（南溪段）项目
项目所在地	四川省
发包人名称	四川宜宾龙投发展集团有限公司
发包人地址	四川省宜宾市南溪区公共资源交易中心大楼6F
发包人电话	13708297700
合同价格	75493.9236万元
开工日期	2020-04-08
交工（或一次性竣工）日期	2022-12-28
承担的工作	路基工程、沥青混凝土路面工程、桥涵工程、交安工程、绿化及其他工程
工程质量评分（或等级）	合格
项目经理	刘晓林
项目总工	钟海辉
总监理工程师及电话	周孝刚/028-65259056
项目描述	本项目全长：22.281Km，公路等级为：一级公路，路面类型为：沥青混凝土路面，设计速度为60Km/h，一般路段路基宽度为23m，双向4车道，桥涵设计荷载等级为公路-I级。本合同段主要工程量：1.路基工程：路基挖土石方272万m³，路基填方302万m³，特殊路基处理碎石桩约9.6万m³，排水工程：边沟37Km，截水沟 2753 m³；急流槽 333 m³。坡面圬工防护：护脚、踏步 2000m³；边坡防护菱形骨架、拱形骨架3万m³；砼挡土墙：4.2万m³，浆砌片石+预制块排水沟21.1Km；2.路面工程：级配碎石垫层46.6万平方，水泥稳定碎石基层44万m²，沥青混凝土面层43.6万m²；3.桥涵工程：钢筋砼盖板涵2418.92米/45道，框架涵 64 米/1道，桥梁4座全长651米（其中杨家湾大桥长367米，工程造价2700万元，上部结构为4×30+4×30+4×30m预应力砼T梁结构，下部结构采用盖梁柱式墩，桩基础；阜鸣中学大桥长88m，工程造价867万元，上部结构为2×40m预应力砼T梁结构，下部结构采用盖梁柱式墩，桩基础；铁六田中桥长99m，工程造价884万元，上部结构为3×



备注

30m简支T梁结构，下部结构采用盖梁柱式墩，桩基础，龙塘坝中桥长97m，工程造价814万元，上部结构为3×30m简支T梁结构，下部结构采用盖梁柱式墩，桩基础。）；4. 交安工程：波形护栏22.281Km，红绿灯5套，标线3万m²，各类标志牌116套。5. 绿化及其他工程：栽植香樟0.71万株，小叶女贞球2.1万株，小琴丝竹0.5万丛，撒播种草15万平方，挂网植草30万平方，公路平面交叉28处。

一级公路施工项目

注：

1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

[illegible]

序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	刘瑞林	项目经理	2021-09-18-2022-12-28
2	钟海辉	项目总工	2021-09-18-2022-12-28
3	周小兰	项目副经理	2020-01-02-2022-12-28
4	舒俊翔	项目副经理	2020-01-02-2022-12-28
5	胡小勇	项目副总工	2020-01-02-2022-12-28
6	熊龙	项目副总工	2020-01-02-2022-12-28
7	伍凡	工程部门负责人	2020-01-02-2022-12-28
8	占晨	质检负责人	2020-01-02-2022-12-28
9	王娟	技术员	2020-01-02-2022-12-28
10	廖浩辉	安全负责人	2020-01-02-2022-12-28



(四) -2 完成的类似项目情况表

序号	2
项目名称	G205 五里亭至桃林公路改建工程施工（三期）
项目所在地	安徽省
发包人名称	休宁县交通运输局
发包人地址	安徽省黄山市休宁县海阳镇政务新区交通综合大楼 9 楼
发包人电话	0559-7533965
合同价格	5686.2066 万元
开工日期	2019-07-30
交工（或一次性竣工）日期	2021-10-29
承担的工作	路基工程、排水工程、沥青混凝土路面工程、涵洞工程、交通安全设施工程（含有标志、标线、护栏等工程）
工程质量评分（或等级）	合格
项目经理	敖国云
项目总工	孙小青
总监理工程师及电话	段宗国、0551-65590500
项目描述	本合同段的起点终点:起点为 K1619+500（黄山学院），终点为 K1672+800，另在璜源村、江田村、浯田村设置连接线，连接线共长 9.895km，路线全长 53.167 公里。设计速度 60 公里/小时，采用对向双车道，路基宽 8.5-12 米，路面度 7.0-9.0 米。主要工程量：路基土石方 92645 立方米，路基防护挡墙 24156 立方米，路基排水边沟 2788 立方米，GPS2 主动防护网 6440 平方米，挂网客土喷播防护边坡 16450 平方米，水泥稳定碎石基层 66901 平方米，透层、封层、粘层沥青 135299 平方米，细粒式沥青混凝土 73653 平方米，中粒式沥青混凝土 59242 平方米，水泥混凝土面板 1795 立方米，圆管涵 59 米，盖板涵 51 米，波形护栏 18172 米，交通标志 348 套，交通标线 20440 平方米。
备注	二级公路施工项目

注：

1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。



林刘
印晓

企业名称	江西省四通路桥建设集团有限公司			
工程名称	G205五里亭至桃林公路改建工程施工（三期）			
合同价（万元）	5686.2066	项目类型	其他工程	
技术等级	二级公路	结算价（万元）	5636.9850	
开工日期	2019-07-30	合同段名称	/	
竣工日期		交工日期	2021-10-29	
合同段开始桩号	K1619+500	建设状态	总包已建	
质量评定情况	合格	合同段结束桩号	K1672+800	
项目代码		所在省份	安徽省	
主要工程量	本合同段的起点终点起点为K1619+500（黄山学院），终点为K1672+800，另在陶源村、江田村、涸田村设置连接线，连接线共长9.895km，路线全长53.167公里。设计速度60公里/小时，采用双向双车道，路基宽8.5-12米，路面宽7.0-9.0米。主要工程量：路基土方92645立方米，路基防护挡墙24156立方米，路基排水边沟2788立方米，GPS2主动防护网440平方米，挂网客土喷播防护边坡16450平方米，水泥稳定碎石基层66901平方米，透层、封层、粘层沥青135299平方米，细粒式沥青混凝土73683平方米，中粒式沥青混凝土59242平方米，水泥混凝土面板1795立方米，圆管涵59米，盖板涵51米，波形护栏18172米，交通标志348套，交通标线20440平方米。			

人员履约信息

序号	姓名	担任职务或专业负责人	任职日期
1	敖国云	项目经理	2019-07-30-2021-10-29
2	孙小青	项目总工	2020-12-23-2021-10-29





(四)-2 完成的类似项目情况汇总表

序号	项目名称	路基桥涵里程 (km)	路面类型及里程(km)	大桥(座)	特大桥(座)	长隧道(座)	特长隧道(座)	...	备注
1	宜黄经南溪至泸州快速通道（南溪段）项目	22.281	沥青混凝土路面 22.281	1	/	/	/	/	/
2	G205 五里亭至桃林公路改建工程施工（三期）	53.167	沥青混凝土路面 53.167	/	/	/	/	/	/
3									
4									
5									
6									
7									
...									
业绩合计		75.448	沥青混凝土路面 75.448	1	/	/	/	/	/

注：业绩要求应符合投标人须知前附表 3.5.3、10.6 及 10.7 款的要求。



(五) 投标人的信誉情况表

项 目	投标人情况说明
林刘 (1) 在最新年度广东省公路工程从业单位(施工单位)信用评价(含无最新年度而上一年度有信用评价)中,信用等级被评为 D 级;初次进入广东省的投标人,在最新年度的全国公路从业单位(施工单位)信用评价结果中被评为 D 级;	我司在最新年度广东省公路工程从业单位(施工单位)信用评价(含无最新年度而上一年度有信用评价)中,信用等级没有被评为 D 级;我司不是初次进入广东省的投标人,在最新年度的全国公路从业单位(施工单位)信用评价结果中没有被评为 D 级;
(2) 被肇庆市交通运输局通报且取消相应投标资格(处于有效期内)。	我司没有被肇庆市交通运输局通报且取消相应投标资格(处于有效期内)。
(3) 被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内;	我司没有被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内;
(4) 被责令停业,暂扣或吊销执照,或吊销资质证书;	我司没有被责令停业,暂扣或吊销执照,或吊销资质证书;
(5) 进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;	我司没有进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(6) 在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单;	我司在国家企业信用信息公示系统中没有被列入严重违法失信企业名单;
(7) 在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单;	我司在“信用中国”网站中没有被列入失信被执行人名单;
(8) 投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理、项目总工在近三年内有行贿犯罪行为的(以投标人投标函中的承诺为准);	我司及我司法定代表人、我司拟委任的项目经理、项目总工在近三年内不曾有行贿犯罪行为(以投标人投标函中的承诺为准);
(9) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。	我司不存在法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
(1) 被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内; (2) 被责令停业,暂扣或吊销执照,或吊销资质证书; (3) 进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形; (4) 在“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单; (5) 在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单; (6) 投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理(含备选,如有)、项目总工(含备选,如有)在近三年内有行贿犯罪行为的(以投标人投标函中的承诺为准); (7) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。	(1) 我司没有被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内; (2) 我司没有被责令停业,暂扣或吊销执照,或吊销资质证书; (3) 我司没有进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形; (4) 我司在“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/)中没有被列入严重违法失信企业名单; (5) 我司在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中没有被列入失信被执行人名单; (6) 我司及我司法定代表人、我司拟委任的项目经理(含备选,如有)、项目总工(含备选,如有)在近三年内不曾有行贿犯罪行为(以投标人投标函中的承诺为准); (7) 我司不存在法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
投标人须知正文 第 1.4.4 项中(1)目中的“招标项目所在地”指“广东省”。	符合



投标人须知正文第 1.4.4 项修改为：

(1) 被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

(2) 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

(3) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(4) 在国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>) 中被列入严重违法失信企业名单；

(5) 在“中国执行信息公开网”网站 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 中被列入失信被执行人名单；

(6) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

我司没有被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

我司没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

我司没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

我司在国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>) 中没有被列入严重违法失信企业名单；

我司在“中国执行信息公开网”网站 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 中没有被列入失信被执行人名单；

我司不存在法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

第 1.4.4 项中 (6) 目内容细化如下：

投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理、项目总工在近三年内有行贿犯罪行为的（以投标人在投标函中的的承诺为准，无需提供证明材料）。

我司及我司法定代表人、我司拟委任的项目经理、项目总工在近三年内不曾有行贿犯罪行为（以投标人在投标函中的的承诺为准，无需提供证明材料）。

注：

1. 投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 4 和“投标人须知”正文第 1.4.4 项规定，逐条说明其信誉情况。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。



全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

林刘
印晓

江西省四通路桥建设集团有限公司

基本信息 资质信息 人员信息 业绩信息 诚信记录 全国综合评价 企业在各地的信用评级 企业变更历史 企业特殊历史记录

评价年度: 请选择

企业信用等级

序号	企业类型	评价年份	等级	得分	备注
1	施工	2023	AA	97.3307	
2	施工	2022	AA	97.208	
3	施工	2021	AA	97.49	
4	施工	2020	A	92.25	
5	施工	2019	A	91	
6	施工	2018	A	87.51	
7	施工	2017	A	89.15	
8	施工	2016	A	88.93	
9	施工	2015	A	90.58	
10	施工	2014	A	93	
11	施工	2012	C	64	
12	施工	2011	B	77.5	
13	施工	2010	AA	100	

相关链接

北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省
吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省
福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省
广东省 广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省
云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区
新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团

附件下载

联系我们

政府网站
找错

全国公路建设市场监督管理系统
Copyright © 2017-2021 中华人民共和国交通运输部



全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

林刘
印晓

江西省四通路桥建设集团有限公司

企业信息

资质信息

人员信息

业绩信息

诚信记录

全国综合评价

企业在各地的信用等级

企业变更历史

企业转移历史记录

评价年度: 请选择

企业信用等级

序号	评价省份	评价年份	等级	单位
1	云南省	2023	AA	单位
2	四川省	2022	AA	单位
3	云南省	2022	AA	单位
4	四川省	2022	AA	单位
5	四川省	2021	AA	单位
6	云南省	2020	B	单位
7	四川省	2020	AA	单位
8	安徽省	2020	A	单位
9	四川省	2019	A	单位
10	安徽省	2019	A	单位
11	云南省	2018	A	单位
12	四川省	2018	A	单位
13	重庆市	2018	A	单位
14	安徽省	2018	A	单位
15	四川省	2017	A	单位

1 2 下一页 列表 页 确定 共25条

相关链接

北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省
吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省
福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省
广东省 广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省
云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区
新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团



附件下载



联系我们



政府网站
找错

全国公路建设市场监督管理系统

Copyright © 2017-2027 中华人民共和国交通运输部



林刘
印晓

15909...

飞机

重点流域企业

信息公告

企业信息填报

首页

国家企业信用信息公示系统 National Enterprise Credit Information Publicity System

Q 企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

江西省四通路桥建设集团有限公司

集团名称: 江西省四通路桥建设集团有限公司 集团简称: 江西四通路桥集团
统一社会信用代码: 913605001594709648
注册号:
法定代表人: 刘明林
登记机关: 新余市市场监督管理局
成立日期: 1996年12月02日



存续 (在营、开业、在册)

复制链接
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	处罚机关名称	处罚决定书日期	公示日期	详情
----	-------	--------	--------	--------	---------	------	----

暂无行政处罚信息

共 1 页 第 0 条记录 共 0 页

前页 | 后页 | 上一步 | 下一步 | 末页

★ 关注

🔔 订阅

💬 异议

🔄 返回

主办单位: 国家市场监督管理总局
地址: 北京市西城区三里河大街八号 邮政编码: 100820 电话: 010-12315
业务名称与统一社会信用代码 使用指南



林刘
印晓

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

江西省四通路桥建设集团有限公司

集团名称：江西省四通路桥建设集团有限公司 集团简称：江西四通路桥集团
统一社会信用代码：91360500155070964H
注册号：
法定代表人：刘晓林
登记机关：新余市市场监督管理局
成立日期：1996年12月02日



发送短信
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单(黑名单)信息 | 公告信息

■ 列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关(输入)	移出日期	作出决定机关(输出)
----	------------	------	------------	------	------------

暂无列入经营异常名录信息

共 0 条记录 第 0 页

前页 后页 上一步 下一步

★ 关注 打印 评论 返回

主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100020 联系电话：010-82202800
业务咨询与技术支持联系方式：010-82202800



林刘
印晓

15909...

导航

重点领域企业

信息公告

企业信息填报

首页

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

江西省四通路桥建设集团有限公司

存续(在营、开业、在册)

江西省四通路桥建设集团有限公司

集团名称: 江西省四通路桥建设集团有限公司 集团简称: 江西省四通路桥集团

统一社会信用代码: 913605001598709640

注册号:

法定代表人: 刘晓林

登记机关: 宜春市市场监督管理局

成立日期: 1996年12月02日



关联网站

信息分享

信息打印

公告信息

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

列入经营异常名录信息

行政处罚信息

行政许可信息

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

序号	类别	列入严重违法失信名单(黑名单)原因	列入日期	作出决定机关(例)	移出严重违法失信名单(黑名单)原因	移出日期	作出决定机关(移出)
----	----	-------------------	------	-----------	-------------------	------	------------

暂无列入严重违法失信名单(黑名单)信息

共 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

关注

订阅

异议

返回

主办单位: 国家市场监督管理总局
地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100020 电话: 010-12315 12315
业务咨询和技术支持联系方式: 12315



国家公共信用信息中心

通知公告 | 网站声明



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 江西省四通路桥建设集团有限公司

搜索

特别
印晓

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

江西省四通路桥建设集团有限公司

存续

守信激励对象

统一社会信用代码: 913605001598709648

重要提示:

- 1.如认为所公示信息存在错误、遗漏、公开内容不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照《信用信息异议申诉指南》提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按《行政处罚信用信息修复指南》提出信用修复申请。
- 2.本查询结果仅依据现有数据展示相关信息,供社会参考使用,使用相关信息单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
- 3.信用中国网站公示信息与认定单位公示信息不一致的,以认定单位公示信息为准。
- 4.数据有限,单类数据仅能更新程度展示前10000条信息。

异议申诉

下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人

刘翰林

企业类型

有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期

1996-12-02

住所

江西省新余市渝水区仙来东大道347号



行政管理



诚实守信



严重失信



经营异常



信用承诺



信用评价



司法判决



其他



很抱歉,没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设联席会议成员单位

地方信用网站

信用示范地区

领域



关于我们

主办单位: 国家公共信用信息中心

站点地图

指导单位: 国家发展和改革委员会 中国人民银行

网站声明

技术支持: 国家信息中心 中经网



信用中国APP下载



信用中国微信公号

©版权所有: 信用中国 网站备案号: 赣ICP备05052393号 公安网安备11010202007696号



国家公共信用信息中心

通知公告 | 网站声明



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 江西省四通路桥建设集团有限公司

搜索

特别
印晓

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

江西省四通路桥建设集团有限公司

存续

守信激励对象

统一社会信用代码: 913605001598709648

重要提示:

- 1.如认为所公示信息存在错误、遗漏、公开内容不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照《信用信息异议申诉指南》提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按《行政处罚信用信息修复指南》提出信用修复申请。
- 2.本查询结果仅依据现有数据展示相关信息,供社会参考使用,使用相关信息单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
- 3.信用中国网站公示信息与认定单位公示信息不一致的,以认定单位公示信息为准。
- 4.数据有限,单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉

下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人

刘翰林

企业类型

有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期

1996-12-02

住所

江西省新余市渝水区仙来东大道347号



行政管理



诚实守信



严重失信



经营异常



信用承诺



信用评价



司法判决



其他



很抱歉,没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设联席会议成员单位

地方信用网站

信用示范地区

领域



关于我们

主办单位: 国家公共信用信息中心

站点地图

指导单位: 国家发展和改革委员会 中国人民银行

网站声明

技术支持: 国家信息中心 中经网



信用中国APP下载



信用中国微信公号

©版权所有: 信用中国 网站标识码: bm04000009 京ICP备05052393号 京公网安备11010202007696号



国家公共信用信息中心

[通知公告](#) | [网站声明](#)



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或统一社会信用代码

搜索



[信息公示](#)

[信用动态](#)

[信用立法](#)

[政策法规](#)

[信用承诺](#)

[城市信用](#)

[走进信用](#)

[首页](#) > [信息公示](#) > [行政管理信息查询](#)

行政管理信息查询

行政许可

行政处罚

江西省公路路桥建设集团有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索数据

[社会信用体系建设部联席会议成员单位](#)

[地方信用网站](#)

[信用示范地区](#)

[区域](#)



[关于我们](#)

[站点地图](#)

[网站声明](#)

主办单位：国家公共信用信息中心

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

技术支持：国家信息中心 中经网



[信用中国APP下载](#)



[信用中国微信公众号](#)

©版权所有：信用中国 网站备案：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号



国家企业信用信息公示系统

通知公告 | 网站声明



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或统一社会信用代码

搜索



信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

首页 > 信息公示 > 严重失信主体名单查询

严重失信主体名单查询

江西省公路桥梁建设集团有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设联席会议成员单位

地方信用网站

信用示范地区

领域



关于我们

主办单位：国家公共信用信息中心

站点地图

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

网站声明

技术支持：国家信息中心 中经网



信用中国APP下载



信用中国微信公众账号

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号



信用中国

通知公告 | 网站声明



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或统一社会信用代码

搜索



信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

首页 > 信息公示 > 经营 (活动) 异常名录信息查询

经营 (活动) 异常名录信息查询

江西省四通路桥建设有限公司

查询

查询结果



很抱歉, 没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设联席会议成员单位

地方信用网站

信用示范地区

领域



关于我们

主办单位: 国家公共信用信息中心

站点地图

指导单位: 国家发展和改革委员会 中国人民银行

网站声明

技术支持: 国家信息中心 中经网



信用中国APP下载



信用中国微信公众账号

©版权所有: 信用中国 | 网站标识码: bm04000009 | 京ICP备05052393号-5 | 京公网安备11010202007696号



国家企业信用信息公示系统

通知公告 | 网站声明



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或统一社会信用代码

搜索



信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

首页 > 专题查询 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

江西省公路桥梁建设集团有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设联席会议成员单位

地方信用网站

信用示范地区

领域



关于我们

主办单位：国家公共信用信息中心

站点地图

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

网站声明

技术支持：国家信息中心 中经网



信用中国APP下载



信用中国微信公众号

©版权所有：信用中国 | 网站标识码：bm04000009 | 京ICP备05052393号-5 | 京公网安备11010202007696号



国家企业信用信息公示系统

通知公告 | 网站声明



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或统一社会信用代码

搜索



信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

首页 > 专题查询 > 安全生产严重失信主体名单

安全生产严重失信主体名单

江西省四通路桥建设集团有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设联席会议成员单位

地方信用网站

信用示范地区

领域



关于我们

主办单位：国家公共信用信息中心

站点地图

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

网站声明

技术支持：国家信息中心 中经网



信用中国APP下载



信用中国微信公众账号

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号



国家公共信用信息中心

通知公告 | 网站声明



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或统一社会信用代码

搜索



信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

首页 > 专题查询 > 重点领域查询

拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

江西省四通路桥建设集团有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位

地方信用网站

信用示范地区

领域



关于我们

主办单位：国家公共信用信息中心

站点地图

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

网站声明

技术支持：国家信息中心 中经网



信用中国APP下载



信用中国微信公众号

©版权所有：信用中国 网站备案号：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号



国家企业信用信息公示系统

通知公告 | 网站声明



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或统一社会信用代码

搜索



信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

首页 > 专题查询 > 社会组织严重违法失信名单

社会组织严重违法失信名单

江西省公路桥梁建设集团有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设联席会议成员单位

地方信用网站

信用示范地区

领域



关于我们

主办单位：国家公共信用信息中心

站点地图

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

网站声明

技术支持：国家信息中心 中经网



信用中国APP下载



信用中国微信公众账号

版权所有：信用中国 网站备案号：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号



信用中国

通知公告 | 网站声明



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或统一社会信用代码

搜索



信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

首页 > 专题应用 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

江西省公路桥梁建设集团有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设联席会议成员单位

地方信用网站

信用示范地区

领域



关于我们

主办单位：国家公共信用信息中心

站点地图

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

网站声明

技术支持：国家信息中心 中视网



信用中国APP下载



信用中国微信公众账号

版权所有：信用中国 网站备案号：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号



林刘
印晓

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或统一社会信用代码 搜索

城市信用 走进信用

信息公示 信用动态

重点领域严重违法失信主体名单查询

安全生产严重违法失信主体名单 (法人)

安全生产严重违法失信主体名单 (自然人)

重大税收违法失信主体名单

失信被执行人

拖欠农民工工资失信联合惩戒对象

统计严重违法失信企业名单

社会信用严重违法失信名单

政府严重违法失信行为记录名单

诚实守信相关荣誉信息分类查询

公路工程建设领域守信典型企业

水运工程建设领域守信典型企业

信用信息分类查询

全国社会信用信息查询

中国人民银行征信中心个人信用信息服务平台

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 地方信用网站 信用示范区 区域

关于我们 主办单位：国家公共信用信息和信用空间信息中心

站点地图 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

网站声明 技术支持：国家信息中心 中经网

信用中国APP下载

信用中国微信公众账号

版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

149



林刘
印晓



中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

首页 执行公开服务

失信将受到信用惩戒!



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
高俊波	4114221964****0340
杨春玲	3326251958****582X
张刚	5102251976****4930
王桂丰	1326231959****4058
胡超	1302811989****0219
倪西哲	4104821995****3836

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京东方盛美装饰有限公司	75333755-6
北京大家网教育科技发展有限公司	78618779-3
廊坊市蓝坤建设(集团)有限公司	9150011820****8966
北京国研建筑工程有限公司	08962733-5
安徽江淮电缆集团有限公司	15371204-1



查询条件

被执行人姓名/名称: 江西省四通路桥建设集团有限公司

身份证号码/组织机构代码: 913605001598709648

省份: 全部

验证码: 52754



验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 913605001598709648 江西省四通路桥建设集团有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自觉履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会公开“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各界通过该平台查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息,既能知悉事项亦如下声明:

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,人民法院将依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,将被执行人列入失信被执行人名单,并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息,供相关单位依法、法规和有关规定,在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面,对失信被执行人予以信用惩戒;将失信信息和失信被执行人名单信息,并由征信机构在其征信系统中记录。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人,人民法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定,对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的,被采取限制消费措施后,不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为:(一)乘坐交通工具时,选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位;(二)在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费;(三)购买不动产或高档装修、扩建、高档装修房屋;(四)租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公;(五)购买非经营必需车辆;(六)旅游、度假;(七)子女就读高收费私立学校;(八)支付高额保险费或理财理财产品;(九)购买不动产或不动产,其他非生活必需消费,其他非生活必需消费和工作中必需消费除外。被执行人为单位的,被采取限制消费措施后,被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为,否则将予以罚款、拘留或追究刑事责任。

四、纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的,可以向人民法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考,如有异议,以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的,人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息,不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的,查询人自行承担责任。

七、本网站信息查询免费,严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站,未经许可,任何商业网站不得建立与本网站及其内容的链接,不得建立本网站的镜像(包括全部和局部镜像),不得抄袭、复制或传播本网站信息。

九、如对查询内容有异议,请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址:北京市东城区东交民巷27号 邮编:100745 总机:010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号



(六) 拟委任的项目经理和项目总工资历表



(六) -1 拟委任的项目经理和项目总工汇总表

姓名	年龄	拟在本项目中担任的职务	技术职称	建造师类别及注册号	累计对应岗位的工作年限（月）	备注
刘晓林	48 岁	项目经理	高级工程师	公路工程一级注册建造师/赣 1362007200802451	26 个月	/
钟海辉	49 岁	项目总工	高级工程师	/	26 个月	/



(六) -2 拟委任的项目经理和项目总工资历表

姓名 林刘 印晓	刘晓林	年 龄	48 岁	专 业	公路与桥梁工程
	高级工程师	学 历	本科	拟在本标段工程任职	项目经理
工作年限	18 年			类似施工经验年限	2 年
毕业学校	2007 年 1 月毕业于 华东交通大学 学校 土木工程 专业, 学制 3 年				
经 历					
时 间	参加过的类似工程项目名称			担任职务	发包人及联系电话
2021 年 09 月 18 日 ~ 2022 年 12 月 28 日	宜宾经南溪至泸州快速通道 (南溪段) 项目			项目经理	四川宜宾龙投发展集团有限公司 13708297700
2022 年 12 月 29 日 ~ 2023 年 11 月 17 日	S222 分宜县金鸡布至峡石段二级公路改建 (K0+000~K12+780) 路面工程			项目经理	新余市公路事业发展中心分宜分中心 18979031955
获奖情况		无			
本人 <u>刘 晓 林</u> (亲笔签字) 知晓自己为本项目的 <u>项目经理</u> (填写项目经理或项目总工), 并对其真实性负责。					
备 注		我司拟派往 <u>省道 S350 线肇庆广宁石涧至丰田段安全提升工程 (施工)</u> (项目名称) 的 <u>刘晓林</u> (姓名) (项目经理) 现阶段在 <u>键为县农田建设综合开发项目-配套设施建设 (一期)</u> (项目名称) 任 <u>项目经理</u> 职务;			

注:

1. 本表应填写项目经理和项目总工相关情况。
2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料
3. 目前未在具体项目上任职的, 请在备注栏说明现在负责的工作内容。。



撤离承诺函

广宁县公路事务中心（招标人名称）：



江西省四通路桥建设集团有限公司（投标人名称）拟派往省道 S350 线肇庆广宁石涧至丰田段安全提升工程（施工）（项目名称）的刘晓林（姓名）（项目经理）现阶段在键为县农田建设综合开发项目-配套设施建设（一期）（项目名称）任项目经理职务；

江西省四通路桥建设集团有限公司（投标人名称）在省道 S350 线肇庆广宁石涧至丰田段安全提升工程（施工）（项目名称）中中标，项目经理刘晓林（姓名）可以从键为县农田建设综合开发项目-配套设施建设（一期）（项目名称）中撤离，前往省道 S350 线肇庆广宁石涧至丰田段安全提升工程（施工）（项目名称）履约担任：项目经理。


投标人：江西省四通路桥建设集团有限公司（盖单位章）



2026 年 1 月 6 日



身份证



毕业证






职称证



江西省高级专业技术资格 证 书

此证表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格

姓 名：刘晓林



资格名称：高级工程师

专业名称：公路与桥梁工程

取得资格时间：2018年12月08日

批复文号：赣人社字〔2019〕70号

管 理 号：36201812003839



唯一在线验证网址：


<https://hr.jxhrss.gov.cn/zcxt>

打印时间：2019年02月12日





一级注册建造师



使用有效期至: 2027年10月11日
2024年03月28日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 刘晓林

性 别: 男

出生日期: 1977年09月24日

注册编号: 赣1362007200802451

聘用企业: 江西省四通路桥建设集团有限公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2024-10-12至2027-10-11)

市政公用工程(有效期: 2024-03-28至2027-03-27)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

刘晓林

个人签名: 刘晓林

签名日期: 2025.9.11

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章

签发日期: 2008年04月29日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

林刘
印晓

姓名 / 人员数量 / 人员列表

手机查看 打印

刘晓林

证件类型	居民身份证	证件号码	360111*****19	性别	男
注册证书所在单位名称	江西省四通路桥建设集团有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册建造师

注册单位: 江西省四通路桥建设集团有限公司 注册编号/执业印章号: 赣1362007200802451

注册专业: 市政公用工程 有效期: 2027年03月27日

注册专业: 公路工程 有效期: 2027年10月11日

2024-03-28 - 延续注册 - 市政公用工程
江西省四通路桥建设集团有限公司

2021-10-22 - 延续注册 - 公路工程
江西省四通路桥建设集团有限公司

2021-04-16 - 增项注册 - 市政公用工程
江西省四通路桥建设集团有限公司

2008-04-29 - 初始注册 - 公路工程
江西省四通路桥建设集团有限公司

查看证书变更记录 (4)

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化管理网站
住房和城乡建设部诚信体系建设中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量

2250106872



网站统计



数据服务



资质证书

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 工业和信息化部 中华人民共和国住房和城乡建设部诚信体系建设管理网
网站标识码: hui10000032 备案编号: 京ICP备10036409号 技术支持: 全国建筑市场监管公共服务平台 北京建信信息技术有限公司



5 中 国 建 筑 市 场 公 司



住房和城乡建设部政务服务窗口

林刘
印晓

首页 > 国务院部门服务窗口 > 住房和城乡建设部 > 人员资格查询

人员资格查询

	刘晓林
	360111197709240019
	请输入验证码
立刻查询	重置信息

查询结果

姓名	刘晓林		
身份证号码	360111197709240019		
注册号	赣 1362007200802451	注册类别	注册建造师 (一级)
注册单位	江西省公路桥梁建设集团有限公司		
有效日期	2027-10-11		

其他相关服务

- 企业资质查询
企业资质
- 人员资格查询
人员资格

本服务由住房和城乡建设部提供

链接: 全国人大 | 全国政协 | 国家监察委员会 | 最高人民法院 | 最高人民检察院

国务院部门政务服务平台

地方政府服务平台

国务院部门门户网站

媒体

关于本网 | 网站声明 | 联系我们

版权所有: 国家政务服务平台

主办单位: 国务院办公厅 运行维护单位: 国务院办公厅政务办公室

京ICP备05070216号-3

京公网安备 11010202001001号

建议使用IE9及以上版本, Edge, Chrome, Firefox和360地主浏览器访问本网站

使用反馈

用户指引

无障碍

我的服务

我的服务

我的服务

我的服务

我的服务

我的服务

我的服务

我的服务

我的服务

我的服务

我的服务

我的服务

我的服务

我的服务

我的服务

我的服务

我的服务

我的服务

我的服务

我的服务

我的服务

我的服务

我的服务

我的服务



安全生产考核 B 证

交通运输工程施工单位安管人员安全生产考核管理系统信息公共查询平台

Public Information Query Platform for the Safety Production Assessment Management System of Safety Management Personnel in Transportation Engineering Construction Units

企业用户登录 | 首页

证书详细信息

证书编号: 赣交安B10G04761
发证时间: 2010-06-24
有效时间: 2028-06-23
证书状态: 有效
姓 名: 刘晓林
性 别: 男
出生日期: 1977/9/24
企业名称: 江西省四通路桥建设集团有限公司

照 片



考试咨询电话:0791-86243058, 考核、调动等业务咨询电话:0791-86662029

公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产 管理人员安全生产考核合格证书

姓名: 刘晓林 性别: 男

出生年月: 1977-09-24 身份证号: [REDACTED]

经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格, 特发此证。

企业名称: 江西省四通路桥建设集团有限公司

证书编号: 赣交安B10G04761

有效期: 2010-06-24 至 2028-06-23

考核部门: 江西省交通运输厅



中华人民共和国交通运输部监制

查询网址:

<http://jx.safetyams.cn/cxpt/PeopleDetailSeach.html?UXFOMbwRJ89ei+34SJhKPdMEYuKtv1V7XD/U4I57z2mS6qFZZeJsrUM1mls1vE0N>



全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

林刘
印晓

江西省路桥建设集团有限公司

企业信息 人员信息 业绩信息 资质记录 全国综合评价 企业信用评价 企业变更记录 企业转移历史记录

姓名: 请输入查询条件

搜索

人员信息

序号	姓名	性别	毕业学校	学历	专业	备注
16	刘工民	男	长沙交通学院	大专	公路工程	
17	彭昭南	女	长沙理工大学	大专	交通土建工程	
18	彭慧君	女	东南财经学院	本科	会计学	
19	刘金花	女	重庆交通学院	大专	道路工程	
20	黄奎根	男	长沙交通学院	本科	公路与城市道路工程	
21	袁祖英	女	华东交通大学	本科	土木工程	
22	毛强	女	重庆交通学院	大专	公路桥梁	
23	林梅霞	女	济南交通高等专科学校	中专	公路桥梁	
24	李开青	女	中央广播电视大学	大专	财务会计	
25	刘晓林	男	华东交通大学	本科	土木工程	
26	黎正保	女	长沙理工大学	大专	财会	
27	袁庆波	男	国家开放大学	本科	公路桥梁	
28	张清保	男	交通部电视中专	中专	政治教育	
29	袁晓梅	女	江西财经大学	本科	会计学	
30	胡小霞	女	浙江工商大学	大专	财会	

上一页 1 2 3 ... 23 下一页 制表 类 确定 共239条

相关链接

北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省
吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省
福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省
广东省 广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省
云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区
新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团

附件下载

联系我们

政府网站
找错

全国公路建设市场监督管理系统
Copyright © 2017-2027 中华人民共和国交通运输部



全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

林刘
印晓

基本信息

姓名	刘晓林	毕业院校	华东交通大学
性别	男	所学专业	土木工程
学历	本科	开始工作年份	

导出

职称信息		执业资格信息		履历信息		个人业绩 (2025.1.1之前录入)	个人业绩 (2025.1.1之后录入)
序号	职称	证书编号	职称专业	核发机关	核发日期	业绩	业绩
1	其他	甲级1536010068	公路工程工程造价工程师	中华人民共和国交通运输部	2013-07-23	业绩	
2	其他	赣交安B (10) G047	安全生产考核合格证书	江西省交通运输厅	2019-06-24	业绩	
3	助理工程师	赣初字 (工程) B42002A005	路桥	江西省公路局	2003-03-03	业绩	
4	工程师	12024898	公路与桥梁工程	新余市人力资源和社会保障局	2012-02-24	业绩	
5	高级工程师	36201812003039	公路与桥梁工程	江西省公路工作办公室	2018-12-08	业绩	

相关链接

北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省
吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省
福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省
广东省 广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省
云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区
新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团

附件下载

联系我们

政府网站
找错

全国公路建设市场监督管理系统
Copyright © 2017-2027 中华人民共和国交通运输部



全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

林刘
印晓

基本信息

姓名	刘晓林	毕业院校	华东交通大学
性别	男	所学专业	土木工程
学历	本科	开始工作年份	

申报

职称信息		执业资格信息		履历信息	个人业绩 (2025.1.1之前录入)	个人业绩 (2025.1.1之后录入)	
序号	注册类别	注册等级	发证机关	证书编号	发证日期	注册有效期至	审核
1	安全员	B类	江西省交通运输厅	赣交安B10004761	2010-06-24	2026-06-23	审核
2	注册建造师	公路工程一级	中华人民共和国住房和城乡建设部	赣1362007200802451	2008-04-29	2027-10-11	审核
3	试验检测人员	试验检测师	交通运输部职业资格中心	2021360004101	2021-12-28	2027-10-08	审核
4	注册建造师	市政公用工程一级	中华人民共和国住房和城乡建设部	赣1362007200802451	2008-04-29	2027-03-27	审核
5	造价工程师	工程造价师	中华人民共和国交通运输部	甲级1336010068	2013-07-23	2025-11-25	审核
6	安全员	A类	江西省交通运输厅	赣交安A13003988	2015-08-23	2025-08-23	审核

相关链接

北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省
吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省
福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省
广东省 广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省
云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区
新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团

附件下载

联系我们

政府网站
找错

全国公路建设市场监督管理系统
Copyright © 2017-2027 中华人民共和国交通运输部



全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

林刘
印晓

基本信息

姓名	刘晓林	毕业院校	华东交通大学
性别	男	所学专业	土木工程
学历	本科	开始工作年份	

导出

任职信息		执业资格信息		履历信息		个人业绩 (2025.1.1之前录入)		个人业绩 (2025.1.1之后录入)	
序号	公司名称	职业资格	执业资格	任职类型	职务	任职状态	任职时间	离任时间	备注
1	江西省公路桥梁建设集团有限公司			其他	造价人员	在职	1996-07-12		详细

相关链接

北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省
吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省
福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省
广东省 广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省
云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区
新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团



附件下载



联系我们



政府网站
找错

全国公路建设市场监督管理系统
Copyright © 2017-2027 中华人民共和国交通运输部



全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

林刘
印晓

基本信息

姓名	刘晓林	毕业院校	华东交通大学
性别	男	所学专业	土木工程
学历	本科	开始工作年份	

导出

任职信息		执业资格信息		履历信息		个人业绩 (2025.1.1之前录入)		个人业绩 (2025.1.1之后录入)	
序号	项目名称	标段名称	业绩所属单位	工作岗位	任职日期	在聘起始日期	在聘截止日期	业绩	
1	湖北麻武大高速公路路面病害治理工程	/	江西省公路桥梁建设集团有限公司	项目经理		2017-05-21	2017-10-15	业绩	
2	巴中市通凤公路建设工程施工一标段	一标段	江西省公路桥梁建设集团有限公司	项目经理		2015-05-20	2016-11-17	业绩	
3	赣南高速公路2019年大中修路面工程	LM1	江西省公路桥梁建设集团有限公司	项目经理		2015-06-01	2015-12-31	业绩	
4	S222分宜县金坑乡至新石院二桥公路改建 (K0+000-K12+780) 路面工程	S222分宜县金坑乡至新石院二桥公路改建 (K0+000-K12+780) 路面工程	江西省公路桥梁建设集团有限公司	项目经理		2022-12-29	2023-11-17	业绩	
5	祁东高速公路收费站收费广场扩建工程土建施工XLTA-1标段	一标段	江西省公路桥梁建设集团有限公司	项目经理		2017-10-16	2019-07-16	业绩	
6	宜兴市南溪至泸州快速通道 (南溪段) 项目	/	江西省公路桥梁建设集团有限公司	项目经理		2021-09-18	2022-12-28	业绩	
7	抚康线普通公路升级改造设计施工总承包 (EPC) 项目	/	江西省公路桥梁建设集团有限公司	项目经理		2020-05-06	2021-09-10	业绩	

相关链接

北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省
吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省
福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省
广东省 广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省
云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区
新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团



附件下载



联系我们



政府网站
找错

全国公路建设市场监督管理系统
Copyright © 2017-2027 中华人民共和国交通运输部



全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

林刘
印晓

基本信息

姓名	刘晓林	毕业院校	华东交通大学
性别	男	所学专业	土木工程
学历	本科	开始工作年份	

导出

职称信息		执业资格信息		履历信息		个人业绩 (2025.1.1之前录入)		个人业绩 (2025.1.1之后录入)	
序号	职称名称	证书名称	业绩所属单位	工作岗位	开始日期	在网起始日期	在网截止日期		

无记录

相关链接

- 北京市
- 天津市
- 河北省
- 山西省
- 内蒙古自治区
- 辽宁省
- 吉林省
- 黑龙江省
- 上海市
- 江苏省
- 浙江省
- 安徽省
- 福建省
- 江西省
- 山东省
- 河南省
- 湖北省
- 湖南省
- 广东省
- 广西壮族自治区
- 海南省
- 重庆市
- 四川省
- 贵州省
- 云南省
- 西藏自治区
- 陕西省
- 甘肃省
- 青海省
- 宁夏回族自治区
- 新疆维吾尔自治区
- 新疆生产建设兵团



附件下载



联系我们



政府网站
统一

全国公路建设市场监督管理系统
Copyright © 2017-2027 中华人民共和国交通运输部



单位名称	江西公路桥梁建设集团有限公司	项目类型	一级公路
工程名称	新抚河至庐州快速通道（南溪段）项目	估算价（万元）	72010.5314
合同价（万元）	71993.9236	合同段名称	/
技术标准	一级公路	交工日期	2022-12-28
开工日期	2020-04-08	建设状态	总包已竣
合同段桩号	K0+000	合同段桩号	K22+281
质量等级	合格	所在省份	四川省
项目代码	0353		
主要工程量	本项目全长：22.281Km，公路等级为：一级公路，路面类型为：沥青混凝土路面，设计速度为80Km/h，一般路段路基宽度为23m，双向4车道，桥涵设计荷载等级为公路-I级。本合同段主要工程量为：1.路基工程：路基挖土方272万m³，路基填方302万m³，特殊路基处理碎石桩约9.6万m³，排水工程：边沟37Km，截水沟2753m³，急流槽333m³，护面墙工防护：护脚、踏步2000m³；边坡防护浆砌骨架、拱形骨架3万m³；砌体土墙：4.2万m³，浆砌片石+预制块排水沟21.1Km；2.路面工程：级配碎石基层46.6万平方，水泥稳定碎石基层44万m²，沥青混凝土面层43.6万m²；3.桥涵工程：新桥桩基钻孔灌注桩2418.92米/45道，桩架高64米/1道，桥梁4座全长651米（其中桥墩高大桥长367米，工程造价2700万元，上部结构为4×30+4×30+4×30m预应力箱梁T梁结构，下部结构采用盖梁柱式墩，桩基础；单跨中桥大桥长88m，工程造价867万元，上部结构为2×40m预应力箱梁T梁结构，下部结构采用盖梁柱式墩，桩基础；铁六团中桥长99m，工程造价884万元，上部结构为3×30m简支T梁结构，下部结构采用盖梁柱式墩，桩基础，龙塘口中桥长97m，工程造价814万元，上部结构为3×30m简支T梁结构，下部结构采用盖梁柱式墩，桩基础。；4.交安工程：波形护栏22.281Km，红绿灯5套，标线3万m²，各类标志牌110套，5.绿化及其他工程：栽植香樟0.71万株，小叶女贞球2.1万株，小叶女贞0.5万丛，灌木绿篱15万平方，铺种草皮30万平方，公路平面交叉28处。		

人员履约信息

序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	刘陈林	项目经理	2021-08-18~2023-12-28
2	钟海辉	项目总工	2021-08-18~2023-12-28
3	周小兰	项目副经理	2020-01-02~2023-12-28
4	舒俊翔	项目副经理	2020-01-02~2023-12-28
5	杨小勇	项目副总工	2020-01-02~2023-12-28
6	黄发	项目副总工	2020-01-02~2023-12-28
7	邵凡	工程部门负责人	2020-01-02~2023-12-28
8	古露	质检负责人	2020-01-02~2023-12-28
9	王刚	技术员	2020-01-02~2023-12-28
10	廖浩楠	安全负责人	2020-01-02~2023-12-28





林刘
印晓

企业名称	江西省四通路桥建设集团有限公司			
工程名称	S222分宜县金鸿布至峡石段二级公路改建（K0+000-K12+780）路面工程			
合同价（万元）	5080.8016	其他工程	5093.2609	
技术等级	二级公路	项目类型	其他工程	
开工日期	2022-11-10	合同段名称	S222分宜县金鸿布至峡石段二级公路改建（K0+000-K12+780）路面工程	
竣工日期		完工日期	2023-11-17	
合同段开始桩号	K0+000	建设状态	总包已建	
质量评定情况	合格	合同段结束桩号	K12+780	
项目代码		所在省份	江西省	
主要工程量	本合同段主要工程量：本项目桩号范围为K0+000~K12+780，全长12.78公里，公路设计等级为公路二级，路面类型为沥青混凝土路面，主要工程量如下：一、路基工程：1.路基挖土方313.675m³；2.挖除路肩填38.52m³；3.填筑（4+6）cm沥青面层737m²；4.填筑20cm上基层124.02m³；二、路面工程：1.水泥稳定碎石下基层159346m²；2.调平层2879.1m³；3.水泥稳定碎石上基层145874m²；4.透层+封层+粘层1592.37m³；三、安全设施工程：1.波形梁护栏（三波）：10866m，178个端头；2.波形梁护栏（二波）：139491m²；7.浆砌片石路肩墙5880.3m³；8.现浇混凝土加固上路肩（C25商品砼） 1、项目经理：刘晓林；2、项目副经理：袁会军、舒俊翔；3、项目总工：钟海辉；4、项目副总工：张智、黄龙；5、安全负责人：占鼎。			

人员履约信息

序号	姓名	担任职务或专业负责人	任职日期
1	黄龙	项目副总工	2022-11-10~2023-11-17
2	袁会军	项目副经理	2022-11-10~2023-11-17
3	舒俊翔	项目副经理	2022-11-10~2023-11-17
4	占鼎	安全负责人	2022-11-10~2023-11-17
5	钟海辉	项目总工	2022-12-28~2023-11-17
6	刘晓林	项目经理	2022-12-28~2023-11-17
7	张智	项目副总工	2022-11-10~2023-11-17





江西省社会保险个人参保证明



林刘
印晓

刘

晓

个人基本信息

姓名	刘晓林	身份证号	360111197709240019	性别	
----	-----	------	--------------------	----	--

当前参保情况

个人社保编号	险种名称	参保状态	参保地	参保单位名称
360575152033	工伤保险	参保缴费	新余市市本级	新余市公路事业发展中心渝水分中心
360575152033	补充工伤保险(部分省份使用)	参保缴费	新余市市本级	新余市公路事业发展中心渝水分中心
360575152033	失业保险	参保缴费	新余市市本级	新余市公路事业发展中心渝水分中心
360575152033	职业年金	参保缴费	新余市市本级	新余市公路事业发展中心渝水分中心
360575152033	机关事业单位工作人员基本养老保险	参保缴费	新余市市本级	新余市公路事业发展中心渝水分中心

社会保险缴费明细

个人社保编号	险种名称	缴费起止年月	月缴费基数	是否到账	缴费单位名称
360575152033	失业保险	202501-202512	12438	是	新余市公路事业发展中心渝水分中心
360575152033	工伤保险	202501-202512	12438	是	新余市公路事业发展中心渝水分中心
360575152033	机关事业单位工作人员基本养老保险	202501-202512	12438	是	新余市公路事业发展中心渝水分中心
360575152033	机关事业单位工作人员基本养老保险	202401-202412	11970	是	新余市公路事业发展中心渝水分中心
360575152033	机关事业单位工作人员基本养老保险	202301-202312	11770	是	新余市公路事业发展中心渝水分中心
360575152033	机关事业单位工作人员基本养老保险	202201-202212	7136	是	新余市公路事业发展中心渝水分中心
360575152033	机关事业单位工作人员基本养老保险	202101-202112	6905	是	新余市公路事业发展中心渝水分中心
360575152033	机关事业单位工作人员基本养老保险	202001-202012	6816	是	新余市公路事业发展中心渝水分中心
360575152033	机关事业单位工作人员基本养老保险	201901-201912	5998	是	新余市公路事业发展中心渝水分中心
360575152033	机关事业单位工作人员基本养老保险	201801-201812	5447	是	新余市公路事业发展中心渝水分中心
360575152033	机关事业单位工作人员基本养老保险	201701-201712	5369	是	新余市公路事业发展中心渝水分中心
360575152033	机关事业单位工作人员基本养老保险	201601-201612	4857	是	新余市公路事业发展中心渝水分中心
360575152033	机关事业单位工作人员基本养老保险	201501-201512	4805	是	新余市公路事业发展中心渝水分中心
360575152033	机关事业单位工作人员基本养老保险	201410-201412	4805	是	新余市公路事业发展中心渝水分中心
360575152033	职业年金	202501-202512	12438	是	新余市公路事业发展中心渝水分中心
360575152033	职业年金	202401-202412	11970	是	新余市公路事业发展中心渝水分中心
360575152033	职业年金	202301-202312	11770	是	新余市公路事业发展中心渝水分中心
360575152033	职业年金	202201-202212	7136	是	新余市公路事业发展中心渝水分中心
360575152033	职业年金	202101-202112	6905	是	新余市公路事业发展中心渝水分中心
360575152033	职业年金	202001-202012	6816	是	新余市公路事业发展中心渝水分中心
360575152033	职业年金	201901-201912	5998	是	新余市公路事业发展中心渝水分中心
360575152033	职业年金	201801-201812	5447	是	新余市公路事业发展中心渝水分中心
360575152033	职业年金	201701-201712	5369	是	新余市公路事业发展中心渝水分中心
360575152033	职业年金	201601-201612	4857	是	新余市公路事业发展中心渝水分中心

电子专用章



江西省社会保险个人参保证明



林刘 印晓	360578152033	职业年金	201501-201512	4805	是	新余市公路事业发展中心渝水分中心
	360578152033	职业年金	201410-201412	4805	是	新余市公路事业发展中心渝水分中心
	360578152033	补充工伤保险(部分省份使用)	202504-202512	12438	是	新余市公路事业发展中心渝水分中心

申请查询日期 2026年01月04日



证 明

兹证明江西省四通路桥建设集团有限公司系新余市公路事业发展中心(原名称:新余市公路管理局)下属国有企业,其人员由新余市公路事业发展中心及各下属单位人员共同组成,由于现处于改制阶段,人员社保仍在各单位缴纳,各下属单位包括:

- 1、新余市公路事业发展中心渝水分中心(原名称:新余市公路管理局渝水分局);
- 2、新余市公路事业发展中心分宜分中心(原名称:新余市公路管理局分宜分局);
- 3、新余公路勘察设计院;
- 4、新余市公路桥梁工程局。

特此证明!

新余市公路事业发展中心

2022年1月19日





关于江西省四通路桥建设集团有限公司
社保情况证明

江西省四通路桥建设集团有限公司成立于1996年12月，与新余市公路桥梁工程局为“两块牌子一套人员”，人员由新余市公路事业发展中心（原新余市公路管理局）及其各下属单位人员共同组成，按事业单位管理，主管单位为新余市公路事业发展中心。

根据新余市委、市政府深化事业单位分类改革要求，于2010年将新余市公路桥梁工程局事业单位成建制改制为企业（江西省四通路桥建设集团有限公司），按照“老人老办法、新人新办法”的原则，原人员社保还在原单位缴纳，主管单位为新余市公路事业发展中心，监管单位为新余市国有资产监督管理委员会。

特此证明！

新余市国有资产监督管理委员会

二〇二〇年三月二十七日





新余市人民政府常务会议 记 录 摘 要

新余市人民政府办公室

2010 年 11 月 30 日

市七届人民政府第 88 次常务会议纪要

2010 年 11 月 18 日，市长魏旋君主持召开市七届人民政府第 88 次常务会议。常务副市长何萍高，副市长胡高平、陈九根、林彬杨，市政府秘书长刘新政出席会议。副市长万筱明、王跃辉，市政府党组成员、市监察局局长刘永华因公请假。市人大常委会副主任陈秉江、市政协副主席涂绪永，新余高新区党工委书记贺为华应邀参加会议。列席会议人员有：市政府副秘书长、办公室主任廖茂侦，市政府副秘书长刘伟、王一帆、王钦国、董海涛、敖新春、黄小基、袁传胜、敖小忠。专题研究会议的有：市委副秘书长谭武先，市统筹办单巍全，市编委办涂群，市发改委林愚，市工信委任光明，市教育局胡建华，市





林刘
印晓

科技局钟岳桦，市公安局肖秋根，市监察局蔡小莲，市财政局徐绍荣，高剑，市人保局徐国梁，市国土资源局钟兆辉、黄正根，市住建委龚成效、何祝生，市交通运输局张向东，市水务局黎兵根，市农业局刘和平，市林业局何筱勇，市商务局彭水明，市文新局林舒，市环保局邹建福，市国资委鄢剑华，市统计局刘日东，市安监局李志宏，市规划局黄红阳，市政府法制办萧飞云，市房管局刘晓云，市公路局艾绍平，高新区管委会李绪先、黄敏勇，分宜县政府赖新云，渝水区政府徐文泊，仙女湖区管委会张晓明，孔目江区管委会钱传宇，市总工会李国俊，市市场建设办简桃生，市高铁新区指挥部罗忠，市交通投资公司杜元生，北湖宾馆黄立新，云南盛世同创公司徐清泉以及市检察院有关人员。

一、会议讨论了《中共新余市委关于制定全市国民经济和社会发展的第十二个五年规划的建议》。会议认为，“十二五”时期，是我市积极融入鄱阳湖生态经济区、加快建设国家新能源科技城、努力建成赣西区域中心城市的重要时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式，全面建设小康社会的关键时期。要深刻分析形势，把握发展大势，增强前瞻性和战略性，突出科学性和时代性，体现包容性和基础性，并精心实施“十二五”规划，在新的起点上推进我市科学发展、绿色崛起。会议确定，由市发改委根据会议所提意见尽快修改完善后报市委。

二、会议听取了市住建委《关于保定市德州市建设低碳城市的考察报告》。会议认为，低碳城市作为城市发展的一个方向和目标，具有十分重大而现实的意义。我市新能源产业基础雄厚，建设低碳城市具备较好条件。要发展低碳经济，培育低碳产业，推进能源结构调整，构建低碳产业支撑体系，加快低碳技术开发与应用，推进清洁生产。要树立低



林刘
印晓

碳理念，建设低碳社会；实施低碳化管理，加强节能减排。要加强领导，落实责任；加强宣传，营造氛围。会议确定，建设低碳城市工作由市发改委牵头推进，落实好成立领导小组、编制规划、起草实施意见等工作。

三、会议讨论并原则同意市交通投资公司提请的《新余市交通建设投资有限公司组建方案》。会议确定，由林彬杨副市长负责协调江西省四通路桥建设集团有限公司和新余公路勘察设计院作为市交通建设投资公司子公司参与企业经营管理有关事宜；由市编委办按照“老人老办法，新人新办法”原则，将市公路桥梁工程局和市公路勘察设计院成建制改制为企业，原事业单位人员身份保留不变；市公路局要做好事业单位改企人员的思想工作，确保稳定。

四、会议讨论了市安监局《关于要求对新余前卫化工有限公司“10·9”顺丁烯二酸酐泄露事故调查处理意见进行批复的请示》。会议同意市安监局调查处理意见，并强调，对于发生生产安全责任事故的企业，各地各职能部门要严厉处罚，严肃教育，严格管理，坚决停产整顿，该关闭的坚决关闭；要加强督促检查，对通过安全评价验收或达到整改要求后，要及时组织恢复生产，确保企业安全生产。会议要求高新区管委会尽快制定新余前卫化工有限公司搬迁方案。

五、会议讨论了高新区管委会《关于同意建设江西新余广域国际家居建材博览中心的请示》。会议确定：（一）同意收回新余华峰电器厂原址和新余市植物油厂现址土地使用权，按商业用地性质以招拍挂方式公开出让，江西新余广域国际家居建材博览中心可通过土地市场取得该宗地的土地使用权。（二）所涉地块中的原居住用地调整为商业用地。（三）所涉地块的地上建筑，附着物的拆迁补偿工作由高新区管委会负责。（四）合理确定收回市植物油厂现址土地的补偿费用，确保市植物油厂顺利改制。



林刘
印晓

六、会议讨论了市发改委提请的《新余市政府与江西省铁路投资集团公司关于新余市铁路建设土地运作地块公开出让协议》。会议确定：(一)市政府参与参股杭长铁路运作的 180 亩土地起拍价为 50 万/亩，土地出让金在扣除 25 万元/亩和出让成本之和后，余额拨付给省铁路投资集团公司指定参与摘牌的房地产子公司。(二)由市发改委根据会议所提意见修改完善后再与省铁路投资集团公司协商。

七、会议审议并通过市政府法制办提请的《新余市行政调解办法(草案)》。会议指出，为推动我市行政机关主动、及时化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定，制定该办法是必要的。会议确定，以市政府令公布施行《新余市行政调解办法》。

八、会议讨论了高铁新区指挥部《关于虎踞大道市政工程设计费用的请示》。会议同意中交第二航务工程勘察设计院有限公司中标虎踞大道市政工程设计项目，中标价格为 475 万元(其中工程可行性研究报告编费 50 万元)，经费由高铁新区自筹。

九、会议讨论了《新余迎宾馆建设工程实施方案》。会议指出，为进一步提高我市接待能力，完善城市功能，提升城市品位和整体形象，建设新余迎宾馆是必要的。会议原则同意《实施方案》。

十、会议讨论了市财政局《关于解决迎国检上吉线大中修工程路面结构调整增加经费的意见》，会议确定，在市财政公中解决万元用于迎国检上吉线大中修工程路面结构调整增加

十一、其他事项

会议还听取了市住建委关于城北广场改造情况的汇报，由步步高公司对城北广场进行改造，并向市委常委会汇报。





发：市委书记，市政府市长，市委副书记，市人大常委会主任，市政协主席，市委常委，市政府副市长、秘书长、党组成员、副秘书长。
送：市委办，市人大常委会办，市政协办，市编委办，市发改委，市财政局，市国土资源局，市住建委，市交通运输局，市环保局，市安监局，市规划局，市政府法制办，市中小企业局，市公路局，市高铁新区指挥部，市交通投资公司，高新区管委会。

新余市人民政府办公室秘书科

2010年12月2日印发



市七届人民政府第 88 次常务会议纪要征求意见单

征求意见单位名称：市公路局

议题名称	草 拟 稿
三、会议讨论并原则同意市交通投资公司提出的《新余市交通建设投资有限公司组建方案》。	会议确定，由林彬杨副市长负责协调江西省四通路桥建设集团有限公司和新余公路勘察设计院作为市交通建设投资公司子公司参与企业经营管理有关事宜；由市国资委办负责按照新入新办法、老人老办法，保留原事业单位人员身份不变的原则，将市公路桥梁工程局和市公路勘察设计院成建制改制为企业；市公路局要做好单位员工思想工作，确保社会稳定。





新余市人民政府专题办公会议 纪 要

[2012]49号

新余市人民政府办公室

市公路桥梁工程局市公路勘察设计院 转企改制有关问题协调会议纪要

2012年8月22日下午，受市委常委、副市长廖晓凌的委托，市政府办公室副主任王新平主持召开了市公路桥梁工程局、市公路勘察设计院转企改制有关问题协调会。市人保局龚伟斌，市编委办罗斌江，市公路管理局龚成效，邓柯等参加了会议。会议听取了市公路管理局关于市公路桥梁工程局、市公路勘察设计院转企改制工作情况介绍，并对转企改制工作中急需解决的问题进行了研究。现将会议确定事项纪要如下：

一、会议认为，为进一步做强做大市交通投资公司，市公路桥梁工程局、市公路勘察设计院转企改制后作为市交通投资公司





林刘
印晓

公司十分必要。在转企改制过程中，各有关部门应切实做好相互衔接工作，稳步推进，确保干部职工权益不受到损害。

二、会议确定，根据市七届人民政府第 88 次常务会议确定的“老人老办法，新人新办法”的原则，同意市公路桥梁工程局，市公路勘察设计院在编人员继续纳入事业单位人员管理。



报：刘捷市长，廖晓凌副市长，喻国杰秘书长，廖茂侦副秘书长，王新平副主任。

发：市财政局，市人保局，市公路管理局，市编委办。

新余市人民政府办公室秘书科

2012年8月28日印发



新余市机构编制委员会文件

余编字〔2010〕51号

关于将市公路桥梁工程局 和市勘察设计院转企改制的通知

市公路管理局：

根据市委、市政府《关于进一步深化事业单位分类改革的意见》（余发〔2009〕6号）和市七届人民政府第88次常务会议精神，经研究，现将市公路桥梁工程局等两个事业单位改制为企业有关事项通知如下：

一、改制目标

将市公路桥梁工程局和市勘察设计院两个事业单位成建制改制为企业，不再列入事业单位管理序列。

二、改制内容

（一）按照“老人老办法、新人新办法”的原则，对改制为企业的原在编人员保留其事业单位身份不变，但不再列入事业单位人员管理范围。





林刘
印晓

(二) 上述两单位原共 35 名 (市公路桥梁工程局 20 名, 市勘察设计院 15 名) 事业编制由市机构编制委员会办公室收回管理。

(三) 根据《事业单位登记管理条例》有关规定, 市公路桥梁工程局和市勘察设计院改制为企业后, 应在规定的时间内, 到市事业单位登记管理局办理注销登记手续。

二〇一〇年十一月三十日



主题词: 机构 改企 市公路桥梁工程局等 通知

抄报: 省编委办

抄送: 市委办公室, 市政府办公室, 市委组织部, 市财政局,
市人力资源和社会保障局, 市交通运输局。

新余市机构编制委员会办公室综合科 2010 年 11 月 30 日印发

校对: 胡小明

(共印 20 份)



(六)-2 拟委任的项目经理和项目总工资历表

姓名 林刘	钟海辉	年 龄	49 岁	专 业	公路与桥梁
技术职称 印晓	高级工程师	学 历	本科	拟在本标段工程任职	项目总工
工作年限	17 年			类似施工经验年限	2 年
毕业学校	2008 年 1 月毕业于 南昌工程学院 学校 土木工程 专业, 学制 3 年				
经 历					
时 间	参加过的类似工程项目名称			担任职务	发包人及联系电话
2021 年 09 月 18 日 ~ 2022 年 12 月 28 日	宜宾经南溪至泸州快速通道(南溪段)项目			项目总工	四川宜宾龙投发展集团有限公司 13708297700
2022 年 12 月 29 日 ~ 2023 年 11 月 17 日	S222 分宜县金鸡布至峡石段二级公路改建(K0+000~K12+780)路面工程			项目总工	新余市公路事业发展中心分宜分中心 18979031955
获奖情况		无			
本人 <u>钟海辉</u> (亲笔签字) 知晓自己为本项目的 <u>项目总工</u> (填写项目经理或项目总工), 并对其真实性负责。					
备 注		我司拟派往 <u>省道 S350 线肇庆广宁石涧至丰田段安全提升工程(施工)</u> (项目名称) 的 <u>钟海辉</u> (姓名) (项目总工) 现阶段未在其他项目上任职。目前在公司负责人员管理工作			

注:

1. 本表应填写项目经理和项目总工相关情况。
2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料
3. 目前未在具体项目上任职的, 请在备注栏说明现在负责的工作内容。。



身份证



毕业证





职称证

林刘
印晓

江西省高级专业技术 资格证书

江西省人力资源和社会保障厅

编号:
No.: 12023134

姓名: 钟海辉

Full Name

身份证

ID Number

资格名称: 高级工程师

Qualification

专业名称: 公路与桥梁

Profession

批准日期: 2015年11月19日

Approval Date

批复文件: 赣人社字〔2016〕5号

Approval Document

工作单位: 新余市公路管理局分宜分局

Work Unit

管理号: 3600015200393

File No.

签发单位盖章:

Issued by

签发日期:

Issued on





安全生产考核 B 证

交通运输工程施工单位安管人员安全生产考核管理系统信息公共查询平台

Public Information Query Platform for the Safety Production Assessment Management System of Safety Management Personnel in Transportation Engineering Construction Units

企业用户登录 | 首页

证书详细信息

证书编号: 赣交安B16G00218
发证时间: 2016-12-12
有效时间: 2028-12-12
证书状态: 有效
姓 名: 钟海辉
性 别: 男
出生日期: 1976/7/14
企业名称: 江西省四通路桥建设集团有限公司

照



考试咨询电话:0791-86243058, 考核、调动等业务咨询电话:0791-86733082

公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产 管理人员安全生产考核合格证书

姓名: 钟海辉 性别: 男

出生年月: 1976-07-14 身份证号: [REDACTED]

经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格, 特发此证。

企业名称: 江西省四通路桥建设集团有限公司

证书编号: 赣交安B16G00218

有效期: 2016-12-12 至 2028-12-12

考核部门: 江西省交通运输厅



中华人民共和国交通运输部监制

查询网址:

<http://jx.safetyams.cn/cxpt/PeopleDetailSeach.html?UXFOMbwRJ89ei+34SJhKPXrZHUgvfUNiNH+sjoy0JGJr3dXrq1A2FzzfoC1tk6Kr>



全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

林刘
印晓

江西省公路桥梁建设集团有限公司

最新公告 政策法规 人员信息 企业信息 资质记录 信用评级评价 企业在建项目信息 企业变更记录 企业转移历史记录

姓名: 请输入查询条件

搜索

人员信息

序号	姓名	性别	毕业学校	学历	专业	备注
1	周兴无	男	南昌水利水电专科学校	大专	道路工程	
2	梁德生	男	南昌水利水电专科学校	大专	道路工程	
3	张蜀祥	男	江西经济管理学院	本科	工业企业管理	
4	金国文	男	长沙交通学院	本科	公路工程	
5	杨超军	男	南昌大学	大专	土木工程	
6	唐文红	女	重庆交通学院	大专	道路工程	
7	刘国	男	江西省交通学校	中专	公路与桥梁	
8	胡德生	男	南昌水利水电专科学校	大专	道路工程	
9	李云超	男	西安公路交通大学	大专	公路桥梁	
10	徐敏	男	江西气象学校	中专	计算机信息管理	
11	韩小忠	男	江西财经大学	本科	会计学	
12	钟海辉	男	南昌工程学院	本科	土木工程	
13	胡小敏	女	江西财经学院	大专	贸易经济	
14	孔小忠	男	华东理工大学	大专	土木工程	
15	梁超军	男	重庆交通学院	本科	公路与城市道路工程	

1 2 3 ... 23 下一页 到第 页 确定 共316条

相关链接

北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省
吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省
福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省
广东省 广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省
云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区
新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团



附件下载



联系我们



政府网站 找错

全国公路建设市场监督管理系统
Copyright © 2011-2021 中华人民共和国交通运输部



全国公路建设市场监督管理系统

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

人无信不立 业无信不立

林刘印晓

用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名	钟海辉	毕业院校	南昌工程学院
性别	男	所学专业	土木工程
学历	本科	开始工作年份	

学历

职称信息		执业资格信息		履历信息		个人业绩 (2025.1.1之前录入)		个人业绩 (2025.1.1之后录入)	
序号	职称	证书编号	职称专业	职称专业	核发机关	核发日期	职称	核发日期	职称
1	助理工程师	赣初字 (工程) 842002A1006	路桥	江西省公路局	江西省公路局	2003-03-30	助理	2003-03-30	助理
2	工程师	3605000304100019	公路工程	新余市人力资源和社会保障局	新余市人力资源和社会保障局	2011-03-25	助理	2011-03-25	助理
3	高级工程师	12023134	公路与桥梁	江西省职称工作办公室	江西省职称工作办公室	2016-04-15	助理	2016-04-15	助理

相关链接

北京市
天津市
河北省
山西省
内蒙古自治区
辽宁省
吉林省
黑龙江省
上海市
江苏省
浙江省
安徽省
江西省
河南省
湖北省
湖南省
广东省
广西
广西壮族自治区
四川省
贵州省
云南省
西藏自治区
陕西省
甘肃省
青海省
宁夏回族自治区
新疆维吾尔自治区
新疆生产建设兵团

内蒙古自治区
浙江省
安徽省
湖北省
湖南省
四川省
贵州省
青海省
宁夏回族自治区

辽宁省
安徽省
湖南省
贵州省
宁夏回族自治区

附件下载
联系我们



全国公路建设市场监督管理系统
Copyright © 2017-2027 中华人民共和国交通运输部



林刘印晓

全国公路建设市场监督管理系统

- 首页
- 政策法规
- 工作动态
- 从业企业
- 从业人员

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名	钟海辉	毕业院校	南昌工程学院
性别	男	所学专业	土木工程
学历	本科	开始工作年份	



申报

职称信息		执业资格信息		历史信息		个人业绩 (2025.1.1之前录入)		个人业绩 (2025.1.1之后录入)	
序号	注册类别	注册等级	发证机关	证书编号	发证日期	注册有效期限	申报	注册有效期限	申报
1	安全员	B类	江西省交通运输厅	赣交安B16G00218	2016-12-12	2028-12-12	申报	2028-12-12	申报
2	注册建造师	公路工程一级	中华人民共和国住房和城乡建设部	赣1362007200802456	2025-11-07	2028-11-06	申报	2028-11-06	申报

相关链接

- 北京市
- 天津市
- 河北省
- 山西省
- 内蒙古自治区
- 辽宁省
- 吉林省
- 黑龙江省
- 上海市
- 浙江省
- 安徽省
- 江西省
- 山东省
- 河南省
- 湖北省
- 湖南省
- 广东省
- 广西壮族自 治区
- 四川省
- 贵州省
- 云南省
- 陕西省
- 甘肃省
- 青海省
- 宁夏回族自治区
- 新疆维吾尔自治区
- 新疆生产建设兵团

- 内蒙古自治区
- 浙江省
- 湖北省
- 四川省
- 青海省

- 辽宁省
- 安徽省
- 湖南省
- 贵州省
- 宁夏回族自治区

附件下载

联系我们



全国公路建设市场监督管理系统

Copyright © 2017-2027 中华人民共和国交通运输部



全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

林刘印晓

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名	钟海辉	毕业院校	南昌工程学院
性别	男	所学专业	土木工程
学历	本科	开始工作年份	

申报

职称信息		执业资格信息		履历信息		个人业绩 (2025.1.1之前录入)		个人业绩 (2025.1.1之后录入)	
序号	公司名称	职业资格	职称类型	职称	任职状态	任职时间	离职时间	申报	申报
1	江西省四通路桥建设集团有限公司		其他	技术管理人员	在职				

相关链接

北京市
天津市
河北省
黑龙江省
吉林省
辽宁省
上海市
江苏省
浙江省
安徽省
福建省
广东省
山东省
河南省
湖北省
湖南省
广西壮族自治区
四川省
贵州省
云南省
陕西省
新疆维吾尔自治区
新疆生产建设兵团

山西省
江西省
河南省
重庆市
甘肃省

内蒙古自治区
浙江省
湖北省
四川省
青海省

辽宁省
安徽省
湖南省
贵州省
宁夏回族自治区



全国公路建设市场监督管理系统

Copyright © 2017-2027 中华人民共和国交通运输部



全国公路建设市场监督管理系统

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

人无信不立 业无信不兴

林刘印晓

用户登录

施工人员姓名查询

请输入您要查询的人员姓名

搜索

基本信息

姓名	钟海琛	专业资格	南昌工程学院
性别	男	所学专业	土木工程
学历	本科	开始工作年限	

经历

任职信息		执业资格信息		历史信息		个人信息 (2025.1.1之前录入)		个人信息 (2025.1.1之后录入)	
序号	项目名称	单位名称	标准名称	工作单位	职务	开始日期	结束日期	开始日期	结束日期
1	S2225分宜县金洞乡至峡石段二级公路改建工程 (K0+000~K12+760) 路面工程	江西赣西公路桥梁有限公司	江西赣西公路桥梁有限公司	项目经理		2022-12-29	2025-11-17		零报
2	宜黄县至乐安公路快速通道 (南溪段) 项目	江西赣西公路桥梁有限公司	江西赣西公路桥梁有限公司	项目经理		2021-06-16	2022-12-28		零报

相关链接

- 北京市
- 天津市
- 河北省
- 山西省
- 内蒙古自治区
- 辽宁省
- 吉林省
- 黑龙江省
- 上海市
- 江苏省
- 浙江省
- 安徽省
- 江西省
- 广东省
- 广西壮族自治区
- 四川省
- 贵州省
- 云南省
- 陕西省
- 甘肃省
- 青海省
- 宁夏回族自治区
- 新疆维吾尔自治区
- 新疆生产建设兵团

- 内蒙古自治区
- 浙江省
- 湖北省
- 湖南省
- 四川省
- 贵州省
- 宁夏回族自治区

- 辽宁省
- 安徽省
- 湖南省
- 贵州省
- 宁夏回族自治区

附件下载

联系我们



全国公路建设市场监督管理系统
Copyright © 2017-2027 中华人民共和国交通运输部



全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

林刘印晓

首页政策法规工作动态从业企业从业人员

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名	钟海辉	毕业院校	南昌工程学院
性别	男	所学专业	土木工程
学历	本科	开始工作年份	

打印

序号	项目名称	执业资格证书	单位名称	工作经历	个人业绩 (2025.1.1之前录入)	个人业绩 (2025.1.1之后录入)	在岗截止日期	在岗截止日期
无记录								

相关链接

北京市	天津市	河北省	山西省	内蒙古自治区	辽宁省
吉林省	黑龙江省	上海市	江苏省	浙江省	安徽省
福建省	江西省	山东省	河南省	湖北省	湖南省
广东省	广西壮族自治区	海南省	重庆市	四川省	贵州省
云南省	西藏自治区	陕西省	甘肃省	青海省	宁夏回族自治区
新疆维吾尔自治区	新疆生产建设兵团				



全国公路建设市场监督管理系统
Copyright © 2017-2027 中华人民共和国交通运输部



企业名称	四川路桥建设集团有限公司		
工程名称	宜仁线南溪至泸州快速通道（南溪段）项目	项目类型	一级公路
合同编号	75493.9236	估算价（万元）	72010.5314
合同工期	2020-04-08	合同段名称	/
开工日期		竣工日期	2022-12-28
建设状态	已完工	建设状态	总包已建
合同段桩号	K0+000	合同段结束桩号	K22+281
质量评定情况	合格	所在省份	四川省
标段代码	G353		
主要工程数量	本项目全长：22.281Km，公路等级为：一级公路，路面类型为：沥青混凝土路面，设计速度为60Km/h，一般路段路基宽度为23m，双向4车道，桥涵设计荷载等级为公路-I级。本合同段主要工程数量：1.路基工程：路基挖土方272万m ³ ，路基填方302万m ³ ，特殊路基处理碎石桩约9.6万m ³ ，排水工程：边沟37Km，截水沟2753 m ³ ；急流槽333 m ³ ，泄水坑1处；防护：护脚、踏步2000m ³ ；边坡防护浆砌片石：拱形骨架3万m ³ ；浆砌片石+预制块排水沟21.1Km；2.路面工程：级配碎石垫层46.6万平方，水泥稳定碎石基层44万m ² ，沥青混凝土面层43.6万m ² ；3.桥涵工程：钢筋混凝土板桥2418.92米/45道，单跨跨径64米/1道，桥梁4座全长851米（其中杨湾大桥长367米，工程造价2700万元，上部结构为4×30+4×30+4×30m预应力T梁结构，下部结构采用盖梁柱式墩，桩基础；草坝大桥长88m，工程造价867万元，上部结构为2×40m预应力T梁结构，下部结构采用盖梁柱式墩，桩基础；铁六田中桥长99m，工程造价884万元，上部结构为3×30m简支T梁结构，下部结构采用盖梁柱式墩，桩基础；龙塘冲中桥长97m，工程造价814万元，上部结构为3×30m简支T梁结构，下部结构采用盖梁柱式墩，桩基础。）；4.交安工程：波形护栏22.281Km，红绿灯5套，标线3.2万m ² ，各类标志牌110套。5.绿化及其他工程：栽植乔木0.71万株，小叶女贞球2.1万株，小琴丝竹0.5万丛，撒播草籽15万平方，挂网植草30万平方，公路平面交叉28处。		

人员履约信息

序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	刘晓林	项目经理	2021-09-18~2022-12-28
2	钟海辉	项目总工	2021-09-18~2022-12-28
3	周小兰	项目副经理	2020-01-02~2022-12-28
4	舒俊雅	项目副经理	2020-01-02~2022-12-28
5	胡小勇	项目副总工	2020-01-02~2022-12-28
6	黄元	项目副总工	2020-01-02~2022-12-28
7	邵凡	工程部门负责人	2020-01-02~2022-12-28
8	占磊	质检负责人	2020-01-02~2022-12-28
9	王娟	技术员	2020-01-02~2022-12-28
10	廖浩辉	安全负责人	2020-01-02~2022-12-28

申报

四川路桥建设集团



林刘
印晓

企业名称	江西省四通路桥建设集团有限公司		
工程名称	S222分宜县金鸡布至峡石段二级公路改建（K0+000-K12+780）路面工程		
合同价（万元）	5080.8016	项目类型	其他工程
技术等级	二级公路	结算价（万元）	5093.2609
开工日期	2022-11-10	合同段名称	S222分宜县金鸡布至峡石段二级公路改建（K0+000-K12+780）路面工程
竣工日期		完工日期	2023-11-17
合同段开始桩号	K0+000	建设状态	总包已建
质量评定情况	合格	合同段结束桩号	K12+780
项目代码		所在省份	江西省

本合同段主要工程量为：本项目桩号范围为K0+000~K12+780，全长12.78公里，公路设计等级为公路二级，路面类型为沥青混凝土路面，主要工程量如下：一、路基工程：1.路基挖土方313.675m³；2.挖除路肩填38.52m³；3.填削（4+6）cm沥青面层737m²；4.铣刨20cm上基层124.02m³；二、路面工程：1.水泥稳定碎石下基层159346m²；2.调平层2879.1m³；3.水泥稳定碎石上基层145874m²；4.透层+封层+粘层1592.37m³；5.中粒式沥青混凝土（AC-20）146321m²；6.细粒式沥青混凝土（AC-13）139491m²；7.浆砌片石路肩墙5680.3m³；8.浆砌片石路肩墙（C25商品砼）1592.37m³；三、安全设施工程：1.波形梁护栏（三波）：10866m，178个端头；2.波形梁护栏（二波）：468m，40个端头；3.标线（含震动标线）：5864m²及各类标志牌等。四、该项目主要人员为：1、项目经理：刘晓林；2、项目副经理：袁会军、舒俊翔；3、项目总工程师：钟海辉；4、项目副总工：袁智、黄龙；5、安全负责人：占晨。

人员履约信息

序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	黄龙	项目副总工	2022-11-10-2023-11-17
2	袁会军	项目副经理	2022-11-10-2023-11-17
3	舒俊翔	项目副经理	2022-11-10-2023-11-17
4	占晨	安全负责人	2022-11-10-2023-11-17
5	钟海辉	项目总工	2022-12-29-2023-11-17
6	刘晓林	项目经理	2022-12-29-2023-11-17
7	袁智	项目副总工	2022-11-10-2023-11-17

申报



江西省社会保险个人参保证明



林刘
印晓

个人基本信息					
姓名	钟海辉	身份证号	360521197607141014		性别
当前参保情况					
个人社保编号	险种名称	参保状态	参保地	参保单位名称	
360574354446	补充工伤保险(部分省份使用)	参保缴费	新余市分宜县	新余市公路事业发展中心分宜分中心	
360574354446	工伤保险	参保缴费	新余市分宜县	新余市公路事业发展中心分宜分中心	
360574354446	失业保险	参保缴费	新余市分宜县	新余市公路事业发展中心分宜分中心	
360574354446	机关事业单位工作人员基本养老保险	参保缴费	新余市市本级	新余市公路事业发展中心分宜分中心	
360574354446	职业年金	参保缴费	新余市市本级	新余市公路事业发展中心分宜分中心	
社会保险缴费明细					
个人社保编号	险种名称	缴费起止年月	月缴费基数	是否到账	缴费单位名称
360574354446	失业保险	202511-202512	12437.5	是	新余市公路事业发展中心分宜分中心
360574354446	工伤保险	202511-202512	12437.5	是	新余市公路事业发展中心分宜分中心
360574354446	机关事业单位工作人员基本养老保险	202501-202512	12437.5	是	新余市公路事业发展中心分宜分中心
360574354446	机关事业单位工作人员基本养老保险	202401-202412	12131	是	新余市公路事业发展中心分宜分中心
360574354446	机关事业单位工作人员基本养老保险	202301-202312	11784	是	新余市公路事业发展中心分宜分中心
360574354446	机关事业单位工作人员基本养老保险	202201-202212	7136	是	新余市公路事业发展中心分宜分中心
360574354446	机关事业单位工作人员基本养老保险	202101-202112	6905	是	新余市公路事业发展中心分宜分中心
360574354446	机关事业单位工作人员基本养老保险	202001-202012	6816	是	新余市公路事业发展中心分宜分中心
360574354446	机关事业单位工作人员基本养老保险	201901-201912	6727	是	新余市公路事业发展中心分宜分中心
360574354446	机关事业单位工作人员基本养老保险	201801-201812	5447	是	新余市公路事业发展中心分宜分中心
360574354446	机关事业单位工作人员基本养老保险	201701-201712	5369	是	新余市公路事业发展中心分宜分中心
360574354446	机关事业单位工作人员基本养老保险	201601-201612	4857	是	新余市公路事业发展中心分宜分中心
360574354446	机关事业单位工作人员基本养老保险	201501-201512	4805	是	新余市公路事业发展中心分宜分中心
360574354446	机关事业单位工作人员基本养老保险	201410-201412	4805	是	新余市公路事业发展中心分宜分中心
360574354446	职业年金	202501-202512	12437.5	是	新余市公路事业发展中心分宜分中心
360574354446	职业年金	202401-202412	12131	是	新余市公路事业发展中心分宜分中心
360574354446	职业年金	202301-202312	11784	是	新余市公路事业发展中心分宜分中心
360574354446	职业年金	202201-202212	7136	是	新余市公路事业发展中心分宜分中心
360574354446	职业年金	202101-202112	6905	是	新余市公路事业发展中心分宜分中心
360574354446	职业年金	202001-202012	6816	是	新余市公路事业发展中心分宜分中心
360574354446	职业年金	201901-201912	6727	是	新余市公路事业发展中心分宜分中心
360574354446	职业年金	201801-201812	5447	是	新余市公路事业发展中心分宜分中心
360574354446	职业年金	201701-201712	5369	是	新余市公路事业发展中心分宜分中心
360574354446	职业年金	201601-201612	4857	是	新余市公路事业发展中心分宜分中心



江西省社会保险个人参保证明



林刘
印晓

36057354446	职业年金	201501-201512	4805	是	新余市公路事业发展中心分宜分中心
36057354446	职业年金	201410-201412	4805	是	新余市公路事业发展中心分宜分中心
36057354446	补充工伤保险(部分省份使用)	202511-202512	12437.5	是	新余市公路事业发展中心分宜分中心

申请查询日期 2026年01月04日



证 明

兹证明江西省四通路桥建设集团有限公司系新余市公路事业发展中心(原名称:新余市公路管理局)下属国有企业,其人员由新余市公路事业发展中心及各下属单位人员共同组成,由于现处于改制阶段,人员社保仍在各单位缴纳,各下属单位包括:

- 1、新余市公路事业发展中心渝水分中心(原名称:新余市公路管理局渝水分局);
- 2、新余市公路事业发展中心分宜分中心(原名称:新余市公路管理局分宜分局);
- 3、新余公路勘察设计院;
- 4、新余市公路桥梁工程局。

特此证明!

新余市公路事业发展中心

2022年1月19日





关于江西省四通路桥建设集团有限公司
社保情况证明

江西省四通路桥建设集团有限公司成立于1996年12月，与新余市公路桥梁工程局为“两块牌子一套人员”，人员由新余市公路事业发展中心（原新余市公路管理局）及其各下属单位人员共同组成，按事业单位管理，主管单位为新余市公路事业发展中心。

根据新余市委、市政府深化事业单位分类改革要求，于2010年将新余市公路桥梁工程局事业单位成建制改制为企业（江西省四通路桥建设集团有限公司），按照“老人老办法、新人新办法”的原则，原人员社保还在原单位缴纳，主管单位为新余市公路事业发展中心，监管单位为新余市国有资产监督管理委员会。

特此证明！

新余市国有资产监督管理委员会

二〇二〇年三月二十七日





新余市人民政府常务会议 记 录 摘 要

新余市人民政府办公室

2010 年 11 月 30 日

市七届人民政府第 88 次常务会议纪要

2010 年 11 月 18 日，市长魏旋君主持召开市七届人民政府第 88 次常务会议。常务副市长何萍高，副市长胡高平、陈九根、林彬杨，市政府秘书长刘新政出席会议。副市长万筱明、王跃辉，市政府党组成员、市监察局局长刘永华因公请假。市人大常委会副主任陈秉正、市政协副主席涂绪永，新余高新区党工委书记贺为华应邀参加会议。列席会议人员有：市政府副秘书长、办公室主任廖茂侠，市政府副秘书长刘伟、一帆、王钦国、董海涛、敖新春、黄小基、袁传胜、魏小忠。专题列席会议的有：市委副秘书长谭武先，市统筹办单巍全，市综治办王东，市编委办涂群，市发改委林愚，市工信委任光明，市教育局胡建华，市





林刘
印晓

科技局钟岳梯，市公安局肖秋根，市监察局蔡小莲，市财政局徐绍荣，高剑，市人保局徐国梁，市国土资源局钟兆辉，黄正根，市住建委龚成效，何祝生，市交通运输局张向东，市水务局黎兵根，市农业局刘和平，市林业局何筱勇，市商务局彭水明，市文新局林舒，市环保局邹建福，市国资委鄢剑华，市统计局刘日东，市安监局李志宏，市规划局黄红阳，市政府法制办萧飞云，市房管局刘晓云，市公路局艾绍平，高新区管委会李绪先，黄敏勇，分宜县政府赖新云，渝水区政府徐文泊，仙女湖区管委会张晓明，孔目江区管委会钱传宇，市总工会李国俊，市市场建设办简桃生，市高铁新区指挥部罗忠，市交通投资公司杜元生，北湖宾馆黄立新，云南盛世同创公司徐清泉以及市检察院有关人员。

一、会议讨论了《中共新余市委关于制定全市国民经济和社会发展的第十二个五年规划的建议》。会议认为，“十二五”时期，是我市积极融入鄱阳湖生态经济区、加快建设国家新能源科技城、努力建成赣西区域中心城市的重要时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式、全面建设小康社会的关键时期。要深刻分析形势，把握发展大势，增强前瞻性和战略性，突出科学性和时代性，体现包容性和基础性，认真制定并精心实施“十二五”规划，在新的起点上推进我市科学发展、绿色崛起。会议确定，由市发改委根据会议所提意见尽快修改完善后报市委。

二、会议听取了市住建委《关于保定市德州市建设低碳城市的考察报告》。会议认为，低碳城市作为城市发展的一个方向和目标，具有十分重大而现实的意义。我市新能源产业基础雄厚，建设低碳城市具备较好条件。要发展低碳经济，培育低碳产业，推进能源结构调整，构建低碳产业支撑体系，加快低碳技术开发与应用，推进清洁生产。要树立低





林刘
印晓

碳理念，建设低碳社会；实施低碳化管理，加强节能减排。要加强领导，落实责任；加强宣传，营造氛围。会议确定，建设低碳城市工作由市发改委牵头推进，落实好成立领导小组、编制规划、起草实施意见等工作。

三、会议讨论并原则同意市交通投资公司提请的《新余市交通建设投资有限公司组建方案》。会议确定，由林彬杨副市长负责协调江西省四通路桥建设集团有限公司和新余公路勘察设计院作为市交通建设投资公司子公司参与企业经营管理有关事宜；由市编委办按照“老人老办法，新人新办法”原则，将市公路桥梁工程局和市公路勘察设计院成建制改制为企业，原事业单位人员身份保留不变；市公路局要做好事业单位改企人员的思想工作，确保稳定。

四、会议讨论了市安监局《关于要求对新余前卫化工有限公司“10·9”顺丁烯二酸酐泄露事故调查处理意见进行批复的请示》，会议同意市安监局调查处理意见，并强调，对于发生生产安全责任事故的企业，各地各职能部门要严厉处罚，严肃教育，严格管理，坚决停产整顿，该关闭的坚决关闭；要加强督促检查，对通过安全评价验收或达到整改要求后，要及时组织恢复生产，确保企业安全生产。会议要求高新区管委会尽快制定新余前卫化工有限公司搬迁方案。

五、会议讨论了高新区管委会《关于同意建设江西新余广域国际家居建材博览中心的请示》。会议确定：（一）同意收回新余华峰电器厂原址和新余市植物油厂现址土地使用权，按商业用地性质以招拍挂方式公开出让，江西新余广域国际家居建材博览中心可通过土地市场取得该宗地的土地使用权。（二）所涉地块中的原居住用地调整为商业用地。（三）所涉地块的地上建筑、附着物的拆迁补偿工作由高新区管委会负责。（四）合理确定收回市植物油厂现址土地的补偿费用，确保市植物油厂顺利改制。



林刘
印晓

六、会议讨论了市发改委提请的《新余市政府与江西省铁路投资集团公司关于新余市铁路建设土地运作地块公开出让协议》。会议确定：(一)市政府参与参股杭长铁路运作的 180 亩土地起拍价为 50 万/亩，土地出让金在扣除 25 万元/亩和出让成本之和后，余额拨付给省铁路投资集团公司指定参与摘牌的房地产子公司。(二)由市发改委根据会议所提意见修改完善后再与省铁路投资集团公司协商。

七、会议审议并通过市政府法制办提请的《新余市行政调解办法(草案)》。会议指出，为推动我市行政机关主动、及时化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定，制定该办法是必要的。会议确定，以市政府令公布施行《新余市行政调解办法》。

八、会议讨论了高铁新区指挥部《关于虎踞大道市政工程设计费用的请示》。会议同意中交第二航务工程勘察设计院有限公司中标虎踞大道市政工程设计项目，中标价格为 475 万元(其中工程可行性研究报告编费 50 万元)，经费由高铁新区自筹。

九、会议讨论了《新余迎宾馆建设工程实施方案》。会议指出，为进一步提高我市接待能力，完善城市功能，提升城市品位和整体形象，建设新余迎宾馆是必要的。会议原则同意《实施方案》。

十、会议讨论了市财政局《关于解决迎国检上吉线大中修工程路面结构调整增加经费的意见》，会议确定，在市财政公解中解决万元用于迎国检上吉线大中修工程路面结构调整增加

十一、其他事项

会议还听取了市住建委关于城北广场改造情况的汇报，由步步高公司对城北广场进行改造，并向市委常委会汇报。





发：市委书记，市政府市长，市委副书记，市人大常委会主任，市政协主席，市委常委，市政府副市长、秘书长、党组成员、副秘书长。

送：市委办，市人大常委会办，市政协办，市编委办，市发改委，市财政局，市国土资源局，市住建委，市交通运输局，市环保局，市安监局，市规划局，市政府法制办，市中小企业局，市公路局，市高铁新区指挥部，市交通投资公司，高新区管委会。

新余市人民政府办公室秘书科

2010年12月2日印发



市七届人民政府第 88 次常务会议纪要征求意见单

征求意见单位名称：市公路局

议题名称	草 拟 稿
三、会议讨论并原则同意市交通投资公司提出的《新余市交通建设投资有限公司组建方案》。	会议确定，由林彬杨副市长负责协调江西省四通路桥建设集团有限公司和新余公路勘察设计院作为市交通建设投资公司子公司参与企业经营管理有关事宜；由市国资委办负责按照新办法、老人老办法，保留原事业单位人员身份不变的原则，将市公路桥梁工程局和市公路勘察设计院成建制改制为企业；市公路局要做好单位员工思想工作，确保社会稳定。





新余市人民政府专题办公会议 纪 要

[2012]49号

新余市人民政府办公室

市公路桥梁工程局市公路勘察设计院 转企改制有关问题协调会议纪要

2012年8月22日下午，受市委常委、副市长廖晓凌的委托，市政府办公室副主任王新平主持召开了市公路桥梁工程局、市公路勘察设计院转企改制有关问题协调会，市人保局龚伟斌，市编委办罗城江，市公路管理局龚成效，邓柯等参加了会议。会议听取了市公路管理局关于市公路桥梁工程局、市公路勘察设计院转企改制工作情况介绍，并对转企改制工作中急需解决的问题进行了研究。现将会议确定事项纪要如下：

一、会议认为，为进一步做强做大市交通投资公司，市公路桥梁工程局、市公路勘察设计院转企改制后作为市交通投资公司



- 1 -



林刘
印晓

公司十分必要。在转企改制过程中，各有关部门应切实做好相互衔接工作，稳步推进，确保干部职工权益不受到损害。

二、会议确定，根据市七届人民政府第 88 次常务会议确定的“老人老办法，新人新办法”的原则，同意市公路桥梁工程局，市公路勘察设计院在编人员继续纳入事业单位人员管理。



报：刘捷市长，廖晓凌副市长，喻国杰秘书长，廖茂侦副秘书长，王新平副主任。

发：市财政局，市人保局，市公路管理局，市编委办。

新余市人民政府办公室秘书科

2012年8月28日印发



新余市机构编制委员会文件

余编字〔2010〕51号

关于将市公路桥梁工程局 和市勘察设计院转企改制的通知

市公路管理局：

根据市委、市政府《关于进一步深化事业单位分类改革的意见》（余发〔2009〕6号）和市七届人民政府第88次常务会议精神，经研究，现将市公路桥梁工程局等两个事业单位改制为企业有关事项通知如下：

一、改制目标

将市公路桥梁工程局和市勘察设计院两个事业单位成建制改制为企业，不再列入事业单位管理序列。

二、改制内容

（一）按照“老人老办法、新人新办法”的原则，对改制为企业的原在编人员保留其事业单位身份不变，但不再列入事业单位人员管理范围。





林刘
印晓

(二) 上述两单位原共 35 名 (市公路桥梁工程局 20 名, 市勘察设计院 15 名) 事业编制由市机构编制委员会办公室收回管理。

(三) 根据《事业单位登记管理条例》有关规定, 市公路桥梁工程局和市勘察设计院改制为企业后, 应在规定的时间内, 到市事业单位登记管理局办理注销登记手续。

二〇一〇年十一月三十日



主题词: 机构 改企 市公路桥梁工程局等 通知

抄报: 省编委办

抄送: 市委办公室, 市政府办公室, 市委组织部, 市财政局,
市人力资源和社会保障局, 市交通运输局。

新余市机构编制委员会办公室综合科 2010 年 11 月 30 日印发

校对: 胡小明

(共印 20 份)



八、其他材料

林刘
印晓

提供“八-1、使用广东省信用评价等级的申请承诺书”；

“八-1、使用广东省信用评价等级的申请承诺书”我司不适用

2. 提供“八-2、拟配备本项目的人员及主要机械设备承诺书”；

“八-2、拟配备本项目的人员及主要机械设备承诺书”后附

3. 提供“八-3 不拖欠工人工资承诺书”

“八-3 不拖欠工人工资承诺书”后附

4. 提供“八-4 投标人的自评分表”

“八-4 投标人的自评分表”后附

5. 提供最新年度广东省公路工程从业单位（施工单位）信用评价等级（若有），并标识单位所在位置。

我司最新年度广东省公路工程从业单位（施工单位）信用评价等级为 B 级，标识单位所在位置后附

6. 初次进入广东省的，但在最新年度的全国综合评价结果为 C 级或 D 级的，提供最新年度的全国综合评价结果单位查询所在页。

我司不是初次进入广东省，但在最新年度的全国综合评价结果为 AA 级，最新年度的全国综合评价结果单位查询所在页后附

7. 如上一年度有信用评价而最新年度在广东省无信用等级的需提供上一年度的信用评价（若有），并标识单位所在位置。

我司最新年度在广东省信用等级为 B 级，标识单位所在位置后附

8. 详细说明投标人投标文件递交截止日前 1 年内，因公路工程（含附属设施）质量、安全、履约问题或招标投标问题等原因被交通运输部行政处罚、广东省交通运输厅行政处罚或正式约谈、招标项目所在地地级以上市交通运输局行政处罚的文件。

说明后附

9. 投标人认为需要的其它内容（如体现技术能力的相关证明材料）。

专利



八-1、使用广东省信用评价等级的申请承诺书



按照《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）要求，现我单位对使用信用等级申请如下：

一、我单位在_____（项目名称）施工招标中，第_____次使用（或不使用）广东省交通运输厅发布的_____年度信用评价_____等级结果和对应等级分值。

二、我单位承诺，在递交本次申请后，我单位将失去一次使用_____等级结果（不使用时上述填“/”）参与投标的机会。当累计使用超过规定的次数，我单位同意按降低一个信用等级对应分值来认定参与投标评审。

三、如果我单位发生违反规定使用信用等级结果的情形，自愿接受省级交通运输主管部门的处理。

附件：_____单位使用_____年度广东省公路工程从业单位信用等级情况汇总表

特此承诺

投标人（单位全称）：_____

投标人的法定代表人或其委托代理人签名：_____

____年__月__日

注：

1. AA、A级信用等级企业必须填写此申请承诺书；选择“使用”时需和附表（_____单位使用_____年度广东省公路工程从业单位信用等级情况汇总表）一起编入投标文件中。
2. 中标候选人公示中，将对所有承诺使用最新年度AA、A级投标人的年度信用等级使用情况进行公开。



林刘
印晓

_____ 单位使用____ 年度广东省公路工程从业单位
信用等级情况汇总表

序号	招标人全称	标段（标类）名称	递交文件时间 （年月日）	使用信用等级 （AA/A）	备注

注：应如实填报信用评价等级使用情况的。



八-2、承诺书

拟配备本项目的人员及主要机械设备承诺书



广宁县公路事务中心（招标人名称）：

我方参加了 省道 S350 线肇庆广宁石洞至丰田段安全提升工程（施工）（项目名称）投标，若我方中标，

我方在此承诺：

1. 我公司将严格按照在投标文件中填报的项目经理、总工程师以及主要管理人员和技术人员等组织进场施工完成本项工程，并根据工程的实际需要增派相关人员。
2. 我公司将严格按照在投标文件中填报的施工机械及试验设备组织进场施工，并根据工程的实际需要增加设备。
3. 我公司承诺在接到中标通知书后 7 内将进驻施工现场，开展工程施工前期工作，并承诺在接到中标通知书后 14 日内，全部人员及设备到场率达到 70%。
4. 我公司承诺无条件接受发包人雇佣特殊分包人完成由于我单位违约而不能完成或未能完成的工程。
5. 如发包人认为我单位所报工程量清单的各章之间或工程细目中报价存在明显不平衡，我单位将无条件接受发包人对不平衡报价的调整。
6. 我公司承诺在投标文件中所提供的施工机械设备在品牌、型号、功能上满足招标人要求，各种性能指标真实有效。
7. 如我公司违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我公司中标的资格或解除施工合同，并有权没收我公司的履约担保，同时由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入全国公路建设市场监督管理系统。

投标人：四川省路桥建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：王义强（签字）

2026 年 1 月 6 日





八-3、承诺书（参考格式）

不拖欠工人工资承诺书



广宁县公路事务中心（招标人名称）：

根据国家有关规定，若我单位在 省道 S350 线肇庆广宁石涧至丰田段安全提升工程（施工）（项目名称）中成为中标人，在该项目的施工过程中，我方若需要雇佣和使用工人（包括民工）的，为保护工人的合法权益，做到不拖欠工人工资，我公司将对工人工资的支付作如下承诺：

1、我公司一定认真执行相关文件精神，本项目建筑企业工资支付保证金金额按《肇庆市建筑施工企业工资支付保证金管理办法》要求缴交，承包人须严格落实《广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法》（粤人社规〔2015〕3号）、《肇庆市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（肇人社发〔2016〕385号）及国家、地方有关规定，设立保证金专用账户及按规定比例和额度存入工人工资支付保证金，如期、足额支付工人工资，不发生拖欠现象，并且保证按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用工人，工资将直接发给工人本人；

2、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受招标人的处罚，同时愿意接受相关行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

施工企业： 江西省公路路桥建设集团有限公司（全称并加盖单位公章）

法定代表人： 刘印林（签名）

2026 年 1 月 6 日





八-4 投标人的自评分表

1	评分因素	满分	评分标准	自评分	评分情况说明	页码索引
	施工组织设计	40 分	详见招标文件第三章评标办法	40 分	施工组织设计满足评分标准的最高要求	15-85
2	项目经理任职资格与业绩	15 分	详见招标文件第三章评标办法	15 分	项目经理满足资格审查条件的最低要求	152-181
3	项目总工任职资格与业绩	15 分	详见招标文件第三章评标办法	15 分	项目总工满足资格审查条件的最低要求	182-207
4	技术能力	10 分	详见招标文件第三章评标办法	10 分	技术能力满足评分标准的最高加分要求	234-253
5	履约能力	20 分	详见招标文件第三章评标办法	18.9 分	信用等级为B级, 没有出现履约情况的扣分情形	208-233
合计		100 分	-	98.9 分	-	

投 标 人： 江西省四通路桥建设集团有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 刘 晓 （签字）





广东省交通运输厅文件

粤交基〔2025〕250号

广东省交通运输厅关于公布 2024 年度广东省 公路工程从业单位信用评价结果 (第一批) 的通知

各地级以上市交通运输局、公路事务中心，省公路事务中心，省交通集团：

按照《交通运输部办公厅关于做好 2024 年度公路建设市场信用评价工作的通知》（交办公路函〔2024〕2170 号）、《广东省交通运输厅关于组织开展 2024 年度公路工程从业单位信用评价工作的通知》（粤交基建字〔2025〕5 号）有关工作部署，结合《广东省交通运输厅关于印发交通建设市场信用管理办法的通知》（粤

— 1 —



林刘
印晓

交〔2022〕1号)、《广东省交通运输厅关于印发公路工程从业单位信用评价实施细则的通知》(粤交〔2021〕20号)有关规定,我厅组织对2024年度广东省在建公路工程建设项目建设管理行为以及设计、施工、监理、试验检测、材料供应、工程咨询等从业单位开展信用评价,并按规定对综合评价结果进行公示。现将公示无异议并经审定后的2024年度广东省公路工程从业单位信用评价结果予以公布(见附件),并提出如下要求,请各有关单位贯彻落实。

一、各有关单位要严格按照《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》(粤交基〔2014〕564号)要求落实好信用评价结果的应用工作。

二、为便于新旧年度信用评价结果的应用衔接,自2025年4月27日0时起,在招标评标过程中应用2024年度广东省公路工程从业单位信用评价结果,在此时间之前已递交投标文件的招标项目仍应用2023年度广东省公路工程从业单位信用评价结果。

三、无2024年度广东省公路工程从业单位信用评价结果的单位可延续使用其2023年度信用评价结果(信用等级为C、D级的除外),但在递交资审文件(采用资格后审招标时为投标文件)时承诺使用AA或A级信用等级的使用次数,应按照2023年度公布的信用评价结果顺延2023年度的使用次数,使用次数按《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》(粤交基〔2014〕564号)要求执行。



四、为规范信用等级的使用管理，各招标人在评标结束后，除在中标候选人公示中将信用等级使用情况公开外，须公示所有承诺使用AA、A级投标人的年度信用等级使用情况。如发现投标人承诺使用次数与实际使用次数不符的，按有关规定处理，并记入该企业信用档案。

五、各项目建设单位及其上级管理单位、各地级以上市交通运输局要进一步加强从业单位的信用管理，按照信用评价管理办法和有关要求，在招投标工作和项目日常管理工作过程中，安排专人做好从业单位的信誉情况台帐工作，并加强信用管理工作人员的业务培训，如实、客观、公正地记录和评价从业单位信用情况。同时做好从业单位信用评价动态管理工作，对符合信用等级动态降级条件的从业单位应及时上报。

联系人及电话：黄进阳，020-83730213。

附件：1.2024 年度广东省高速公路工程建设管理行为信用评价结果

2.2024 年度广东省公路工程从业单位信用评价结果





公开方式：主动公开

抄送：省交通运输工程造价事务中心、省交通运输政务服务和应急指挥中心、省交通运输规划研究中心、省交通运输建设工程质量事务中心、港珠澳大桥管理局，省南粤交通投资建设有限公司、省高速公路有限公司、省公路建设有限公司、省路桥建设发展有限公司、广东交通实业投资有限公司、广州市交通投资集团有限公司、深圳高速公路集团股份有限公司、珠海交通控股集团有限公司、佛山市交通投资集团有限公司、惠州市交通投资集团有限公司、东莞市交通投资集团有限公司。

广东省交通运输厅办公室

2025年4月25日印发



附件 1



2024 年度广东省高速公路工程建设管理行为信用评价结果
(按评价等级、单位名称拼音排序)

序号	建设单位(含代建、管理处)	项目名称	评价等级
1	东莞市路桥投资建设有限公司	甬莞-莞佛高速公路常平至虎门段及虎门港支线一期改扩建工程、狮子洋通道工程下层白沙南路段	AA
2	广东潮惠高速公路有限公司粤东分公司	揭普惠高速公路南延线工程	AA
3	广东潮汕环线高速公路有限公司	潮汕环线高速公路(含潮汕联络线)三期工程京灶大桥项目	AA
4	广东惠增高速公路有限公司	惠州至肇庆高速公路惠城至增城段	AA
5	广东交投清花高速公路管理处	清远清新至广州花都高速公路	AA
6	广东茂湛高速公路有限公司扩建工程管理处	沈阳至海口国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程	AA
7	广东省高速公路有限公司深汕西分公司扩建管理处	沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程	AA
8	广东省公路建设有限公司珠海段分公司	西部沿海高速公路申堂互通立交工程	AA
9	广东省路桥建设发展有限公司广韶分公司改扩建项目管理处	京港澳高速公路粤境清远佛冈至广州太和段改扩建项目	AA
10	广东省路桥建设发展有限公司路达分公司汕梅高速改扩建项目管理处	汕昆高速公路揭阳新亨至梅州畲江段及梅汕高速公路梅州程江至畲江段改扩建工程	AA
11	广东省路桥建设发展有限公司云梧分公司	广昆高速公路河口至平台段云浮西互通立交项目	AA
12	广东省南粤交通仁新高速公路管理处	武深高速公路始兴联络线	AA
13	广东省南粤交通吴川支线高速公路管理处	湛江机场高速公路	AA
14	广东省南粤交通雄信高速公路管理处	信丰(省界)至南雄高速公路	AA
15	广东湾区交通建设投资有限公司	狮子洋通道工程	AA
16	广深高速公路改扩建管理处	京港澳高速公路广州火村至东莞长安段及广佛高速公路广州黄村至火村段改扩建项目	AA
17	广州市北二环交通科技有限公司	沈阳至海口国家高速公路火村至龙山段改扩建工程	AA
18	广州市高速公路有限公司(南沙至中山高速公路项目)	南沙至中山高速公路项目	AA
19	黄茅海跨海通道管理中心	黄茅海跨海通道工程	AA
20	京珠高速公路广珠段有限公司	广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程	AA
21	深圳市广深沿江高速公路投资有限公司	东莞长安至深圳南山高速公路深中通道深圳侧接线和国际会展中心互通立交工程	AA
22	深中通道管理中心	深圳至中山跨江通道	AA
23	省高速公路有限公司湛江分公司建设管理处	湛徐高速公路乌石支线、兰海高速公路龙头沙港互通立交工程	AA



序号	建设单位（含代建、管理处）	项目名称	评价等级
24	省路桥建设发展有限公司中江高速公路改扩建管理处	深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程	AA
25	省南粤交通河惠莞高速公路管理中心	河惠莞高速公路龙川至寻乌（省界）支线工程	AA
26	东莞发展控股股份有限公司	珠三角环线东莞至深圳高速公路塘厦至东城段及龙林支线改扩建工程	A
27	广东佛清广高速公路发展有限公司	佛（山）清（远）从（化）高速公路北段	A
28	广东广珠西线高速公路有限公司	广珠西线高速公路机器人谷互通立交工程	A
29	广东省高速公路有限公司粤赣河惠改扩建工程管理处	长春至深圳国家高速公路河源热水至惠州平南段改扩建项目	A
30	广东阳信高速公路有限公司	阳春至信宜（粤桂界）高速公路	A
31	广州机场第二高速公路有限公司	广州新白云国际机场第二高速公路南段工程	A
32	广州市高速公路有限公司增天高速公路项目管理处	广州增城至佛山高速公路（增城至天河段）工程	A
33	江门市银洲湖高速公路有限公司	江门蓬江至新会高速公路（银洲湖高速公路）	A
34	深圳市外环高速公路投资有限公司	深圳外环高速公路深圳段三期（坑梓至大鹏段）工程	A
35	云浮市广云高速公路有限公司改扩建管理处	G80 广昆高速公路（粤境）马安至河口段改扩建工程	A
36	肇庆粤肇公路有限公司改扩建管理处	G80 广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程	A
37	中电建（广东）中开高速公路有限公司	中山至开平高速公路项目（中山段）	A
38	中山东环高速公路有限公司	中山黄圃至翠亨高速公路（中山东部外环高速公路一期工程）、中山东部外环高速公路二期工程（中山黄圃至翠亨高速公路南北延线）	A
39	广东葛洲坝肇明高速公路有限公司	肇庆至高明高速公路项目	B
40	惠州稔平环岛高速公路有限公司	惠州稔平环岛高速公路项目	B
41	惠州市惠湾高速公路有限公司	惠州惠城至惠阳霞涌高速公路项目	B
42	江门市江鹤高速公路有限公司	深圳至岑溪高速公路江门龙湾至共和段改扩建工程	B
43	深圳惠盐高速公路有限公司	惠盐高速公路深圳段改扩建工程	B

说明：1.沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场段改扩建工程、南海至新会高速公路项目、惠州至肇庆高速公路白云至三水段项目、甬莞-莞佛高速公路常平至虎门段延长线工程、广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程横沥互通立交连接线工程、广州机场高速公路改扩建工程 6 个项目在 2024 年度无实际主体工程量，不予评价。

2.上述列表中同一信用等级的单位排名不分先后。



附件 2



2024 年度广东省公路工程从业单位信用评价结果
(按单位名称拼音排序)

一、AA 级单位 (共 68 家)

序号	从业单位名称	备注
一、设计单位 (9 家)		
1	北京交科公路勘察设计研究院有限公司	
2	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	
3	湖南省交通规划勘察设计院有限公司	
4	华设设计集团股份有限公司	
5	中国公路工程咨询集团有限公司	
6	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	
7	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	
8	中铁大桥勘测设计院集团有限公司	
9	中铁二院工程集团有限责任公司	
二、施工单位 (28 家)		
(一) 土建工程施工单位 (20 家)		
1	保利长大工程有限公司	
2	广州公路工程集团有限公司	
3	中电建路桥集团有限公司	
4	中国铁建港航局集团有限公司	
5	中交第二公路工程局有限公司	
6	中交第二航务工程局有限公司	
7	中交第四航务工程局有限公司	
8	中交第一航务工程局有限公司	
9	中交二公局第三工程有限公司	
10	中交路桥建设有限公司	
11	中交中南工程局有限公司	
12	中铁大桥局集团有限公司	
13	中铁七局集团有限公司	
14	中铁十二局集团有限公司	
15	中铁十七局集团有限公司	
16	中铁十四局集团有限公司	
17	中铁十一局集团有限公司	
18	中铁四局集团有限公司	
19	中铁隧道局集团有限公司	
20	中铁一局集团有限公司	
(二) 机电工程施工单位 (5 家)		
21	北京公科飞达交通工程发展有限公司	
22	甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	
23	广东诚泰交通科技发展有限公司	



林刘
印晓

24	广东飞达交通工程有限公司	
25	广东新粤交通投资有限公司	
(三) 交通安全设施施工单位 (3 家)		
26	广东省交通发展有限公司	
27	广东新粤交通投资有限公司	
28	江苏中路交通发展有限公司	
三、监理单位 (7 家)		
1	广东翔飞公路工程监理有限公司	
2	广州诚信工程管理有限公司	曾用名: 广州诚信公路建设监理咨询有限公司
3	武汉大通工程建设有限公司	
4	武汉桥梁建筑工程监理有限公司	
5	育才-布朗交通咨询监理有限公司	
6	中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司	
7	中咨公路工程监理咨询有限公司	
四、试验检测单位 (5 家)		
1	广东交科检测有限公司	
2	广州诚安路桥检测有限公司	
3	湖南联智科技股份有限公司	
4	深圳高速工程检测有限公司	
5	苏交科集团检测认证有限公司	
五、材料供应单位 (10 家)		
1	广东创尔实业有限公司	
2	广东省公路机械材料有限公司	
3	广东新粤物流实业有限公司	曾用名: 广东南粤物流实业有限公司
4	广州弘历商贸有限公司	
5	广州市建龙贸易有限公司	
6	广州祥圳商贸有限公司	
7	广州新粤沥青有限公司	
8	江苏普菲卡特科技有限公司	
9	深圳正章贸易有限公司	
10	中化广东有限公司	
六、工程咨询单位 (9 家)		
1	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	
2	广东省交通运输规划研究中心	
3	广东粤路勘察设计有限公司	
4	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	
5	湖南省交通规划勘察设计院有限公司	
6	华设设计集团股份有限公司	
7	中国公路工程咨询集团有限公司	
8	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	
9	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	

二、A 级单位 (共 65 家)

序号	从业单位名称	备注
一、设计单位 (11 家)		



1	保利长大工程有限公司	
2	广东粤路勘察设计有限公司	
3	广州市交通设计研究院有限公司	
4	山东省交通规划设计院集团有限公司	
5	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	
6	云基智慧工程股份有限公司	
7	中国华西工程设计建设有限公司	
8	中交公路规划设计院有限公司	
9	中交水运规划设计院有限公司	
10	中铁第四勘察设计院集团有限公司	
11	中铁长江交通设计集团有限公司	
二、施工单位（21家）		
（一）土建工程施工单位（18家）		
1	广东冠粤路桥有限公司	
2	广州市市政集团有限公司	
3	深圳市路桥建设集团有限公司	
4	四川公路桥梁建设集团有限公司	
5	中国建筑第八工程局有限公司	
6	中化学交通建设集团有限公司	
7	中建路桥集团有限公司	
8	中交一公局集团有限公司	
9	中铁八局集团有限公司	
10	中铁二局集团有限公司	
11	中铁二十二局集团有限公司	
12	中铁二十五局集团有限公司	
13	中铁九局集团有限公司	
14	中铁六局集团有限公司	
15	中铁三局集团有限公司	
16	中铁十六局集团有限公司	
17	中铁十五局集团有限公司	
18	中铁五局集团有限公司	
（二）机电工程施工单位（1家）		
19	广东路路通有限公司	
（三）交通安全设施施工单位（2家）		
20	广东添虹交通工程有限公司	
21	广州市公路实业发展有限公司	
三、监理单位（10家）		
1	北京路桥通国际工程咨询有限公司	
2	长沙华南土木工程监理有限公司	
3	广东华路交通科技有限公司	
4	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	
5	河北华达公路工程咨询监理有限公司	
6	湖南省交通建设工程监理有限公司	
7	江西交通咨询有限公司	
8	山东格瑞特交通科技有限公司	
9	云基智慧工程股份有限公司	



林刘
印晓

10	招商中宇工程咨询（重庆）有限公司	
四、试验检测单位（4家）		
1	安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司	
2	贵州顺康检测股份有限公司	
3	陕西高速公路工程试验检测有限公司	
4	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	
五、材料供应单位（2家）		
1	江西新华新材料科技股份有限公司	
2	天津市新天钢中兴盛达有限公司	
六、工程咨询单位（17家）		
1	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	
2	北京中交京华公路工程技术有限公司	
3	北京中交京纬公路造价技术有限公司	
4	重庆恒申达工程造价咨询有限公司	
5	广东海力建设工程咨询有限公司	
6	广东天望建设项目管理有限公司	
7	广西信达友邦工程造价咨询有限责任公司	
8	广州致正工程咨询有限公司	
9	恒津设计有限公司	
10	江苏交通工程投资咨询有限公司	
11	青矩工程顾问有限公司	
12	浙江同欣工程管理有限公司	
13	正中国际项目管理集团有限公司	
14	中交公路规划设计院有限公司	
15	中交基础设施养护集团有限公司	
16	中交路通（广州）工程咨询有限公司	
17	众为工程咨询有限公司	

三、B级单位（共153家）

序号	从业单位名称	备注
一、设计单位（15家）		
1	广州市市政工程设计研究总院有限公司	
2	河南省中工设计研究院集团股份有限公司	曾用名：河南省交通规划设计研究院股份有限公司
3	恒津设计有限公司	
4	湖南省公路设计有限公司	
5	清远市公路勘察规划设计院	
6	山西省交通规划勘察设计院有限公司	
7	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	
8	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	
9	中交远洲交通科技集团有限公司	
10	中榕规划设计有限公司	
11	东莞市交通规划勘察设计院有限公司	无参评项目，自愿参评
12	广东泛珠勘察设计有限公司	无参评项目，自愿参评
13	广西交通设计集团有限公司	无参评项目，自愿参评
14	河南省交通勘察设计院有限公司	无参评项目，自愿参评



林刘
印晓

15	惠州市道路桥梁勘察设计院	无参评项目，自愿参评
二、施工单位（92家）		
（一）土建工程施工单位（14家）		
1	广东晶通公路工程建设集团有限公司	
2	广东省建筑工程机械施工有限公司	
3	广东长宏建设集团有限公司	
4	惠州交投公路建设有限公司	
5	深圳市政集团有限公司	
6	深圳中瑞建工集团有限公司	
7	浙江交工集团股份有限公司	
8	中国葛洲坝集团股份有限公司	
9	中国中铁股份有限公司	
10	中交二航局深圳建设有限公司	
11	中交建筑集团有限公司	
12	中铁二十三局集团有限公司	
13	中铁上海工程局集团有限公司	
14	中铁十局集团有限公司	
（二）机电工程施工单位（4家）		
15	江西方兴科技股份有限公司	
16	深圳市锦粤达科技有限公司	
17	中国公路工程咨询集团有限公司	
18	中铁十二局集团电气化工程有限公司	
（三）交通安全设施施工（4家）		
19	湖北省高速公路实业开发有限公司	
20	湖南路桥建设集团有限责任公司	
21	中国公路工程咨询集团有限公司	
22	中交路桥建设有限公司	
（四）无参评项目，自愿参评施工单位（70家）		
23	安徽天洋交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
24	安徽择正公路工程有限责任公司	无参评项目，自愿参评
25	北京汉威达交通运输设备有限公司	无参评项目，自愿参评
26	北京建工集团（广州）建设有限公司	无参评项目，自愿参评
27	北京路桥方舟交通科技发展有限公司	无参评项目，自愿参评
28	北京深华科交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
29	北京市高速公路交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
30	北京云星宇交通科技股份有限公司	无参评项目，自愿参评
31	重庆市实力公路开发有限公司	无参评项目，自愿参评
32	福建省路桥建设集团有限公司	无参评项目，自愿参评
33	广东恒大桥桥建设有限公司	无参评项目，自愿参评
34	广东六达交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
35	广东赛达交通科技股份有限公司	无参评项目，自愿参评
36	广东省电子技术研究所	无参评项目，自愿参评
37	广东省佛山公路集团有限公司	无参评项目，自愿参评
38	广东省建筑工程集团股份有限公司	无参评项目，自愿参评
39	广东省路桥交通建设集团有限公司	曾用名：广东禹昌建设工程有限公司。 无参评项目，自愿参评



林刘
印晓

40	广东省水利水电第三工程局有限公司	无参评项目，自愿参评
41	贵州桥梁建设集团有限责任公司	无参评项目，自愿参评
42	贵州省交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
43	哈尔滨市公路工程有限责任公司	无参评项目，自愿参评
44	海南中咨泰克交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
45	杭州公路交通设施工程有限公司	无参评项目，自愿参评
46	河北建设集团股份有限公司	无参评项目，自愿参评
47	河北翔达路桥工程有限公司	无参评项目，自愿参评
48	黑龙江省北龙交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
49	湖北天浩公路工程有限公司	无参评项目，自愿参评
50	湖南达陆基交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
51	湖南交通国际经济工程合作有限公司	无参评项目，自愿参评
52	湖南省金达工程建设有限公司	无参评项目，自愿参评
53	济南金日公路工程有限公司	无参评项目，自愿参评
54	江门市路桥集团有限公司	无参评项目，自愿参评
55	江苏华路交通发展有限公司	无参评项目，自愿参评
56	江苏兴路交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
57	江苏耀鑫交通设施有限公司	无参评项目，自愿参评
58	江西赣东路桥建设集团有限公司	无参评项目，自愿参评
59	江西井冈路桥（集团）有限公司	无参评项目，自愿参评
60	江西省宏发路桥建筑工程有限公司	无参评项目，自愿参评
61	江西省路桥隧道工程有限公司	无参评项目，自愿参评
62	江西省路桥建设集团有限公司	无参评项目，自愿参评
63	江西天丰建设集团有限公司	无参评项目，自愿参评
64	江西有色建设集团有限公司	无参评项目，自愿参评
65	立乔建设集团有限公司	无参评项目，自愿参评
66	宁夏公路桥梁建设有限公司	无参评项目，自愿参评
67	青岛交建集团有限公司	无参评项目，自愿参评
68	青岛交科建设集团有限公司	无参评项目，自愿参评
69	厦门市科发交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
70	陕西高速诚信交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
71	陕西公路工程建设有限公司	无参评项目，自愿参评
72	陕西交控交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
73	陕西金宝迪交通工程建设有限公司	无参评项目，自愿参评
74	陕西路桥集团有限公司	无参评项目，自愿参评
75	四川京川公路工程（集团）有限公司	无参评项目，自愿参评
76	天津路桥建设工程有限公司	无参评项目，自愿参评
77	潍坊东方交通设施工程有限公司	无参评项目，自愿参评
78	西北交通建设集团有限公司	无参评项目，自愿参评
79	邢台路桥建设集团有限公司	曾用名：邢台路桥建设总公司。无参评项目，自愿参评
80	宜春市交通公路工程建设有限公司	无参评项目，自愿参评
81	宜春通达路桥建设有限公司	无参评项目，自愿参评
82	浙江八咏公路工程集团有限公司	无参评项目，自愿参评
83	浙江联顺道路筑养科技有限公司	无参评项目，自愿参评
84	郑州市大道公路工程有限公司	无参评项目，自愿参评



85	中北交通建设集团有限公司	无参评项目，自愿参评
86	中国建筑第二工程局有限公司	无参评项目，自愿参评
87	中国建筑第六工程局有限公司	无参评项目，自愿参评
88	中国建筑一局（集团）有限公司	无参评项目，自愿参评
89	中核华泰建设有限公司	无参评项目，自愿参评
90	中建交通建设集团有限公司	无参评项目，自愿参评
91	中交三公局第一工程有限公司	无参评项目，自愿参评
92	中铁隧道集团三处有限公司	无参评项目，自愿参评

三、监理单位（20家）

1	北京华路顺工程咨询有限公司	
2	北京华通公路桥梁监理咨询有限公司	
3	北京泰克华诚技术信息咨询有限公司	
4	重庆锦程工程咨询有限公司	
5	广东虎门技术咨询有限公司	
6	广东协立工程咨询监理有限公司	
7	广东衍发建设工程管理有限公司	
8	广州华申建设工程管理有限公司	
9	河北省交通建设监理咨询有限公司	
10	河南大同路桥技术咨询有限公司	
11	河南高建工程管理有限公司	
12	宁波交通工程咨询监理有限公司	
13	山西交通建设监理咨询集团有限公司	曾用名：山西省交通建设工程监理有限责任公司
14	陕西高速公路工程咨询有限公司	
15	西安华兴工程管理有限公司	
16	广东恒泰通工程咨询有限公司	曾用名：广东天虹工程咨询有限公司
17	广东进裕项目管理咨询有限公司	无参评项目，自愿参评
18	广东联发工程咨询有限公司	无参评项目，自愿参评
19	华闽咨询集团有限公司	无参评项目，自愿参评
20	汕头市公路工程监理单位	无参评项目，自愿参评

四、检验检测单位（9家）

1	长沙理工检测咨询有限责任公司	
2	甘肃省公路工程质量检验检测中心有限公司	
3	广东逸华交通工程检测有限公司	
4	广州港湾工程质量检测有限公司	
5	山东格瑞特交通科技有限公司	
6	西安中交一公院瑞通科研试验检测有限公司	
7	招商局重庆公路工程检测中心有限公司	
8	中大智能科技股份有限公司	
9	广州冠粤路桥检测有限公司	无参评项目，自愿参评

五、材料供应单位（9家）

1	江苏帅龙集团有限公司	
2	东莞交投建材有限公司	
3	广州嘉捷信供应链有限公司	
4	江苏博融预应力制品有限公司	
5	江阴法尔胜钢铁制品有限公司	



6	深圳恒立投资有限公司	
7	天津达陆钢绞线有限公司	
8	中铁物资集团华南有限公司	
9	珠海粤之海贸易有限公司	
六、工程咨询单位（8家）		
1	广东华审工程咨询有限公司	
2	北京交科公路勘察设计研究院有限公司	
3	广州菲达建筑咨询有限公司	
4	华联世纪工程咨询股份有限公司	
5	惠州市道路桥梁勘察设计院	
6	肇庆市公路勘察设计院	
7	中北工程设计咨询有限公司	
8	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	

四、无 C 级、D 级单位。

说明：1.根据《广东省交通运输厅关于印发公路工程从业单位信用评价实施细则的通知》（粤交〔2021〕20 号）第十四条规定：首次参加信用评价的企业，信用等级最高为 A 级。
2.钢箱梁制造、房建工程合同段暂不纳入本次评价范围。



全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

企业名称查询

江西省四通路桥建设集团有限公司

搜索

林刘
印晓

评价年度: 请选择 信用等级: 请选择 评价类型: 施工企业 注册地省份: 请选择省份 查询

序号	单位名称	统一社会信用代码	单位类型	年度	信用等级	得分
1	江西省四通路桥建设集团有限公司	913605001598709648	施工	2023	AA	97.3387
2	江西省四通路桥建设集团有限公司	913605001598709648	施工	2022	AA	97.205
3	江西省四通路桥建设集团有限公司	913605001598709648	施工	2021	AA	97.49
4	江西省四通路桥建设集团有限公司	913605001598709648	施工	2020	A	92.25
5	江西省四通路桥建设集团有限公司	913605001598709648	施工	2019	A	91
6	江西省四通路桥建设集团有限公司	913605001598709648	施工	2018	A	87.51
7	江西省四通路桥建设集团有限公司	913605001598709648	施工	2017	A	89.15
8	江西省四通路桥建设集团有限公司	913605001598709648	施工	2016	A	88.93
9	江西省四通路桥建设集团有限公司	913605001598709648	施工	2015	A	90.58
10	江西省四通路桥建设集团有限公司	913605001598709648	施工	2014	A	93
11	江西省四通路桥建设集团有限公司	913605001598709648	施工	2012	C	64
12	江西省四通路桥建设集团有限公司	913605001598709648	施工	2011	B	77.5
13	江西省四通路桥建设集团有限公司	913605001598709648	施工	2010	AA	100

相关链接

北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省
吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省
福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省
广东省 广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省
云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区
新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团



全国公路建设市场监督管理系统

Copyright © 2017-2027 中华人民共和国交通运输部



全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

林刘
印晓

施工 从业单位名称统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

四川 四通路桥建设集团有限公司

基本信息

资质证书

人员信息

业绩信息

诚信记录

全国综合评价

企业在各地的信用等级

企业变更历史

企业转移历史记录

评价年度: 请选择

企业信用等级

序号	企业类型	评价年份	等级	得分	备注
1	施工	2023	AA	97.3367	
2	施工	2022	AA	97.295	
3	施工	2021	AA	97.49	
4	施工	2020	A	92.25	
5	施工	2019	A	91	
6	施工	2018	A	87.31	
7	施工	2017	A	89.15	
8	施工	2016	A	88.93	
9	施工	2015	A	90.58	
10	施工	2014	A	93	
11	施工	2012	C	64	
12	施工	2011	B	77.5	
13	施工	2010	AA	100	

相关链接

- 北京市
- 天津市
- 河北省
- 山西省
- 内蒙古自治区
- 辽宁省
- 吉林省
- 黑龙江省
- 上海市
- 江苏省
- 浙江省
- 安徽省
- 福建省
- 江西省
- 山东省
- 河南省
- 湖北省
- 湖南省
- 广东省
- 广西壮族自治区
- 海南省
- 重庆市
- 四川省
- 贵州省
- 云南省
- 西藏自治区
- 陕西省
- 甘肃省
- 青海省
- 宁夏回族自治区
- 新疆维吾尔自治区
- 新疆生产建设兵团



附件下载



联系我们



全国公路建设市场监督管理系统
Copyright © 2017-2027 中华人民共和国交通运输部



全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

林刘
印晓

四川省公路建设集团有限责任公司

基本信息 资质信息 人员信息 业绩信息 奖惩记录 全国综合评价 企业在各地的信用等级 企业变更历史 企业转移历史记录

评价年度: 请选择

企业信用等级

序号	评价省份	评价年份	等级	等级
1	贵州省	2023	AA	等级
2	四川省	2023	AA	等级
3	云南省	2022	AA	等级
4	四川省	2022	AA	等级
5	四川省	2021	AA	等级
6	贵州省	2020	B	等级
7	四川省	2020	AA	等级
8	安徽省	2020	A	等级
9	四川省	2019	A	等级
10	安徽省	2019	A	等级
11	云南省	2018	A	等级
12	四川省	2018	A	等级
13	重庆市	2018	A	等级
14	安徽省	2018	A	等级
15	四川省	2017	A	等级

1 2 下一页 列表 页 确定 共29条

相关链接

北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省
吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省
福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省
广东省 广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省
云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区
新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团

附件下载

联系我们

政府网站
找错

全国公路建设市场监督管理系统
Copyright © 2017-2027 中华人民共和国交通运输部



全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

用户登录

施工 从业单位名称统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

林刘
印晓

山西四通路桥建设集团有限公司

基本信息

资质信息

人员信息

业绩信息

诚信记录

全国综合评价

企业在各地的信用评级

企业变更历史

企业转移历史记录

不良行为记录

序号	标题	文件编号	单位名称	项目名称	从宽的违法行为	处罚开始时间	处罚结束时间
无记录							

相关链接

北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省
吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省
福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省
广东省 广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省
云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区
新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团



附件下载



联系我们



政府网站
扶植

全国公路建设市场监督管理系统
Copyright © 2017-2027 中华人民共和国交通运输部



林刘印晓

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

- 首页
- 政策法规
- 工作动态
- 从业企业
- 从业人员
- 用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

江西省四通路桥建设集团有限公司

- 基本信息
- 资质证书
- 人员信息
- 业绩信息
- 诚信记录
- 全国综合评价
- 企业在各地的信用等级
- 企业变更历史
- 企业转移历史记录

不良行为记录						
序号	标题	单位名称	文件编号	项目名称	认定的不良行为	处罚开始时间
无记录						

相关链接

- 北京市
- 吉林省
- 福建省
- 广东省
- 云南省
- 新疆维吾尔自治区
- 天津市
- 黑龙江省
- 江西省
- 广西壮族自治区
- 西藏自治区
- 新疆生产建设兵团
- 河北省
- 上海市
- 山东省
- 海南省
- 陕西省
- 内蒙古自治区
- 浙江省
- 湖北省
- 四川省
- 青海省
- 辽宁省
- 安徽省
- 湖南省
- 贵州省
- 宁夏回族自治区

- 附件下载
- 联系我们



全国公路建设市场监督管理系统

Copyright © 2017-2027 中华人民共和国交通运输部



承诺函

广宁县公路事务中心（招标人名称）：

**林刘
印晓**

我司在投标文件递交截止日前 1 年内，不曾有因公路工程（含附属设施）质量、安全、履约问题或招标投标问题等原因被交通运输部行政处罚、广东省交通运输厅行政处罚或正式约谈、招标项目所在地地级以上市交通运输局行政处罚的文件。

二、我司自投标文件递交截止日前 1 年内，我司不曾因公路工程（含附属设施）质量、安全、履约或招标投标问题等原因被：

- （1）交通运输部行政处罚；
- （2）广东省交通运输厅行政处罚；
- （3）项目所在地地市级（委）交通运输局、本项目招标人或招标人上级管理单位通报批评。
- （4）广东省交通运输厅正式约谈。

投标人：江西省四通路桥建设集团有限公司

2026 年 1 月 6 日





1



证书号第16269267号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种波形梁护栏装载机式打桩机

发 明 人：甘斌；胡欣宇；曾艳

专 利 号：ZL 2021 2 2924137.4

专利申请日：2021年11月25日

专 利 权 人：江西省四通路桥建设集团有限公司

地 址：338000 江西省新余市渝水区仙来东大道347号

授权公告日：2022年04月12日

授权公告号：CN 216275675 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况，专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见续页



林刘
印晓

证书号第16269267号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年11月25日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

江西省四通路桥建设集团有限公司

发明人：

甘斌；胡欣宇；曾艳

第2页(共2页)



2

林刘
印晓

证书号第 16393293 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种穿巷式架桥机

发 明 人：袁会军；敖美玲；童国强

专 利 号：ZL 2021 2 2964675.6

专利申请日：2021 年 11 月 29 日

专 利 权 人：江西省四通路桥建设集团有限公司

地 址：338000 江西省新余市渝水区仙来东大道 347 号

授权公告日：2022 年 04 月 29 日

授权公告号：CN 216405134 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页



林刘
印晓

证书号第16393293号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年11月29日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

江西省四通路桥建设集团有限公司

发明人：

袁会军；敖美玲；童国强

第2页(共2页)



3

林刘
印晓

证书号第16899195号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种多锤头碎石化机

发 明 人：张小林;孔玉威;黄欣月

专 利 号：ZL 2022 2 0342672.0

专利申请日：2022年02月21日

专 利 权 人：江西省四通路桥建设集团有限公司

地 址：338000 江西省新余市渝水区仙来东大道347号

授权公告日：2022年07月08日

授权公告号：CN 216919957 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见续页



林刘
印晓

证书号第16899195号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年02月21日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

江西省四通路桥建设集团有限公司

发明人：

张小林；孔玉威；黄欣月

第2页(共2页)



4

林刘
印晓

证书号第17582143号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种共振化碎石化机

发 明 人：龚辉;程露;郭学军

专 利 号：ZL 2022 2 0354213.4

专利申请日：2022年02月22日

专 利 权 人：江西省四通路桥建设集团有限公司

地 址：338000 江西省新余市渝水区仙来东大道347号

授权公告日：2022年10月18日

授权公告号：CN 217601170 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见续页



林刘
印晓

证书号第17582143号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年02月22日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

江西省四通路桥建设集团有限公司

发明人：

龚辉；程露；郭学军

第2页(共2页)



5

林刘
印晓

证书号第 16907257 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种胶轮式压路机

发 明 人：熊文清；颜珍光；肖国富

专 利 号：ZL 2022 2 0324864.9

专利申请日：2022 年 02 月 17 日

专 利 权 人：江西省四通路桥建设集团有限公司

地 址：338000 江西省新余市渝水区仙来东大道 347 号

授权公告日：2022 年 07 月 08 日

授权公告号：CN 216919904 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页



林刘
印晓

证书号第16907257号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年02月17日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

江西省四通路桥建设集团有限公司

发明人：

熊文清；颜珍光；肖国富

第2页(共2页)



6

林刘
印晓

证书号第16268171号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种沥青混合料搅拌设备

发 明 人：刘晓林；刘庆平；刘思德

专 利 号：ZL 2021 2 2924113.9

专利申请日：2021年11月25日

专 利 权 人：江西省四通路桥建设集团有限公司

地 址：338000 江西省新余市渝水区仙来东大道347号

授权公告日：2022年04月12日

授权公告号：CN 216275110 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见续页



林刘
印晓

证书号第16268171号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年11月25日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

江西省四通路桥建设集团有限公司

发明人：

刘晓林；刘庆平；刘思德

第2页(共2页)



7

林刘
印晓

证书号第16778826号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种梁板智能压浆机

发 明 人：桂志军;王小平;胡家伟

专 利 号：ZL 2022 2 0068795.X

专利申请日：2022年01月12日

专 利 权 人：江西省四通路桥建设集团有限公司

地 址：338000 江西省新余市渝水区仙来东大道347号

授权公告日：2022年06月21日

授权公告号：CN 216782223 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见续页



林刘
印晓

证书号第16778826号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年01月12日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

江西省四通路桥建设集团有限公司

发明人：

桂志军；王小平；胡家伟

第2页(共2页)



林刘
印晓

证书号第 16655640 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种梁板智能张拉机

发 明 人：桂志军；占晨；廖浩辉

专 利 号：ZL 2022 2 0044510.9

专利申请日：2022 年 01 月 10 日

专 利 权 人：江西省四通路桥建设集团有限公司

地 址：338000 江西省新余市渝水区仙来东大道 347 号

授权公告日：2022 年 06 月 03 日

授权公告号：CN 216665062 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页



林刘
印晓

证书号第16655640号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年01月10日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

江西省四通路桥建设集团有限公司

发明人：

桂志军；占晨；廖浩辉

第2页(共2页)



林刘
印晓

证书号第16646765号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种路基边坡喷浆机

发 明 人：龚军生;王娟;黄志军

专 利 号：ZL 2022 2 0093069.3

专利申请日：2022年01月14日

专 利 权 人：江西省四通路桥建设集团有限公司

地 址：338000 江西省新余市渝水区仙来东大道347号

授权公告日：2022年06月03日

授权公告号：CN 216664136 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见续页



林刘
印晓

证书号第16646765号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年01月14日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

江西省四通路桥建设集团有限公司

发明人：

龚军生；王娟；黄志军

第2页(共2页)



10

林刘
印晓

证书号第16415771号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种路桥施工用破碎铲车

发 明 人：简任青;陈小刚;胡玉萍

专 利 号：ZL 2021 2 2924065.3

专利申请日：2021年11月25日

专 利 权 人：江西省四通路桥建设集团有限公司

地 址：338000 江西省新余市渝水区仙来东大道347号

授权公告日：2022年05月03日

授权公告号：CN 216428365 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见续页



林刘
印晓

证书号第16415771号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年11月25日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

江西省四通路桥建设集团有限公司

发明人：

简任青；陈小刚；胡玉萍

第2页(共2页)
